

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance global

- Programado: 72.69%
 - Real: 83.30%
 - Semanal: 0.37%
 - Financiero: 60.13%
- (Concluido, se trabajan vialidades laterales)

-  **Inversión total 2025-2026:** 404.1 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total
-  **Inversión 2025:** 25 mdp (224.1 mdp) De acuerdo al cierre de SHCP 2025
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 180.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km
-  **Inicio:** 18 de agosto de 2025 (Fecha de terminación contractual)
Término: Agosto 2026. Se realizan calles laterales

 **862,037** Habitantes beneficiados

 **1,215** empleos generados

 **20 min** ahorro en tiempo


Beneficios

Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

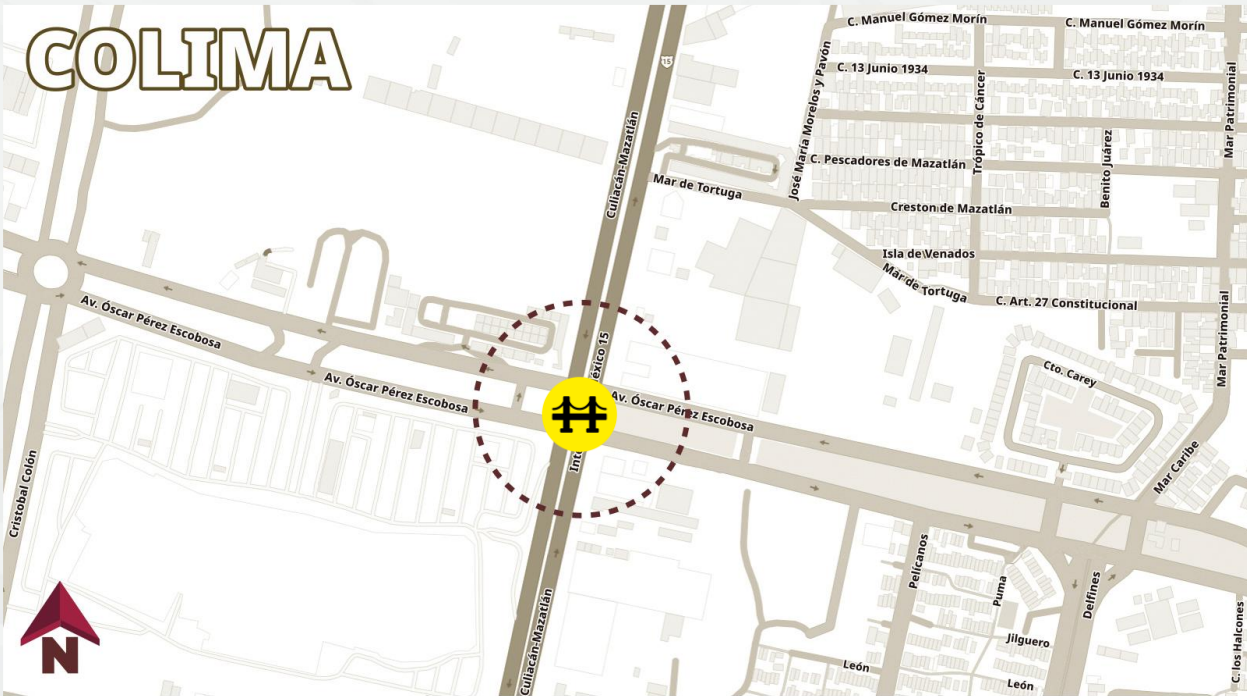


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

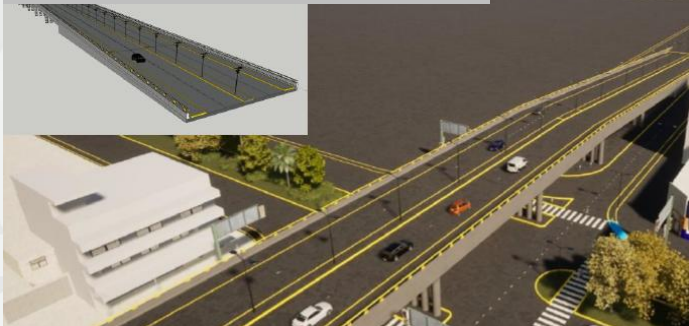


Proyecto

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 06 al 12/03/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.1	0.0	Falta proyecto de semaforización y diseño
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Superestructura Fabricación de Trabes AASHTO IV	Actividad	77	77	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Superestructura Montaje de Trabes AASHTO IV	pieza	77	77	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Superestructura Fabricación de Trabes Nebrazka	pieza	11	11	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Superestructura Montaje de Trabes Nebrazka NU240	pieza	11	11	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	12,940	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Dala de Cerramiento	m	421.2	421.2	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Losa de concreto Hidráulico Accesos	Pieza	3.0	3.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	
Junta de Calzada	Pieza	4	4	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Guarnición	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Parapeto	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	0.5	25.0%	1.5	0.5	0.0	
Pavimento Calles Laterales y debajo de la Estructura	m3	2,434.0	194.4	8.0%	2,239.6	0.0	0.0	
Alumbrado	Actividad	2	2.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Señalamiento	Actividad	2	0.3	15.0%	2	0.3	0.0	
Semaforización	Actividad	1	1.0	100.0%	0	0.3	0.0	Concluido
Barrera Central	m	587.0	587	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	2,109.0	41.9%	2,923.0	0	0.0	
Relleno Fluido	m3	2,174.0	1,094.0	50.3%	1,080.0	0	0.0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	2,200	9.4%	21,220.0	0	2,200.0	
Banqueta	m2	6,922.0	580.0	8.4%	6,342.0	0	0.0	
Relleno	m3	692.0	326.0	47.1%	366.0	0	46.0	

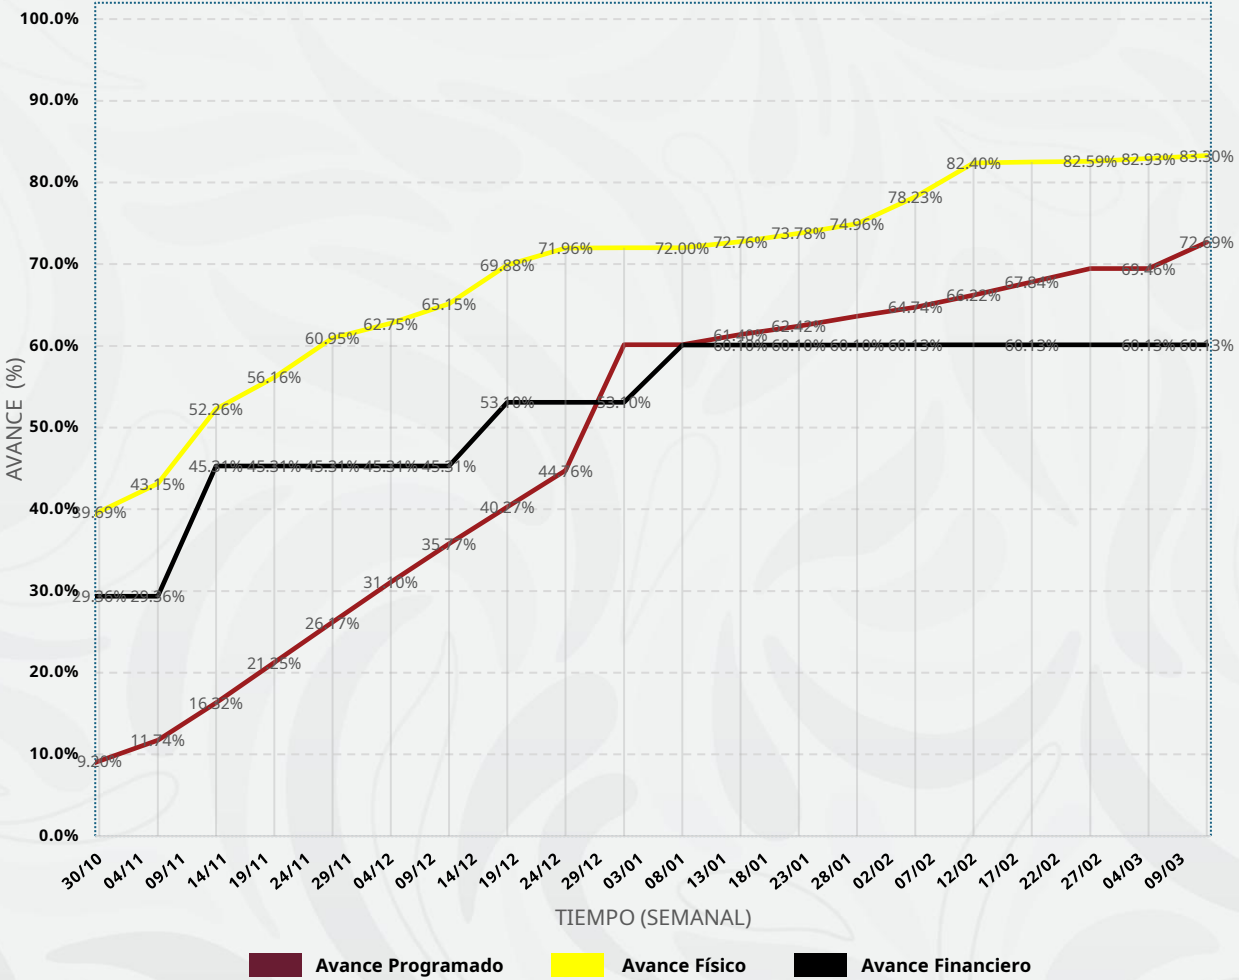

	Del 27 de Febrero al 05 de Marzo	Del 06 de Marzo al 12 de Marzo
Personal	78	84
Maquinaria	11	13
Frentes de trabajo	5	5
