

CDMX

Alameda Oriente

Avance global

- Programado: 9.92%
- Real: 8.72%
- Semanal: 0.93%
- Financiero: 6.57%

Avance 2025

- Programado: 62%
- Real: 54.5%
- Semanal: 5.81%
- Financiero: 49.21%

Inversión total 2025-2027: 2,000 mdp
Inversión 2025: 267 mdp | (16% de 2 puentes)

Meta total: 2 puentes | 1,174.95 m longitud total.

Inicio: 17 de junio de 2025
Término: Octubre 2027
Término meta 2025: Diciembre

1,798,474 habitantes beneficiados

6,000 empleos generados

15 min ahorro en tiempo


Empresas

- **Contratista:** CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

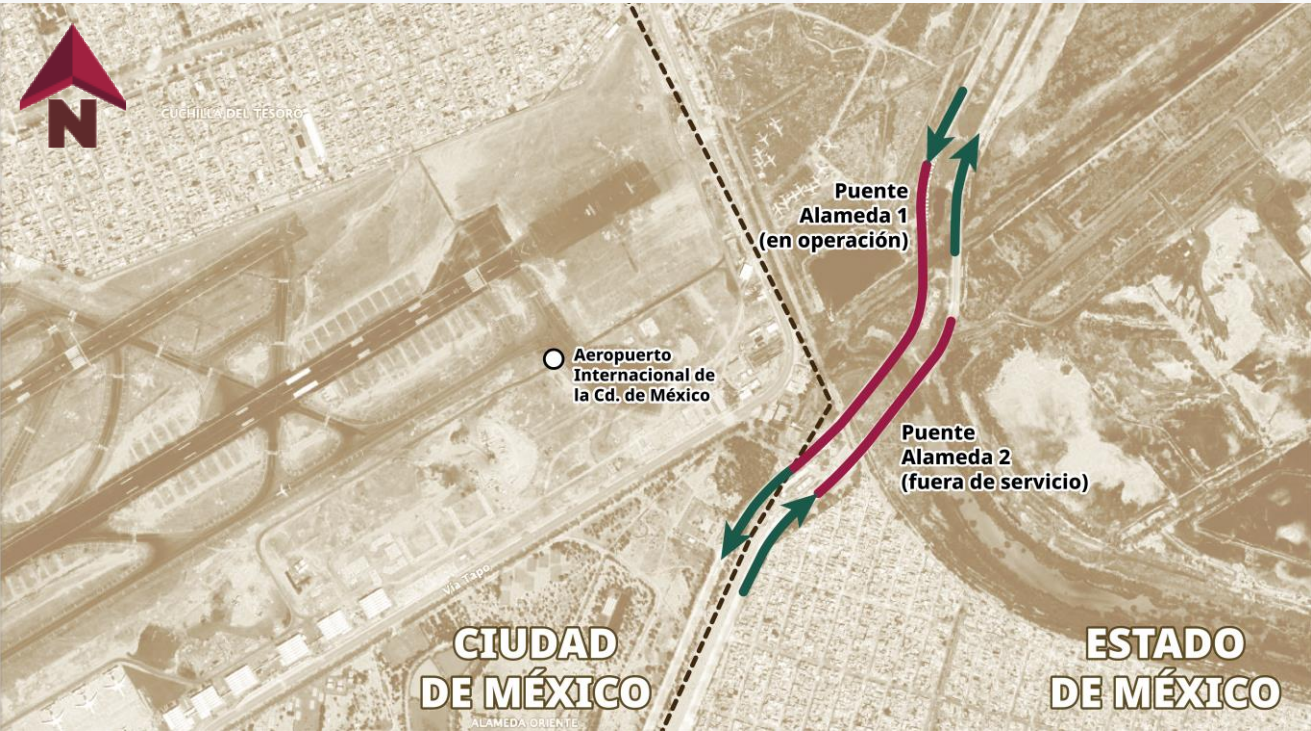

Nivel de Servicio en estudio



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio



Proyecto

Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente

(Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	31/oct/25 al 06/nov/25	
			Acumulado		Programado	Ejecutado
Estudios (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Proyectos (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Demolición y retiro de estructura (Puente 2)	500	m	450	50	0	0
Suministro y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 para pilotes (Puente 2)	843,000	kg	260,416.9	582,583.1	38,018.72	46,263.6
Suministro y colocación de concreto clase I, f'c 400 kg/cm2 para pilotes (Puente 2)	2,072	m3	832.8	1,239.2	93.41	158.4
Hincado de pilotes de 40cmx40cm de perforación (Puente 2)	12,898	m	732	12,166	448.77	420
Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puente 2)	18	Pzs	18	0	0	0
Desmantelamiento, almacenamiento, rehabilitación y reubicación de señal tipo puente (Puente 1 y 2)	2	Pzs	2	0	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puente 2)	4,740.4	m3	4,169.54	570.86	175.77	136.97
Excavación en caminos de servicio (Puente 2)	58,115.16	m3	9,076.71	49,038.45	2,171.61	46.3
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 2)	42,615.03	m3	11,813.99	30,801.04	1,782.13	396.35
Despalme en caminos de servicio (Puente 1)	5,222.6	m3	707.9	4,514.7	0	357.71
Excavación en caminos de servicio (Puente 1)	64,026.84	m3	2,403.8	61,623.04	0	503.15
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 1)	46,949.97	m3	2,850.69	44,099.28	0	0

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

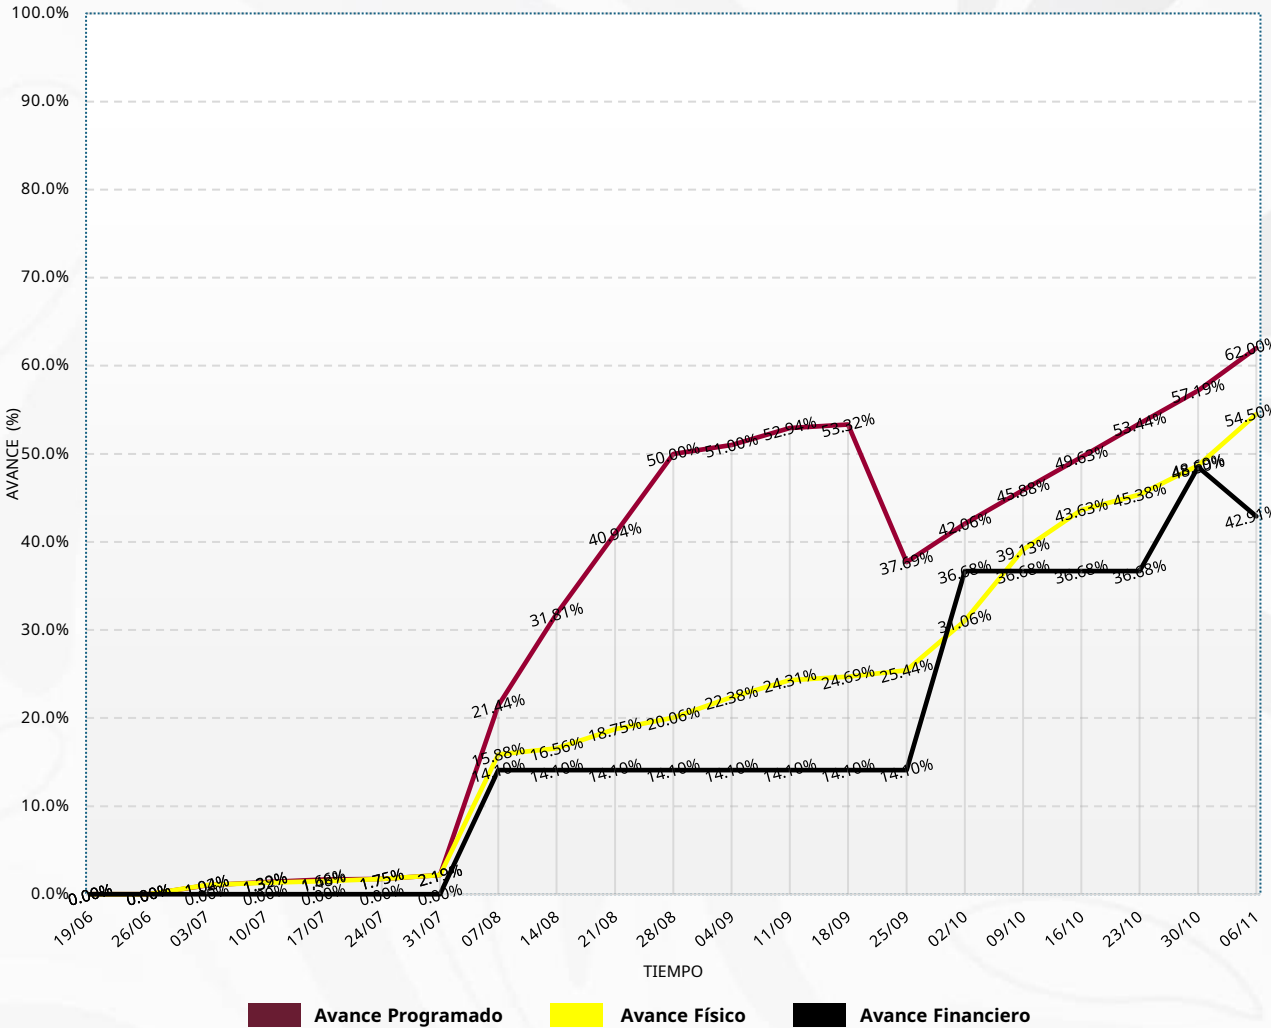

	Del 24 al 30 de octubre de 2025	Del 31 de octubre al 06 de noviembre de 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	60	67
Maquinaria	12	12
