

Puente El Chical

Colima

Avance global

• Programado: 13.2 %	• Semanal: 4.00 %
• Real: 23.64 %	• Financiero: 19.50 %

Avance 2025

• Programado: 57.90 %	• Semanal: 17.55 %
• Real: 95.0 %	• Financiero: 85.52 %

 **Inversión total 2025-2026:** 110 mdp
Inversión 2025: 20.6 mdp


 **Meta total:** 0.736 km
Meta 2025: 24.0 % del Puente Se incrementa % del puente de 22.8% a 24% por reprogramación

 **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025
Fecha de término: 10 de agosto, 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre, 2025

 **4,053** habitantes beneficiados

 **330** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

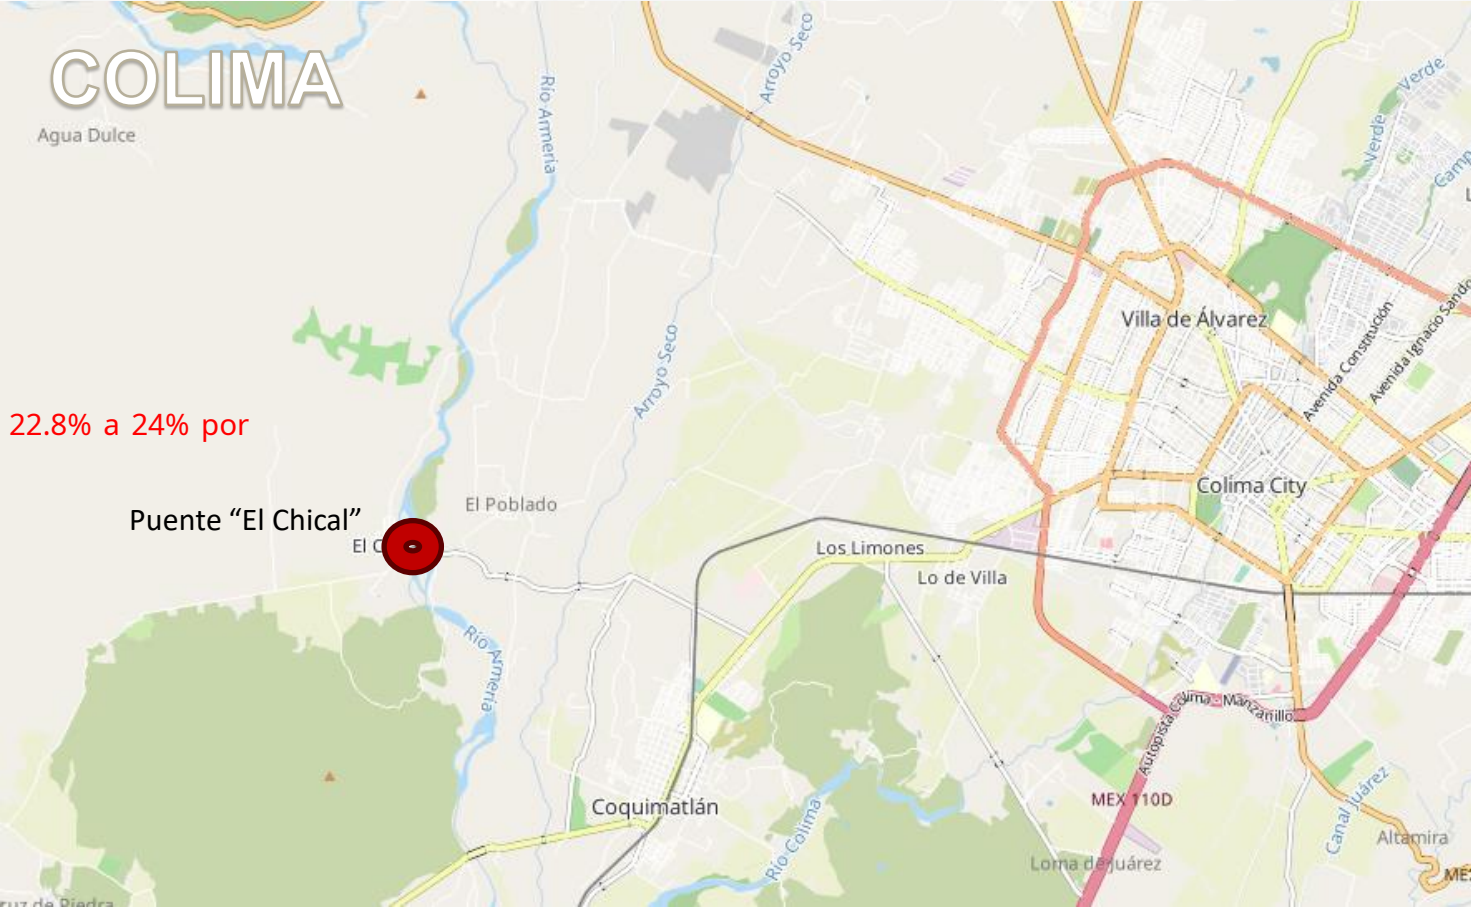

Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	• Contratista: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLA COMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V • Supervisión: ---

Puente El Chical

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	31/10/25 al 06/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0	
Pilas de cimentación (Pza)	24.0	21.0	3.0	2.0	6.0	
Armado columnas (Pza)	30.0	18.0	12.0	2.0	6.0	
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	5.0	5.0	1.3	2.0	
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	11.0	34.0	6.8	4.0	
Montaje de trabes (Pza)	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	0.0	648.0	0.0	0.0	
Carpeta Asfáltica (m3)	166.8	0.0	166.8	0.0	0.0	
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	0.0	720.0	0.0	0.0	
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0	
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	73,350.0	51,650.0	5,000.0	8,000.0	

