

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)



Gobierno de
México


Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 31.5%
- Real: 16.83%
- Semanal: 1.56%
- Financiero: 7.89%

Avance 2025

- Programado: 95.3%
- Real: 56.1%
- Semanal: 5.2%
- Financiero: 19.09%

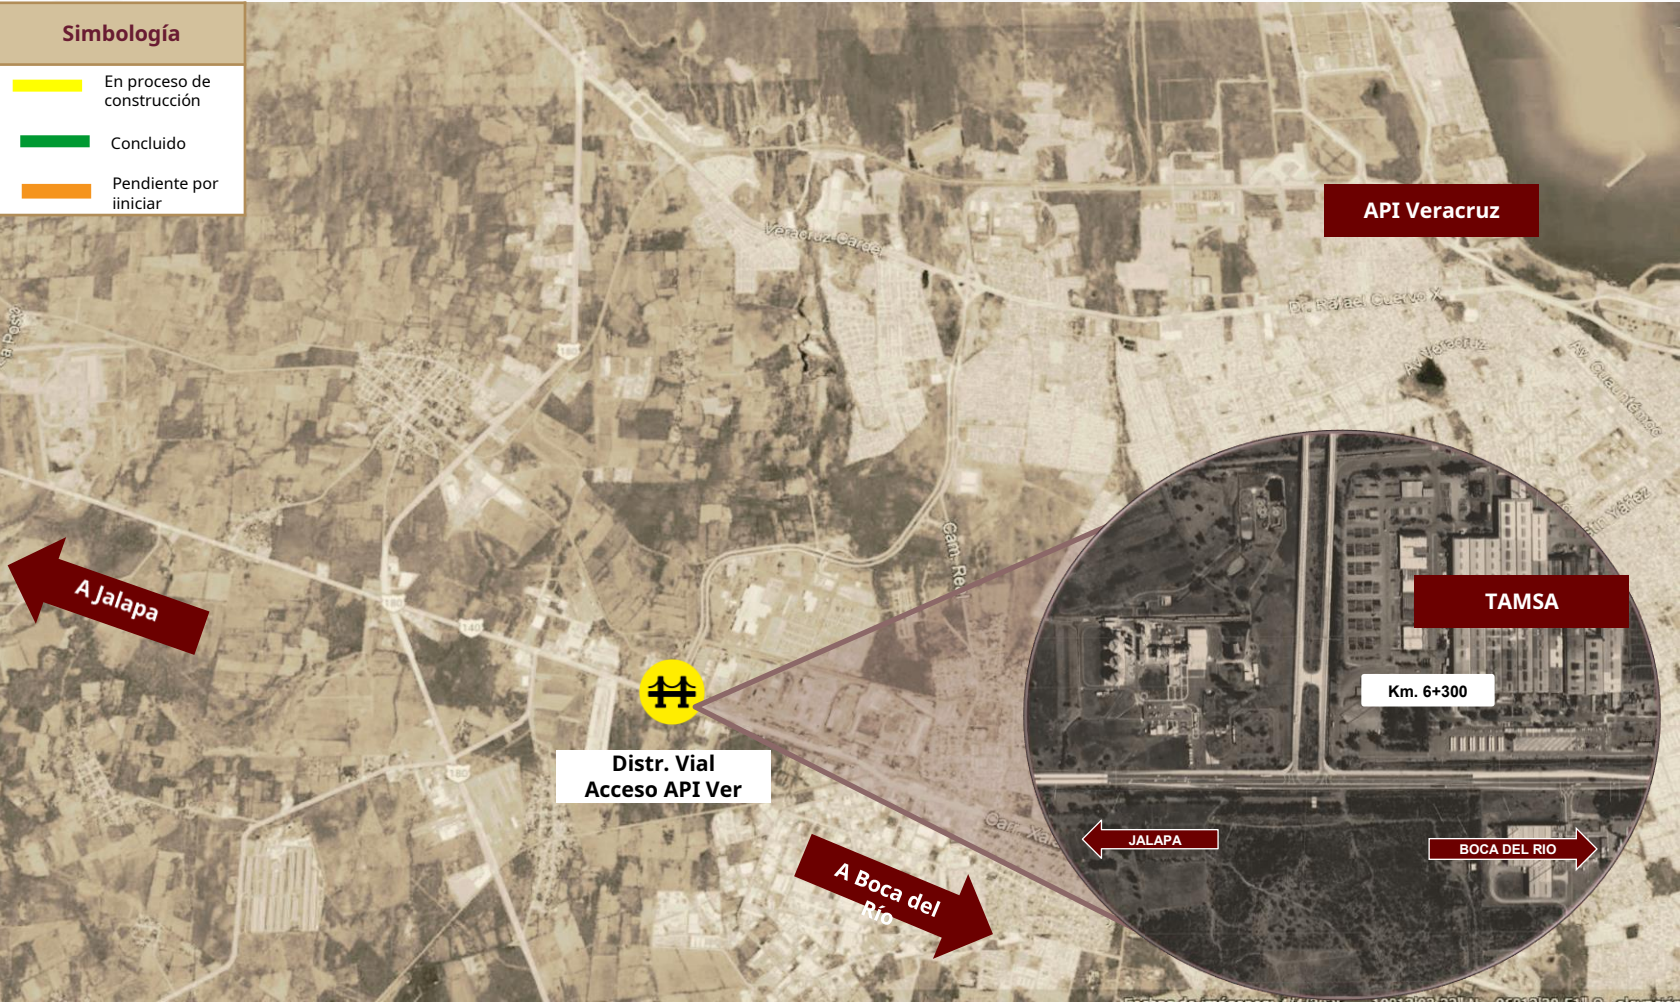

Inversión total 2025-2026: 840 mdp
Inversión 2025: 326 mdp | 0.6 km de PSV

Meta total 2025-2026: 1.97 km
1 PSV: 0.872 km
Accesos: 0.532 km
Transiciones: 0.566 km

Inicio: 14 de julio de 2025
Término: Diciembre de 2026
Termino meta 2025: Diciembre

780,441 habitantes beneficiados

2,235 empleos generados

25 min ahorro en tiempo

Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 31 al 06/11/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.00	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	6,295.00	5,526.0	87.8%	769.00	769.00	0.0	Continúa el despalme en cuerpo B
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.00	0.0	
Excavaciones	m³	49,951.00	26,856	53.8%	23,095.00	23,095.00	5,654.0	
Terraplenes	m³	36,650.00	17,209	47.0%	19,441.00	19,441.00	6,050.0	
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,531.00	0	0.0%	1,531.00	1,531.00	0.0	
Terraplenes en Rampa	m³	4,384.00	0	0.0%	4,384.00	4,384.00	0.0	
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	0	0.0%	3,090.00	441.40	0.0	
Paraderos	pza.	1	0	0.0%	1	0.00	0.0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0	Concluido en el cpo B
Zapatas	pza.	21	20	95.2%	1	1	0	En proceso de armado 2 zapatas adicionales
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	20	95.2%	1	1	0	Pendiente la columna del eje 3
Cabezales	pza.	23	15	65.2%	8	3	3	Se tienen 15 cabezales concluidos y 3 cabezales más en proceso
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	24	18.2%	108.00	36	8	Se tiene habilitado el acero de 4 trabes adicionales
Montaje de trabes	pza.	132	0	0.0%	132.00	33	0	
Diafragmas	pza.	110	0	0.0%	110.00	14	0	
Losa (claro)	m³	1,723.00	0	0.0%	1,723.00	0.0	0	

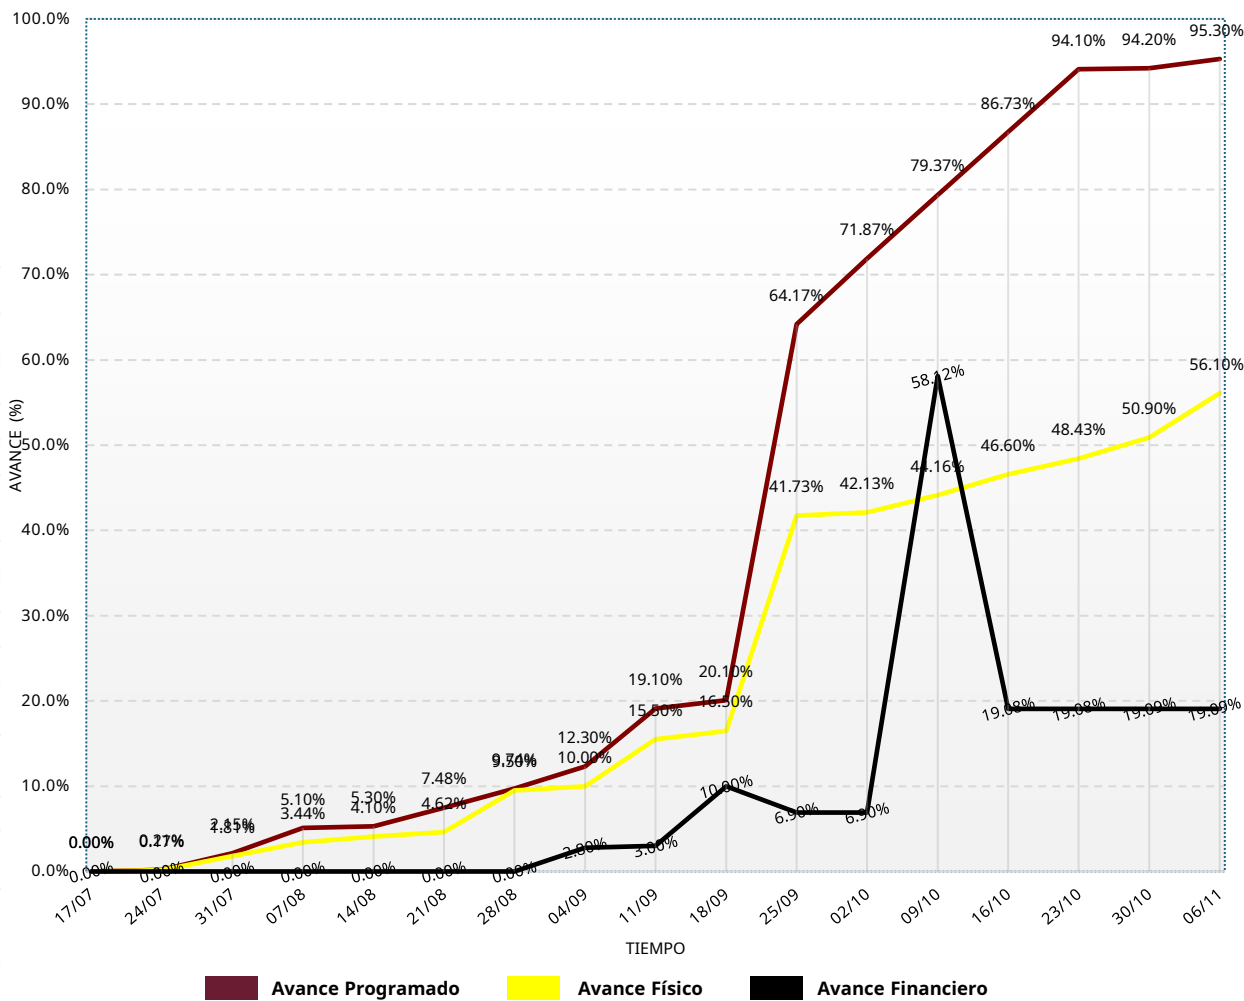

	24 de octubre al 30 de Octubre	31 de octubre al 06 de Noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	126	113
Maquinaria	24	23

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo A (programa 2026)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 31 al 06/11/25		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.07	0.00	0.0%	4.07	0.00	0.00	Programa 2026
Despalme	m³	6,292.00	0.0	0.0%	6,292.00	0.00	0.00	Programa 2026
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.00	0.00	Programa 2026
Excavaciones	m³	49,951.00	0	0.0%	49,951.00	0.00	0.00	Programa 2026
Terraplenes	m³	36,650.00	0	0.0%	36,650.00	0.00	0.00	Programa 2026
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,530.00	0	0.0%	1,530.00	0.00	0.00	Programa 2026
Terraplenes en Rampa	m³	4,385.00	0	0.0%	4,385.00	0	0	Programa 2026
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	0	0.0%	3,090.00	0	0	Programa 2026
Paraderos	pza.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	Programa 2026
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	0	0.0%	132	0	0	Programa 2026
Zapatas	pza.	21	0	0.0%	21	0	0	Programa 2026
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	23	0	0.0%	23.00	0	0	Programa 2026
Cabezales	pza.	23	0	0.0%	23.00	0	0	Programa 2026
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	0	0.0%	132.00	0	0	Programa 2026
Montaje de trabes	pza.	132	0	0.0%	132.00	0	0	Programa 2026
Diafragmas	pza.	110	0	0.0%	110.00	0	0	Programa 2026
Losa (claro)	m³	1,723.00	0	0.0%	1,723.00	0	0	Programa 2026
