

# Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

## Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance global**

- Programado: 37.24%
- Real: 52.70%
- Semanal: 1.94%
- Financiero: 43.69%

**Avance 2025**

- Programado: 67.70%
- Real: 98.36%
- Semanal: 3.53%
- Financiero: 98.36%

 **Inversión total 2025-2026:** 450 mdp  
**Inversión 2025:** 200 mdp | 1.35 km del Deprimido

 **Meta total:** 1 Deprimido | **1.5 km**  
Gasas | 4.1 km

 **Inicio:** 12 de mayo de 2025  
**Término:** Junio de 2026  
**Término meta 2025:** Diciembre

 **351,000** habitantes beneficiados

 **1,350** empleos generados

 **25 min** ahorro en tiempo



| Tramo     | Empresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| km 30+300 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> Convenio de participación conjunta de: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V.</li><li>• <b>Supervisión:</b> INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.</li></ul> |

# Baja California Sur

## Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

(Carretera Cabo San Lucas – La Paz)




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

| Elemento                                         | Meta     | Ejecutado acumulado | Faltante  | 31/10/25 al 06/11/25 |           | Observaciones |
|--------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------|
|                                                  |          |                     |           | Programado           | Ejecutado |               |
| Preliminares                                     |          |                     |           |                      |           |               |
| Retiro de vegetación (pzas)                      | 500.0    | 480.00              | 20.00     | 0.0                  | 0.0       |               |
| Reubicación de Monumento FONATUR (pza)           | 1.0      | 0.70                | 0.30      | 0.0                  | 0.0       |               |
| Canal Tipo Cajón                                 |          |                     |           |                      |           |               |
| Canal tipo cajón (m)                             | 1,099.4  | 1,099.4             | -         | -                    | -         | Concluido     |
| Terracerías                                      |          |                     |           |                      |           |               |
| Terracerías (m3)                                 | 14,112.0 | 4,970.0             | 9,142.0   | 0.0                  | 200.0     |               |
| Subbase (m3)                                     | 4,776.0  | 0.0                 | 4,776.0   | 0.0                  | 0.0       |               |
| Base hidráulica (m3)                             | 11,840.0 | 3,650.0             | 8,190.0   | 0.0                  | 450.0     |               |
| Estructura Paso Inferior Vehicular               |          |                     |           |                      |           |               |
| Zapatas (pzas)                                   | 20.0     | 7.0                 | 13.0      | 0.0                  | 1.0       |               |
| Muros de 2 a 7 m (pzas)                          | 20.0     | 7.0                 | 13.0      | 1.4                  | 1.0       |               |
| Pilas tangentes (pzas)                           | 1,100.0  | 968.0               | 132.0     | 55.0                 | 58.0      |               |
| Trabes de liga (m)                               | 1,597.2  | 330.0               | 1,267.2   | 228.17               | 0.0       |               |
| Fabricación de cabezal (pzas)                    | 8.0      | 0.0                 | 8.0       | 1.0                  | 0.0       |               |
| Fabricación trabes AASHTO tipo III (pzas)        | 52.0     | 26.0                | 26.0      | 6.5                  | 3.0       |               |
| Montaje trabes AASHTO tipo III (pzas)            | 52.0     | 0.0                 | 52.0      | 0.0                  | 0.0       |               |
| Guarnición y banquetas (m3)                      | 3,629.2  | 0.0                 | 3,629.2   | 0.0                  | 0.0       |               |
| Pavimento rígido (m3)                            | 5,227.0  | 0.0                 | 5,227.0   | 0.0                  | 0.0       |               |
| Pavimento flexible (m3)                          | 34,720.0 | 142.08              | 34,577.92 | 0.0                  | 0.0       |               |
| Parapeto (m)                                     | 1,795.2  | 0.0                 | 1,795.2   | 0.0                  | 0.0       |               |
| Semaforización                                   |          |                     |           |                      |           |               |
| Semaforización (%)                               | 100      | 0.0                 | 100       | 0.0                  | 0.0       |               |
| Obra inducida                                    |          |                     |           |                      |           |               |
| Reubicación de línea de media tensión de CFE (m) | 2,275.0  | 1,630.0             | 645.0     | 78.69                | 0.0       |               |
| Reubicación de acueducto (m)                     | 1,023.0  | 1,023.0             | -         | -                    | -         | Concluido     |
| Reubicación de línea de distribución (m)         | 910.0    | 910.0               | -         | -                    | -         | Concluido     |

Avance: Programado, Físico y Financiero

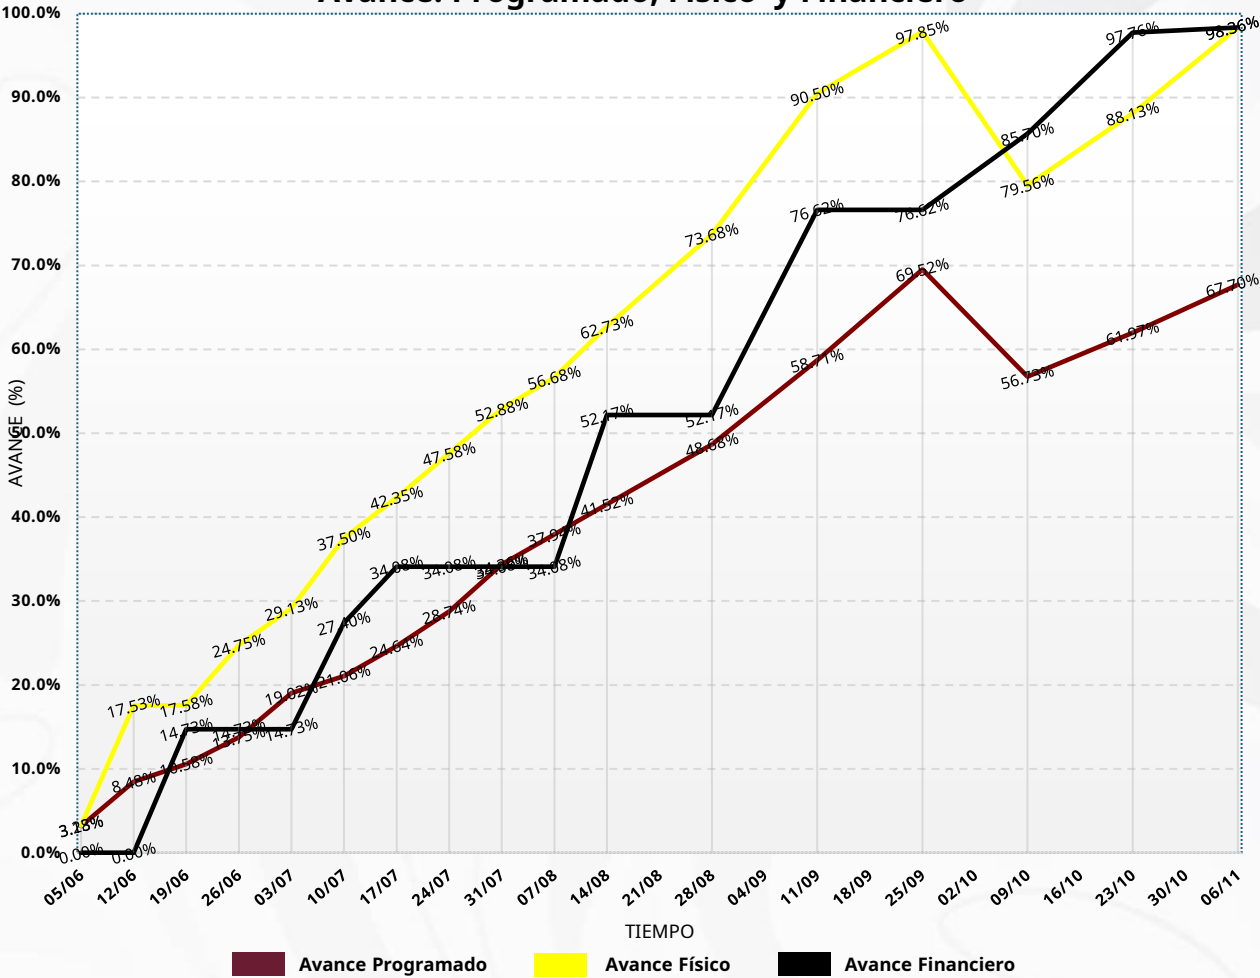

|                              | 24 de octubre al 30 de octubre | 31 de octubre al 06 de noviembre |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 101                            | 101                              |
| Maquinaria                   | 16                             | 16                               |
