

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

- Avance global**
 - Programado: 11.74%
 - Real: 43.15%
 - Semanal: 3.46%
 - Financiero: 29.36%
- Avance 2025**
 - Programado: 23.48%
 - Real: 86.51%
 - Semanal: 7.13%
 - Financiero: 52.28%

Inversión total 2025-2026: 380.0 mdp
Inversión 2025: 200.0 mdp | (50% de PSV)


Meta total: PSV | 0.811 km longitud total

Inicio: 18 de agosto de 2025
Término: Agosto 2026
Término meta 2025: Diciembre

862,037 Habitantes beneficiados

1,140 empleos generados

20 min ahorro en tiempo

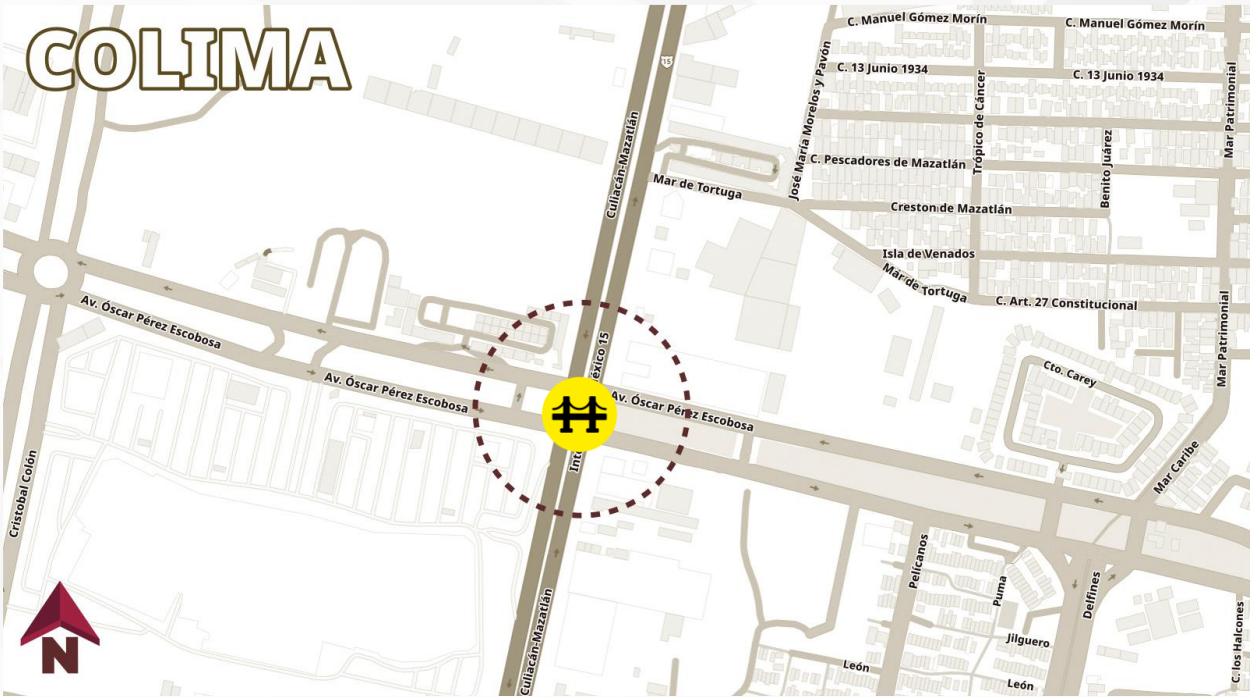


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

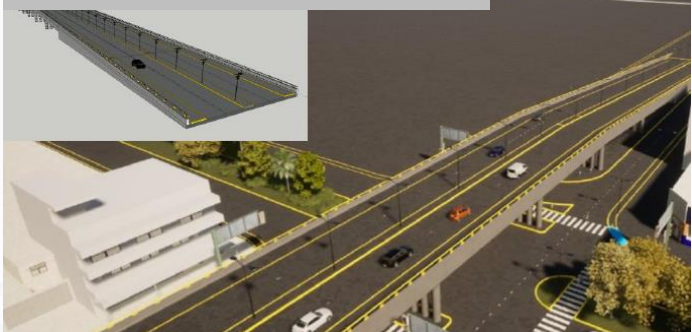

Proyecto

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 31 al 06/11/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.1	0.0	Se continúan trabajos de sondeos
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0.00	0.0	Se conduyó la construcción de los
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	7	77.8%	2.0	0.67	0.5	Se tiene un total de 36 columnas concluidas
Superestructura	Actividad	77	42	54.5%	35	12	10.0	Se tiene un total de 42 traves AASHTO IV
Fabricación de Traves AASHTO IV		77	24	31.2%	53	7.6	24.0	
Superestructura	pieza	11	1	9.1%	10	1.7	1.0	
Montaje de Traves AASHTO IV	pieza	11	0	0.0%	11	2.8	0.0	
Superestructura		11	0	0.0%	11	2.8	0.0	
Fabricación de Traves Nebraska	pieza	11	0	0.0%	11	2.8	0.0	
Superestructura	pieza	11	0	0.0%	11	2.8	0.0	
Montaje de Traves Nebraska NU240	pieza	11	0	0.0%	11	2.8	0.0	
Muro Mecánicamente estabilizado	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Se conduyó la fabricación de las
(Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	416.0	30.5%	949	86.3	167.0	Inició la colocación de escamas
Muro Mecánicamente estabilizado		1,365	416.0	30.5%	949	86.3	167.0	
(Colocacion de Escamas)	m3	12,940	979	7.6%	11,961	1,495.1	406.0	
Muro Mecánicamente estabilizado		12,940	979	7.6%	11,961	1,495.1	406.0	
Relleno	pieza	4	0	0.0%	4	0.0	0.0	
Losa de concreto Hidráulico	Actividad	2	0	0.0%	2	0.0	0.0	
Pavimento de concreto Hidráulico	Actividad	2	0	0.0%	2	0.0	0.0	
Alumbrado	Actividad	2	0	0.0%	2	0.0	0.0	
Señalamiento	Actividad	2	0	0.0%	2	0.0	0.0	
Semaforización	Actividad	1	0	0.0%	1	0.0	0.0	
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	0	0.0%	5,032.00	0	0	
Base Hidráulica	m3	3,992.0	0	0.0%	3,992.00	0	0	
Riego de impregnación	m2	20,330.0	0	0.0%	20,330.00	0	0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.00	0	0	
Banqueta	m2	6,922.0	0	0.0%	6,922.00	0	0	
Relleno	m3	692.0	0	0.0%	692.00	0	0	

