

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Avance global

• Programado: 8.88%

• Real: 14.00%

• Semanal: 0.70%

• Financiero: 11.60%

Avance 2025

• Programado: 63.43%

• Real: 100.00%

• Semanal: 5.00%

• Financiero: 82.56%



Inversión total 2025-2026: 650 mdp

Inversión 2025: 100 mdp | 14% de 1 Distribuidor Vial



Meta total: 1 Distribuidor | 1.204 km (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)



Inicio: 16 de julio de 2025

Término: 31 de diciembre de 2026

Termino meta 2025: 31 de diciembre




73,215 habitantes beneficiados



1,950 empleos generados



20 min ahorro en tiempo

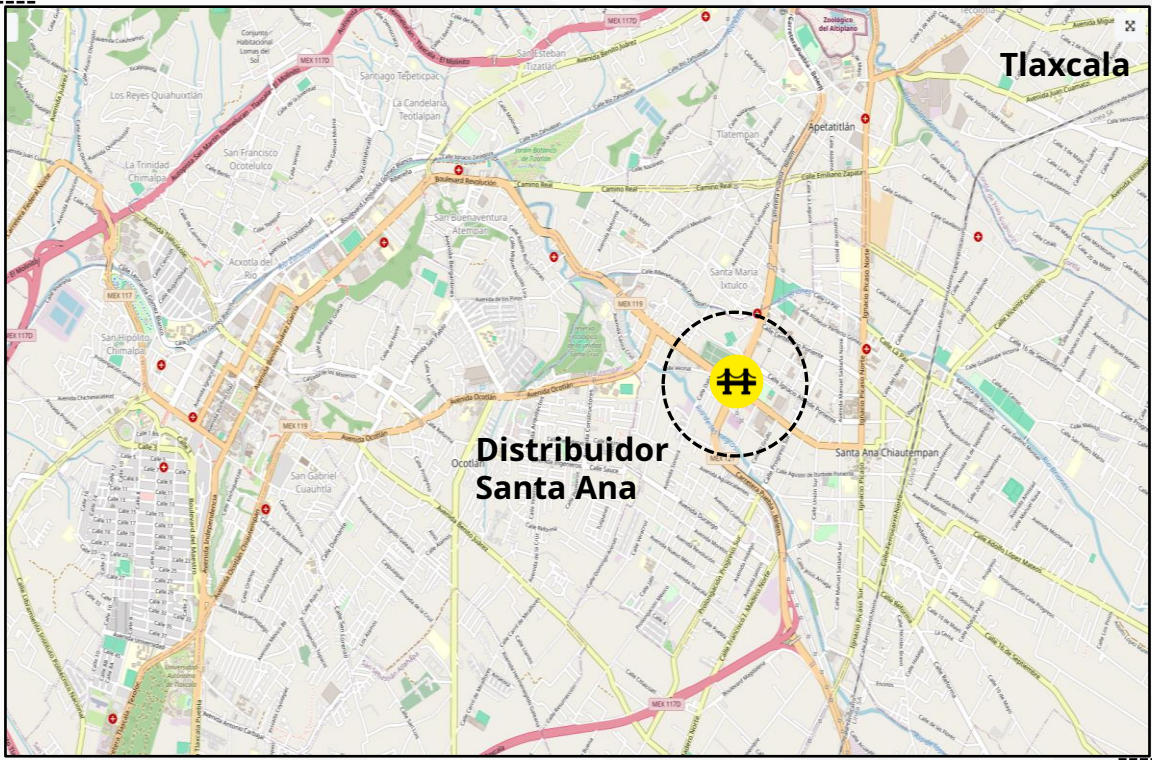


Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

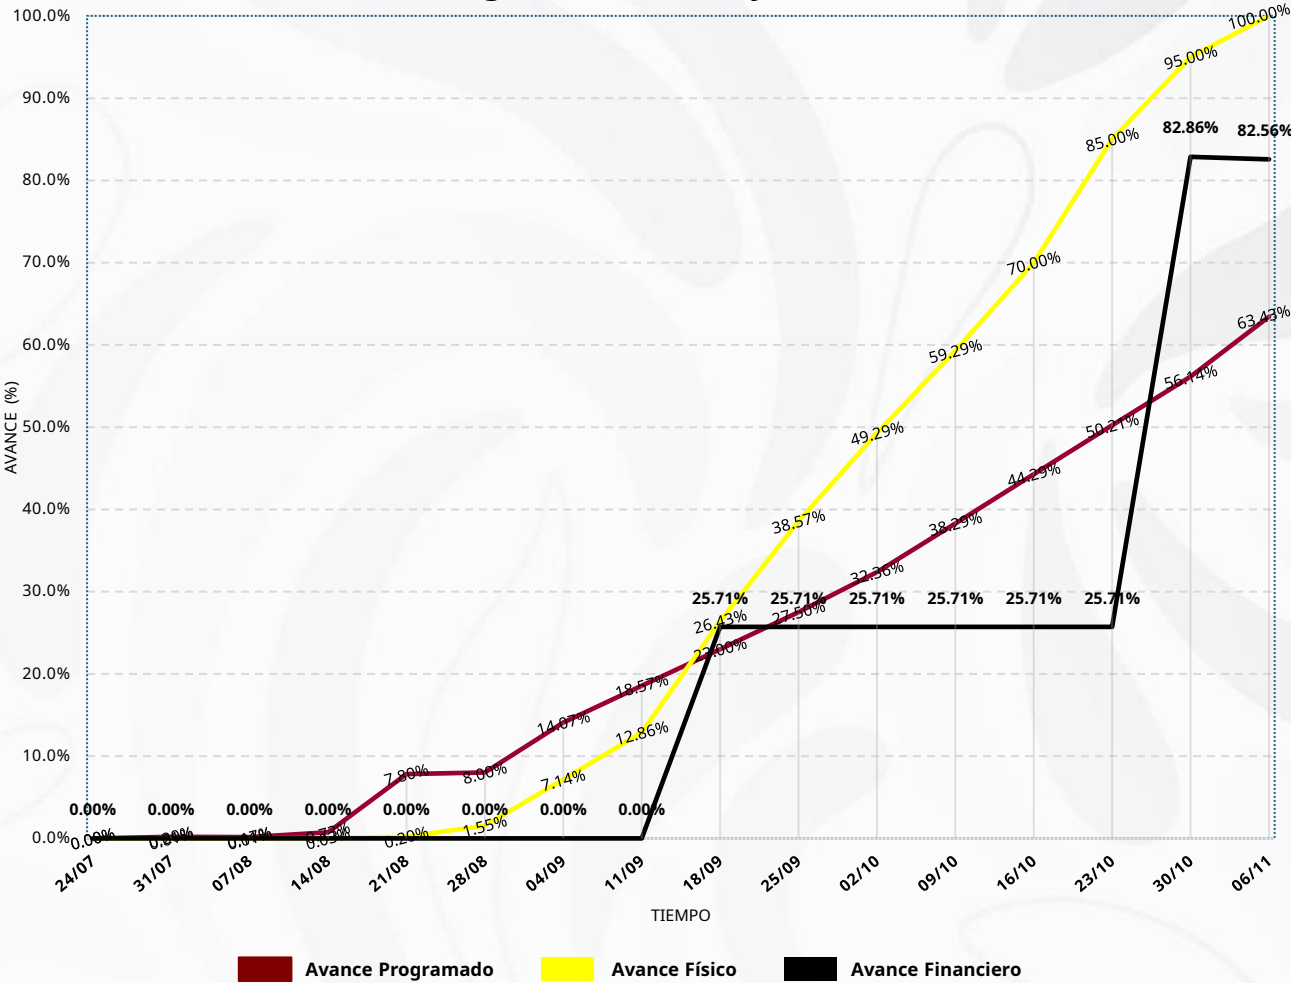

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	31-10-25 al 06-11-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	14% de 1 Distribuidor Vial	14.00% del 14% de 1 Distribuidor Vial	0.0% del 14% de 1 Distribuidor Vial	1.02%	0.70%	Se trabaja en pilas de los ejes #17 y 18; así como, en zapatas en los ejes #4 a 5, #7 al #10.

	24 al 30 de octubre	31 de octubre al 06 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	120	115
Maquinaria	22	21
