

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa

Avance global

- Programado: 69.46%
- Real: 82.59% (*Concluido, se trabajan calles laterales*)
- Semanal: 0.07%
- Financiero: 60.13%



Inversión total 2025-2026: 405.0 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total



Inversión 2025: 225.0 mdp
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 180.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km



Inicio: 18 de agosto de 2025
Término: Febrero 2026. Se realizan calles laterales
La fecha de terminación contractual es agosto 2026



862,037 Habitantes beneficiados




1,140 empleos generados



20 min ahorro en tiempo

Beneficios

Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

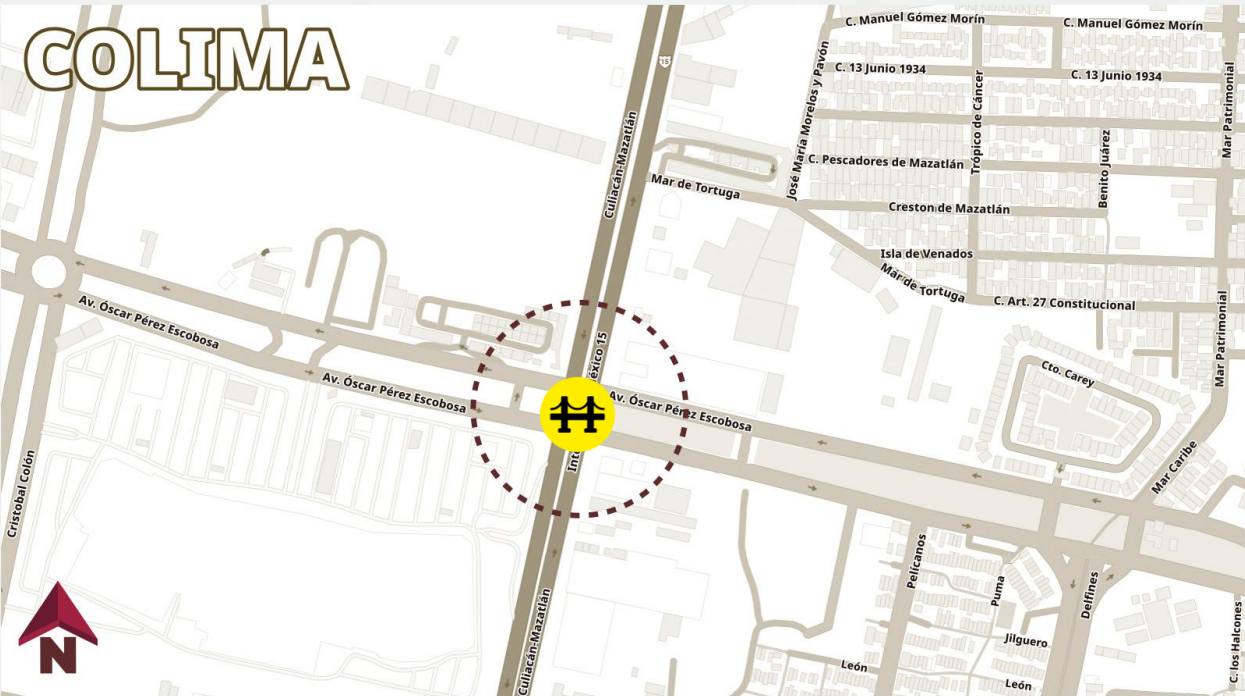


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

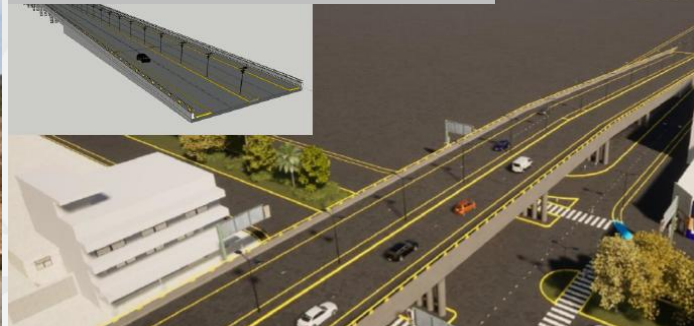

Proyecto

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.


PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa



Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 20 al 26/02/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.1	0.0	Falta proyecto de semaforización y diseño
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Superestructura Fabricación de Traves AASHTO IV	Actividad	77	77	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Superestructura Montaje de Traves AASHTO IV	pieza	77	77	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Superestructura Fabricación de Traves Nebraska	pieza	11	11	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Superestructura Montaje de Traves Nebraska NU240	pieza	11	11	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	12,940	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Dala de Cerramiento	m	421.2	421.2	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Losa de concreto Hidráulico Accesos	Pieza	3	3.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	
Junta de Calzada	Pieza	4	4	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Guarnición	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Parapeto	m	958.0	958.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Alumbrado	Actividad	2	2.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Señalamiento	Actividad	2	0.3	15.0%	2	0.3	0.0	
Semaforización	Actividad	1	1.0	100.0%	0	0.3	0.0	Concluido
Barrera Central	m	587.0	587	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	2,109.0	41.9%	2,923.0	0	0.0	
Relleno Fluido	m3	2,174.0	1,094.0	50.3%	1,080.0	0	0.0	
Riego de impregnación	m2	20,330.0	0	0.0%	20,330.0	0	0.0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.0	0	0.0	
Banqueta	m2	6,922.0	580.0	8.4%	6,342.0	0	200.0	
Relleno	m3	692.0	280.0	40.5%	412.0	0	242.0	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

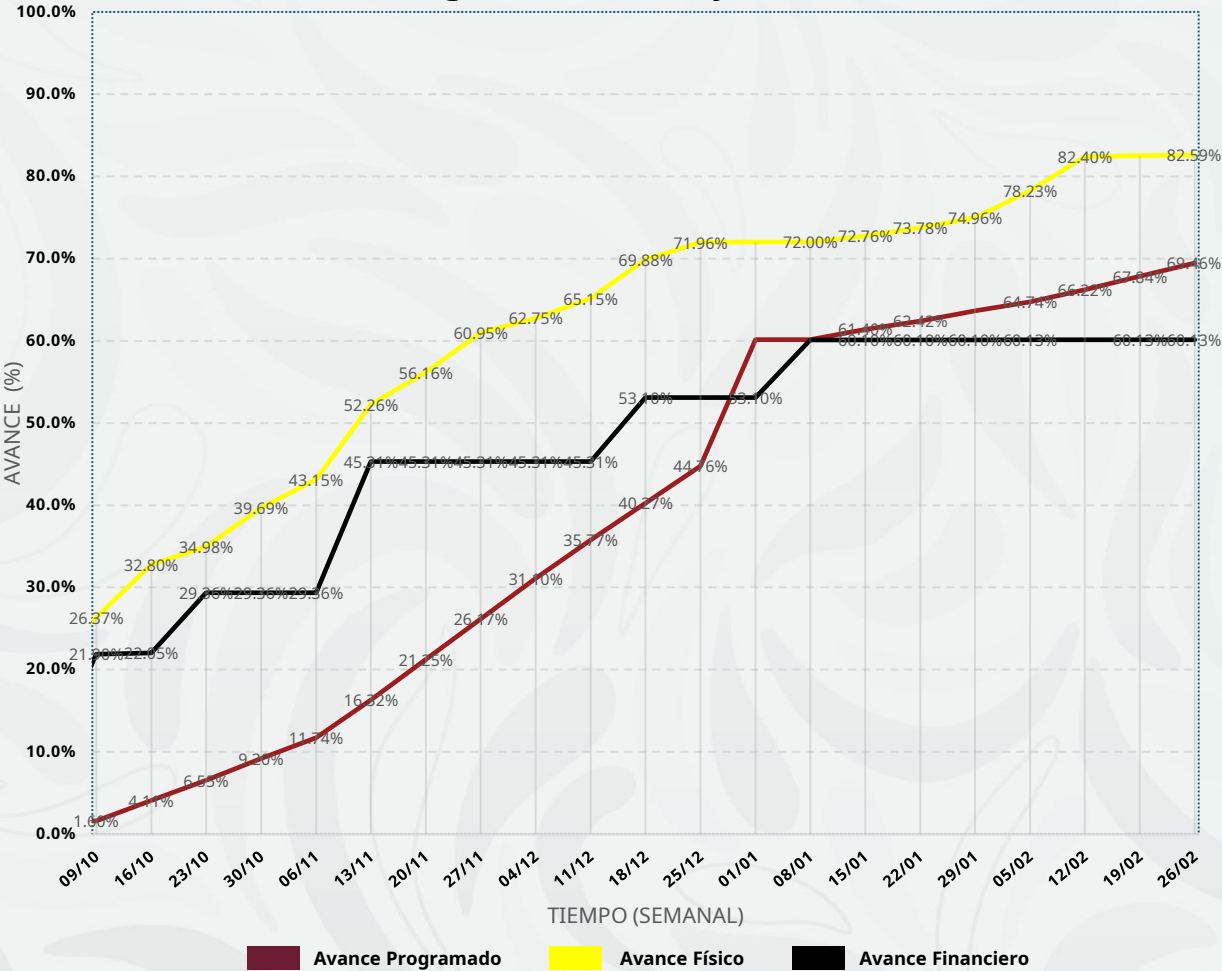

	Del 13 de Febrero al 19 de Febrero	Del 20 de Febrero al 26 de Febrero
Personal	163	78
Maquinaria	13	11
Frentes de trabajo	10	5
