

Puente El Chical

Colima

Avance global

• Programado: 14.16 %	• Semanal: 3.52 %
• Real: 27.16 %	• Financiero: 19.50 %

Avance 2025

• Programado: 62.12 %	• Semanal: 5.00 %
• Real: 100.0 %	• Financiero: 85.52 %

 **Inversión total 2025-2026:** 110 mdp
Inversión 2025: 20.6 mdp


 **Meta total:** 0.736 km
Meta 2025: 24.0 % del Puente

 **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025
Fecha de término: 10 de agosto, 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre, 2025

 **4,053** habitantes beneficiados

 **330** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

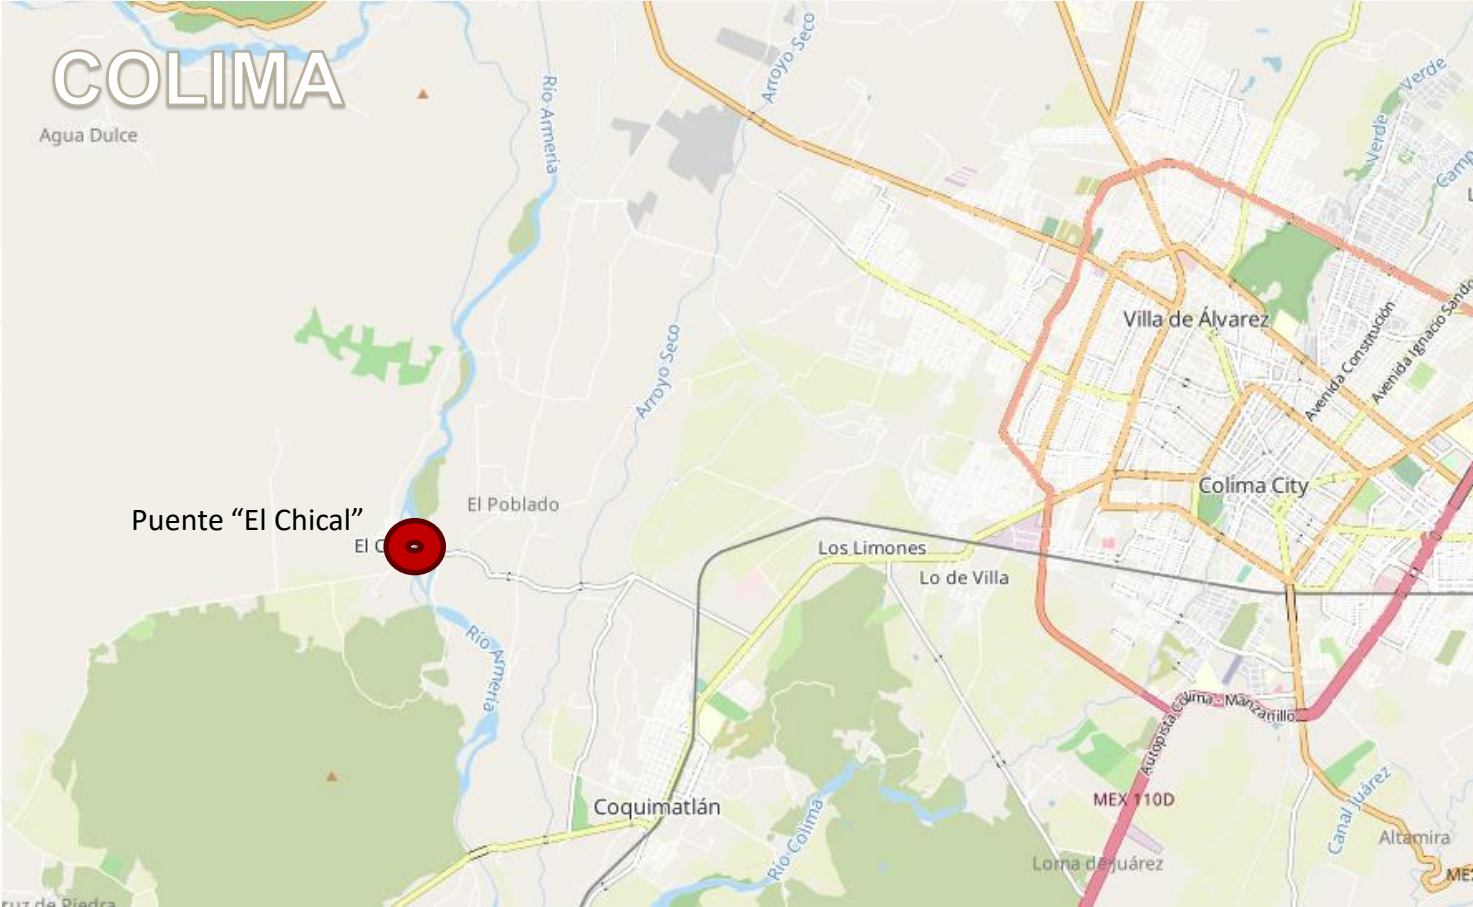

Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	• Contratista: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLA COMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V • Supervisión: ---

Puente El Chical

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	07/11/25 al 13/11/25	
				Programado	Ejecutado
Resumen de Obra					
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0
Pilas de cimentación (Pza)	24.0	24.0	0.0	3.0	3.0
Columnas (Pza)	30.0	24.0	6.0	2.0	6.0
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	6.0	4.0	1.3	1.0
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	11.0	34.0	8.5	0.0
Montaje de trabes (Pza)	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	0.0	648.0	0.0	0.0
Carpeta Asfáltica (m3)	166.8	0.0	166.8	0.0	0.0
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	0.0	720.0	0.0	0.0
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	86,850.0	38,150.0	8,000	13,500

