

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)



Gobierno de
México


Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 34.84%
- Real: 18.29%
- Semanal: 1.46%
- Financiero: 9.82%

Avance 2025

- Programado: 96.0%
- Real: 57.0%
- Semanal: 0.9%
- Financiero: 23.74%

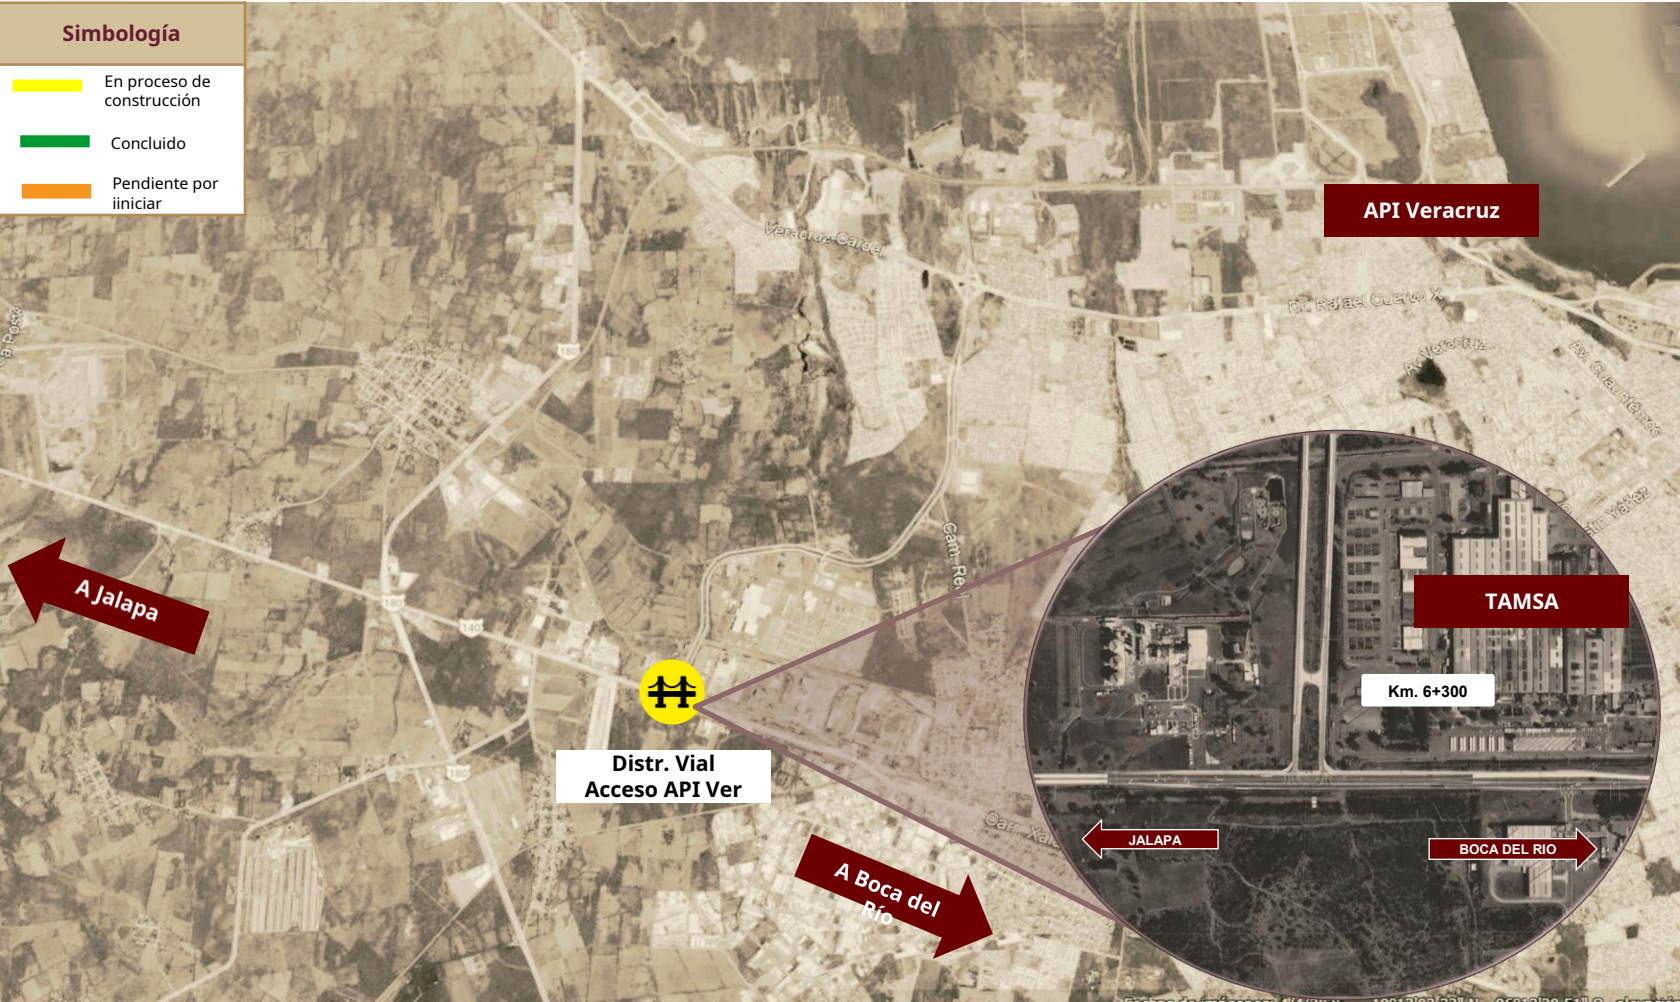

Inversión total 2025-2026: 840 mdp
Inversión 2025: 326 mdp | 0.6 km de PSV



Meta total 2025-2026: 1.97 km
1 PSV: 0.872 km
Accesos: 0.532 km
Transiciones: 0.566 km



Inicio: 14 de julio de 2025
Término: Diciembre de 2026
Termino meta 2025: Diciembre



780,441 habitantes beneficiados



2,235 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 07 al 13/11/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.00	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	6,295.00	6,245.0	99.2%	50.00	50.00	719.0	Continúa el despalme en cuerpo B
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.00	0.0	
Excavaciones	m³	49,951.00	30,887	61.8%	19,064.00	23,095.00	4,031.0	
Terraplenes	m³	36,650.00	17,209	47.0%	19,441.00	19,441.00	0.0	
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,531.00	0	0.0%	1,531.00	1,531.00	0.0	
Terraplenes en Rampa	m³	4,384.00	0	0.0%	4,384.00	4,384.00	0.0	
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	0	0.0%	3,090.00	515.00	0.0	
Paraderos	pza.	1	0	0.0%	1	0.00	0.0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0	Concluida la construcción de pilotes del cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	0	5	1	Concluida la construcción de zapatas del cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	20	95.2%	1	1	0	Pendiente la columna del eje 3
Cabezales	pza.	23	19	82.6%	4	2	4	Se tienen 19 cabezales concluidos y 2 cabezales más en proceso
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	33	25.0%	99	50	9	Se tienen 33 trabes concluidas y 4 trabes adicionales con armado
Montaje de trabes	pza.	132	12	0.0%	120	40	12	Se tienen 2 claros del cpo B con trabes montadas.
Diafragmas	pza.	110	0	0.0%	110	14	0	
Losa (claro)	m³	1,723.00	0	0.0%	1,723	0.0	0	En proceso de colocón de cimbra, el claro 22-23 del cpo B

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

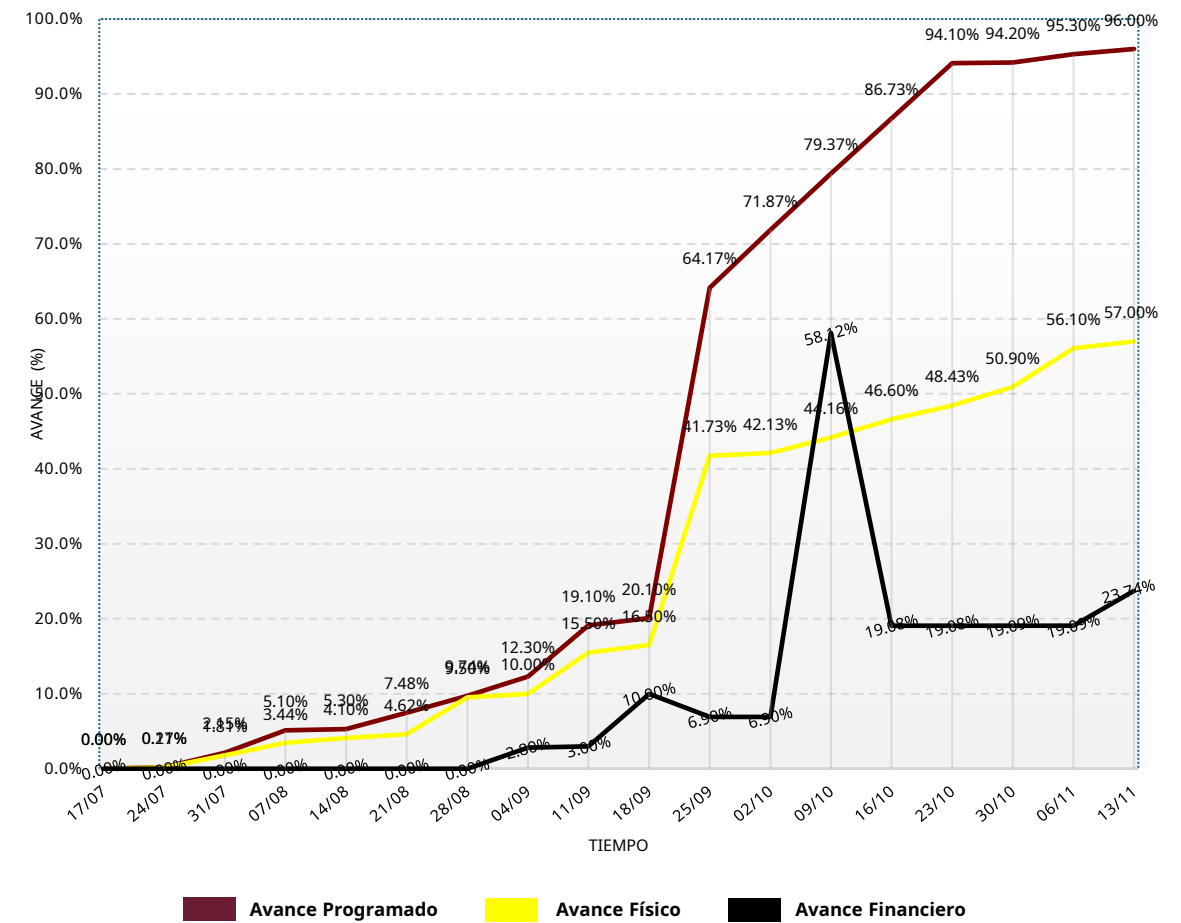

	31 de octubre al 06 de Noviembre	07 de Noviembre al 13 de Noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	113	127
Maquinaria	23	26

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Cuerpo A (programa 2026)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 07 al 13/11/25		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.07	0.00	0.0%	4.07	0.00	0.00	Programa 2026
Despalme	m³	6,292.00	0.0	0.0%	6,292.00	0.00	0.00	Programa 2026
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.00	0.00	Programa 2026
Excavaciones	m³	49,951.00	0	0.0%	49,951.00	0.00	0.00	Programa 2026
Terraplenes	m³	36,650.00	0	0.0%	36,650.00	0.00	0.00	Programa 2026
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,530.00	0	0.0%	1,530.00	0.00	0.00	Programa 2026
Terraplenes en Rampa	m³	4,385.00	0	0.0%	4,385.00	0	0	Programa 2026
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	0	0.0%	3,090.00	0	0	Programa 2026
Paraderos	pza.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	Programa 2026
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	0	0.0%	132	0	0	Programa 2026
Zapatas	pza.	21	0	0.0%	21	0	0	Programa 2026
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	23	0	0.0%	23.00	0	0	Programa 2026
Cabezales	pza.	23	0	0.0%	23.00	0	0	Programa 2026
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	0	0.0%	132.00	0	0	Programa 2026
Montaje de trabes	pza.	132	0	0.0%	132.00	0	0	Programa 2026
Diafragmas	pza.	110	0	0.0%	110.00	0	0	Programa 2026
Losa (claro)	m³	1,723.00	0	0.0%	1,723.00	0	0	Programa 2026
