

Puente El Chical

Colima

Avance global

- Programado: 10.68 %
- Real: 13.49 %
- Semanal: 2.27 %
- Financiero: 7.65 %

Avance 2025

- Programado: 46.84 %
- Real: 59.17 %
- Semanal: 9.96 %
- Financiero: 28.9 %

 **Inversión total 2025-2026:** 110 mdp
Inversión 2025: 20.6 mdp


 **Meta total:** 0.736 km 0.370 km de puente y 0.369 km de accesos **(es un Proyecto Integral y el Proyecto Ejecutivo fue entregado)**
Meta 2025: 22.8 % del Puente

 **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025
Fecha de término: 10 de agosto, 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre, 2025

 **4,053** habitantes beneficiados

 **330** empleos generados

 **15 min** ahorro en tiempo

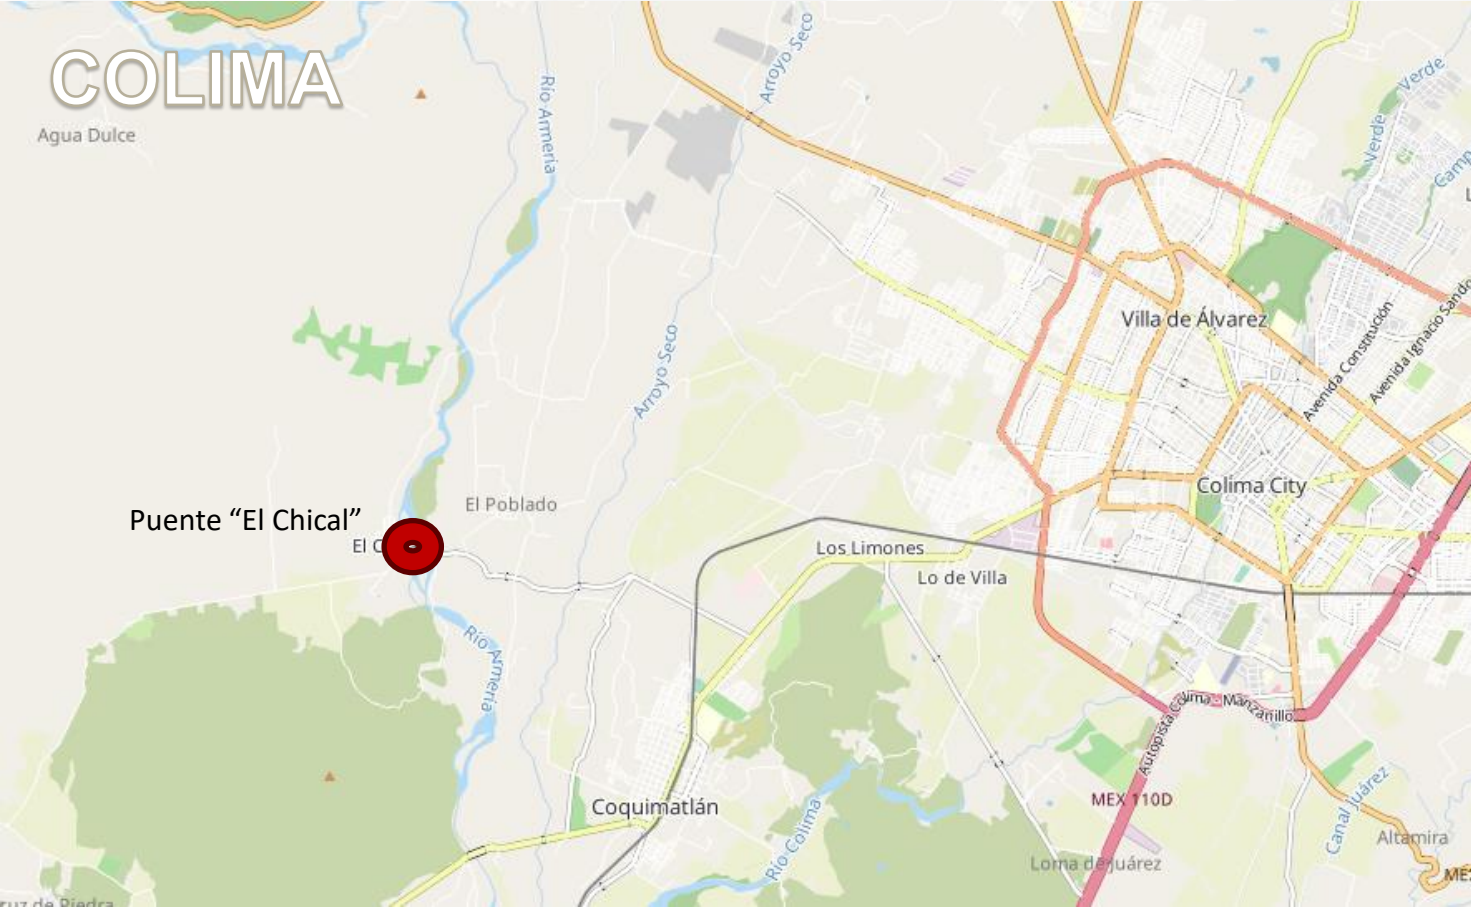

Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	• Contratista: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V • Supervisión: ---

Puente El Chical

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	10/10/25 al 16/10/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0	
Pilas de cimentación (Pza)	24.0	14.0	10.0	3.0	2.0	
Columnas (Pza)	30.0	8.0	22.0	2.57	3.0	
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	1.0	9.0	0.0	0.0	
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	
Montaje de trabes (Pza)	45.0	0.0	45.0	0.0	0.0	
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	0.0	648.0	0.0	0.0	
Carpeta Asfáltica (m3)	166.8	0.0	166.8	0.0	0.0	
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	0.0	720.0	0.0	0.0	
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0	
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	51,900.0	73,100.0	15,000.0	17,300.0	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

