

# Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)



Gobierno de  
**México**


**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

### Avance global

- Programado: 26.02%
- Real: 13.98%
- Semanal: 0.73%
- Financiero: 7.89%

### Avance 2025

- Programado: 86.73%
- Real: 46.6%
- Semanal: 2.44%
- Financiero: 19.08%

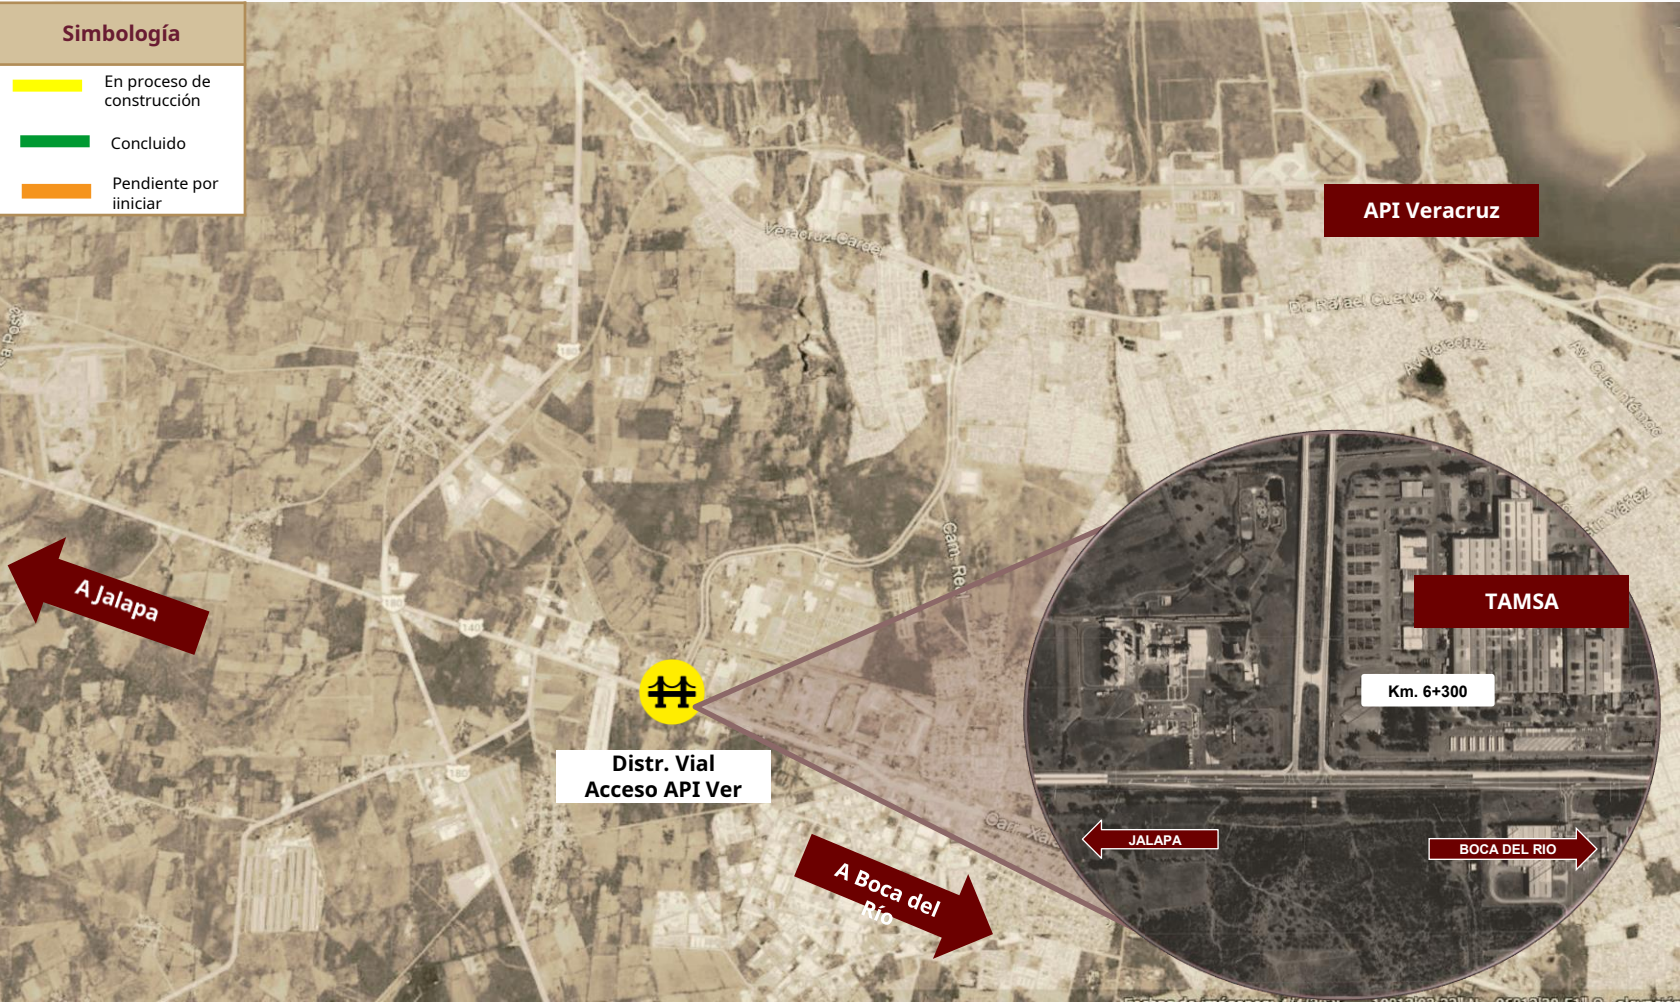

**Inversión total 2025-2026: 840 mdp**  
**Inversión 2025:** 326 mdp | 0.6 km de PSV

**Meta total 2025-2026: 1.97 km**  
1 PSV: 0.872 km  
Accesos: 0.532 km  
Transiciones: 0.566 km

**Inicio:** 14 de julio de 2025  
**Término:** Diciembre de 2026  
**Termino meta 2025:** Diciembre

**780,441** habitantes beneficiados

**2,235** empleos generados

**25 min** ahorro en tiempo

### Empresas


- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.

# Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

## Cuerpo B (programa 2025)

| Elemento                           | Unidad | Volumen<br>Total | Ejecutado<br>Acumulado | Faltante | Ejecutado del 10 al<br>16/10/25 |           | Observaciones |                                                       |
|------------------------------------|--------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|
|                                    |        |                  |                        |          | Programado                      | Ejecutado |               |                                                       |
| TERRACERÍAS                        |        |                  |                        |          |                                 |           |               |                                                       |
| Desmonte                           | Ha     | 4.10             | 4.10                   | 100%     | 0.00                            | 0.00      | 0.0           | Concluido en el cpo B                                 |
| Despalme                           | m³     | 6,295.00         | 5,526.0                | 87.8%    | 769.00                          | 769.00    | 0.0           |                                                       |
| Obra Inducida                      | Lote   | 1                | 0                      | 0        | 1                               | 0.00      | 0.0           |                                                       |
| Excavaciones                       | m³     | 49,951.00        | 17,909                 | 35.9%    | 32,042.00                       | 32,042.00 | 1,056.0       |                                                       |
| Terraplenes                        | m³     | 36,650.00        | 9,212                  | 25.1%    | 27,438.00                       | 6,895.50  | 1,900.0       |                                                       |
| Muro Mecánicamente<br>Estabilizado | m³     | 1,531.00         | 0                      | 0.0%     | 1,531.00                        | 510.30    | 0.0           |                                                       |
| Terraplenes en Rampa               | m³     | 4,384.00         | 0                      | 0.0%     | 4,384.00                        | 1,461.30  | 0.0           |                                                       |
| Pavimentos asfálticos              | m³     | 3,090.00         | 0                      | 0.0%     | 3,090.00                        | 0.00      | 0.0           |                                                       |
| Paraderos                          | pza.   | 1.00             | 0                      | 0.0%     | 1.00                            | 0.00      | 0.0           |                                                       |
| INFRAESTRUCTURA                    |        |                  |                        |          |                                 |           |               |                                                       |
| Pilotes                            | pza.   | 132              | 132                    | 100.0%   | 0                               | 0         | 0             | Concluido en el cpo B                                 |
| Zapatas                            | pza.   | 21               | 20                     | 95.2%    | 1                               | 5         | 4             | En proceso de armado 2 zapatas<br>adicionales         |
| SUBESTRUCTURA                      |        |                  |                        |          |                                 |           |               |                                                       |
| Columnas (pza)                     | pza.   | 21               | 17                     | 81.0%    | 4.00                            | 4         | 3             | En proceso de armado 2<br>columnas adicionales        |
| Cabezales                          | pza.   | 23               | 3                      | 13.0%    | 20.00                           | 4         | 1             |                                                       |
| SUPERESTRUCTURA                    |        |                  |                        |          |                                 |           |               |                                                       |
| Trabes tipo AASHTO VI              | pza.   | 132              | 5                      | 3.8%     | 127.00                          | 21        | 0             | Se tiene habilitado el acero de 15<br>trabes en total |
| Montaje de trabes                  | pza.   | 132              | 0                      | 0.0%     | 132.00                          | 0         | 0             |                                                       |
| Diafragmas                         | pza.   | 110              | 0                      | 0.0%     | 110.00                          | 0         | 0             |                                                       |
| Losa (claro)                       | m³     | 1,723.00         | 0                      | 0.0%     | 1,723.00                        | 0.0       | 0             |                                                       |

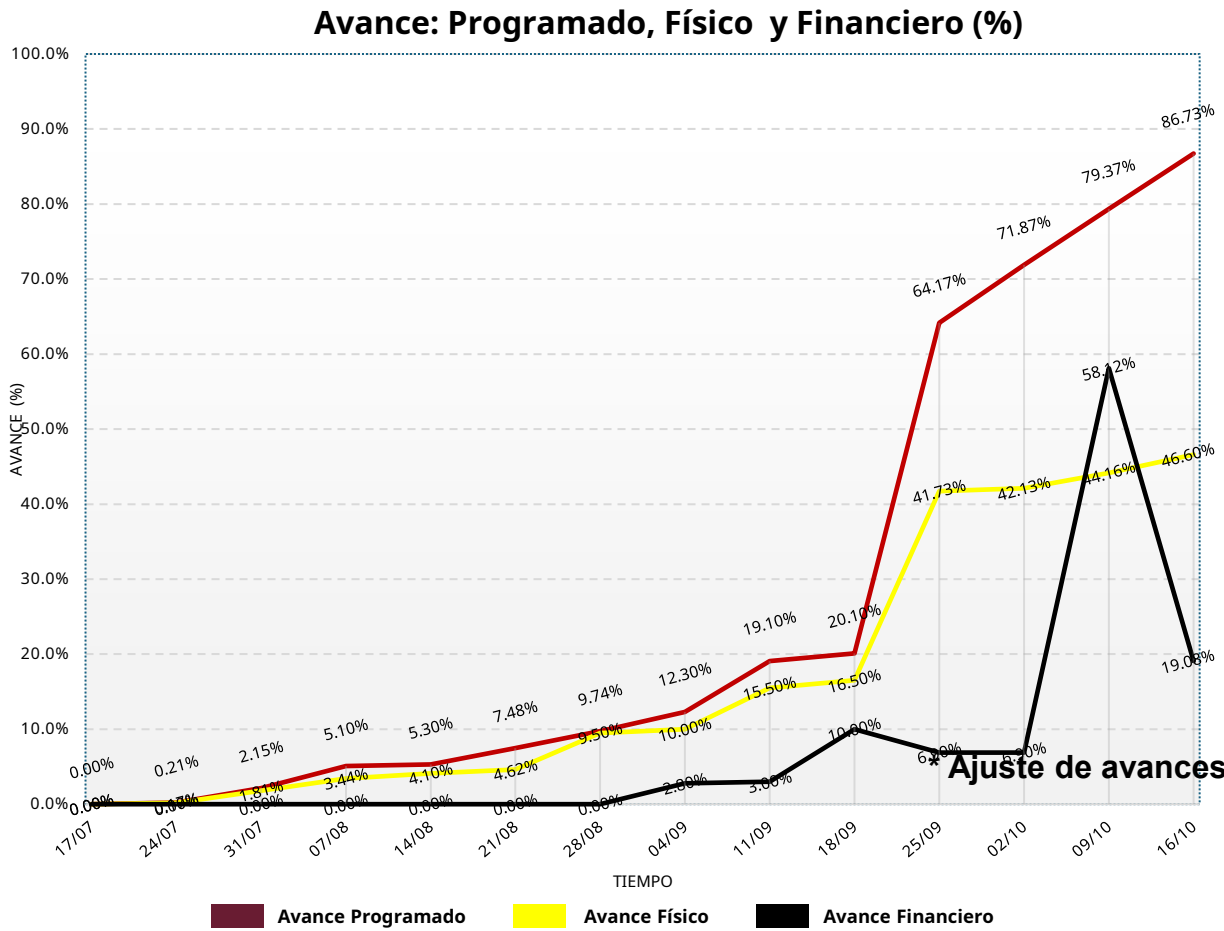

|                              | 03 de octubre al 09 de Octubre | 10 de octubre al 16 de Octubre |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 126                            | 126                            |
| Maquinaria                   | 24                             | 24                             |
