

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

- Avance global**
 - Programado: 4.11%
 - Real: 32.8%
 - Semanal: 6.43%
 - Financiero: 22.05%
- Avance 2025**
 - Programado: 8.22%
 - Real: 65.6%
 - Semanal: 12.86%
 - Financiero: 39.25%

- Inversión total 2025-2026:** 380.0 mdp
Inversión 2025: 200.0 mdp | (50% de PSV)
- Meta total:** PSV | 0.811 km longitud total
- Inicio:** 18 de agosto de 2025
Término: Agosto 2026
Término meta 2025: Diciembre
- 862,037** Habitantes beneficiados
- 1,140** empleos generados
- 20 min** ahorro en tiempo

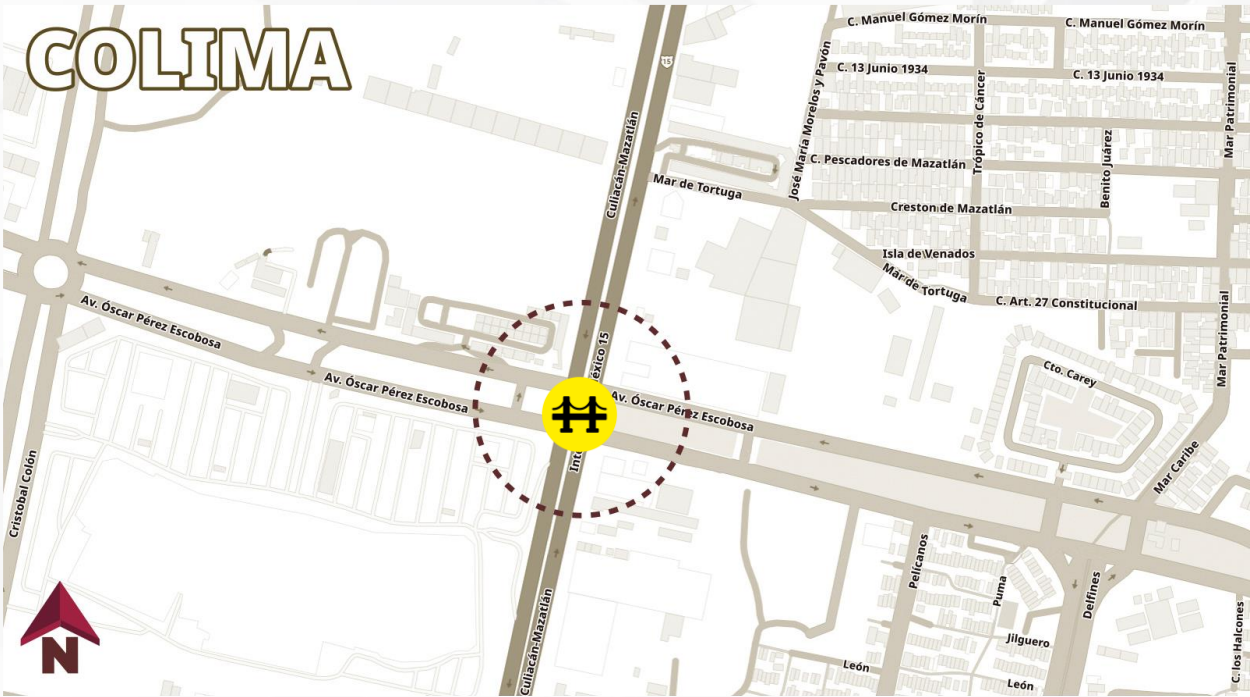


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

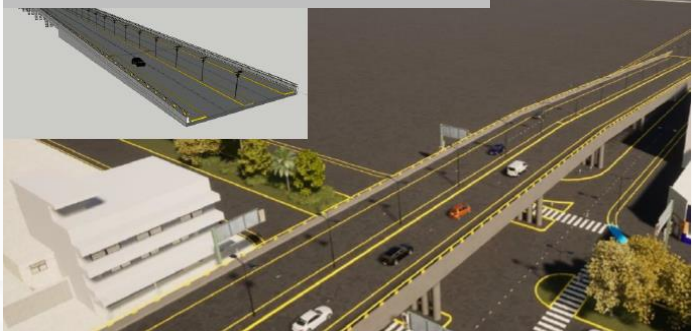

Proyecto


Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Sinaloa

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 10 al 16/10/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.6	80.0%	0.4	0.2	0.2	Se continua trabajos de sondeos
Cimentación	Apoyo	9	8.5	94.4%	0.5	0.1	0.5	Se tiene un total de 48 pilotes concluidos
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	4.3	47.8%	4.7	0.78	0.3	Se tiene un total de 33 columnas concluidas y un cabezal
Superestructura Fabricación de Trabes AASHTO IV	Actividad	77	14	18.2%	63	11.0	6.0	
Superestructura Montaje de Trabes AASHTO IV	pieza	77	0	0.0%	77	0.0	0.0	
Superestructura Fabricación de Trabes Nebraska NU240	pieza	11	0	0.0%	11	0.0	0.0	
Superestructura Montaje de Trabes Nebraska NU240	pieza	11	0	0.0%	11	0.0	0.0	
Muro Mecánicamente estabilizado (Fabricacion de Escamas)	m2	1,365	969.0	71.0%	396.0	151.7	968.7	
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	Actividad	1	0	0.0%	1	0.0	0.0	
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	Actividad	1	0	0.0%	1	0.0	0.0	
Losa de concreto Hidráulico	pieza	4	0	0.0%	4	0.0	0.0	
Pavimento de concreto Hidráulico	Actividad	2	0	0.0%	2	0.0	0.0	
Alumbrado	Actividad	2	0	0.0%	2	0.0	0.0	
Señalamiento	Actividad	2	0	0.0%	2	0.0	0.0	
Semaforización	Actividad	1	0	0.0%	1	0.0	0.0	
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	0	0.0%	5,032.00	0	0	
Base Hidráulica	m3	3,992.0	0	0.0%	3,992.00	0	0	
Riego de impregnación	m2	20,330.0	0	0.0%	20,330.00	0	0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.00	0	0	
Banqueta	m2	6,922.0	0	0.0%	6,922.00	0	0	
Relleno	m3	692.0	0	0.0%	692.00	0	0	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

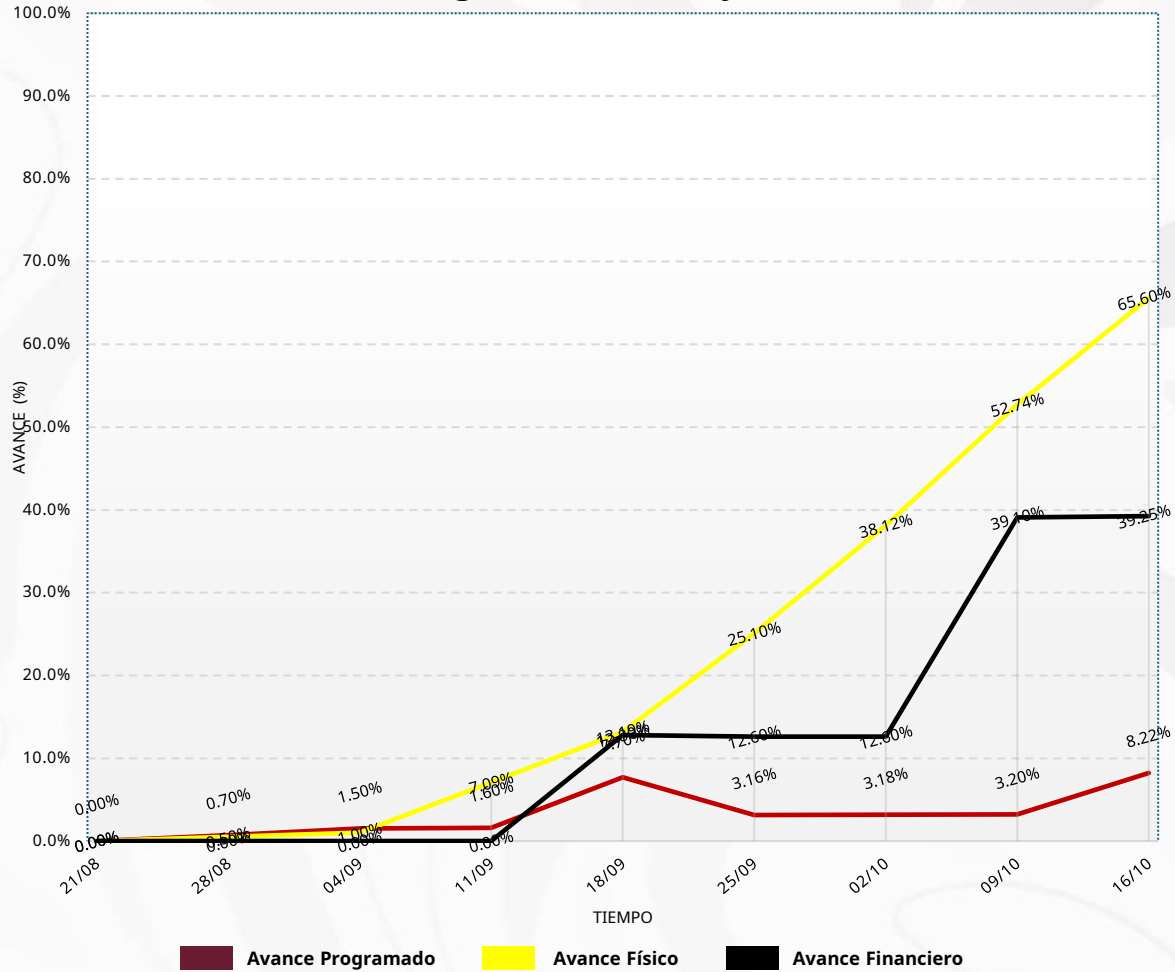

	Del 03 de octubre al 09 de octubre	Del 10 de octubre al 16 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	145	155
Maquinaria	14	15
