


Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026

Avance global

- Programado: 22.57%
 - Real: 37.53%
- Semanal: 1.53%
 - Financiero: 30.59%

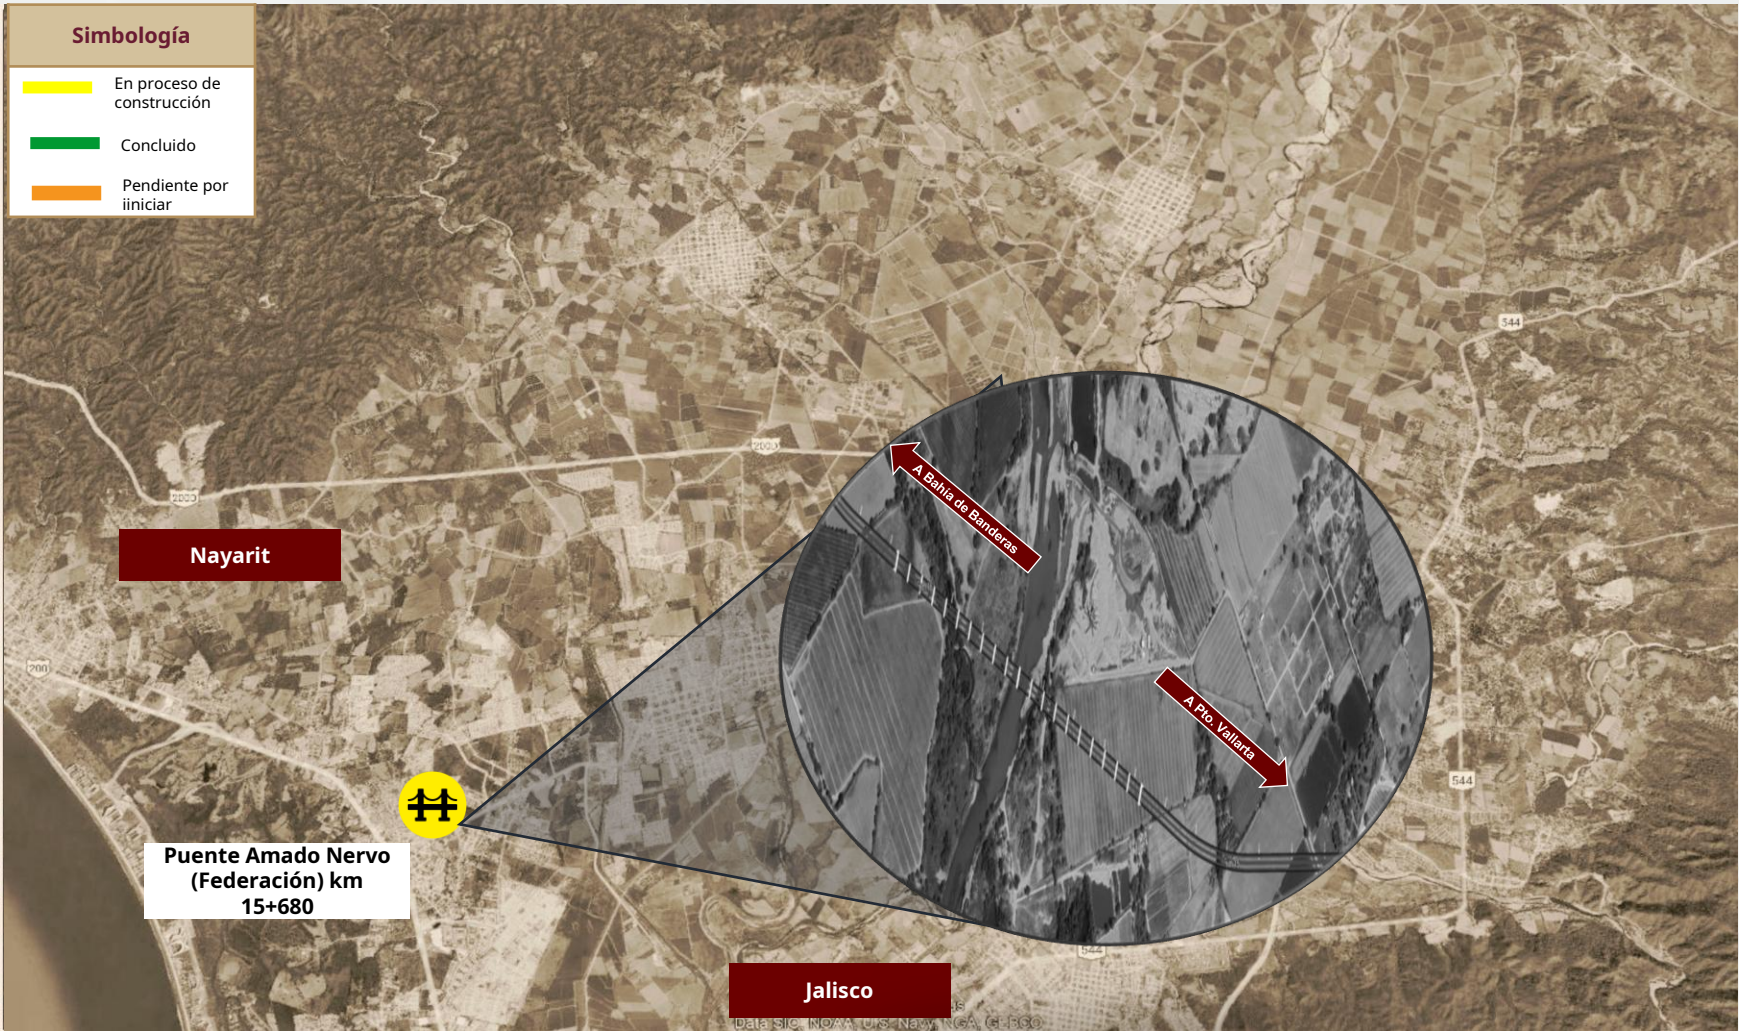



Inversión total 2025-2026: 930.0 mdp
Inversión 2025: 230.0 mdp | 0.7 km



Meta total: 1 Puente | 0.798 km
Accesos | 1.222 km



Inicio: 14 de julio de 2025
Término: Septiembre de 2026



479,471 habitantes beneficiados



2,700 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Empresas	
• Contratista:	Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
• Supervisión:	Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680


(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 09 al 15/01/2026		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	2.00	28.6%	5.00	5.00	0	Concluido lado Nayarit, se realiza desmonte lado Jalisco.
Despalme	m3	14,042.0	7,866.2	56.0%	6,175.8	6,175.80	0	Concluido lado Nayarit, se realiza despalme lado Jalisco
Cortes	m3	10,823.0	0.0	0.0%	10,823.0	10,823.00	0	
Terraplenes	m3	161,117.0	47,250	29.3%	113,867.0	3,077.50	0	Se continuan trabajos de pedraplén en el lado Jalisco.
Base Estabilizada	m3	6,192.0	0	0.0%	6,192.0	0.00	0	
Losa de Concreto Hidráulico	m3	9,687.0	0	0.0%	9,687.0	0.00	0	
Losas de Acceso	m3	83.0	0	0.0%	83.0	0.00	0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	126	100.0%	0	0	0	Concluidos
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	115	91.3%	11	5	2	Se tienen coladas 115 columnas de los apoyos 1 al 10 y 12 al 21.
Cabezales	pza.	21	18	85.7%	3	1	0	Se tienen colados 18 cabezales de los apoyos 1 al 6, 8, 9 y 12 al 21
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	59	36.9%	101	6	9	Se tienen coladas 59 trabes y se trabajan en los armados de 2 adicionales.
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	40	25.0%	120	8	4	Se tienen montados los claros 14-15 al 16-17, 18-19 y 19-20.
Losas y Diafragmas	m3	4,450.40	0	0.0%	4,450.40	0	0	
Parapeto y Guarnición	m	1,597.00	0	0.0%	1,597.00	0	0	
Obras de Drenaje	pza.	4.00	2	43.8%	2.00	0	0	Se continúa el acomodo de cajones de concreto prefabricados en el lado Jalisco.
PASOS SUPERIORES								
PSV's	pza.	2.00	1.3	65.0%	0.70	0.7	0	Se continua con el armado y colado de PSV lado Nayarit y PSV lado Jalisco.
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
SEÑALAMIENTO								

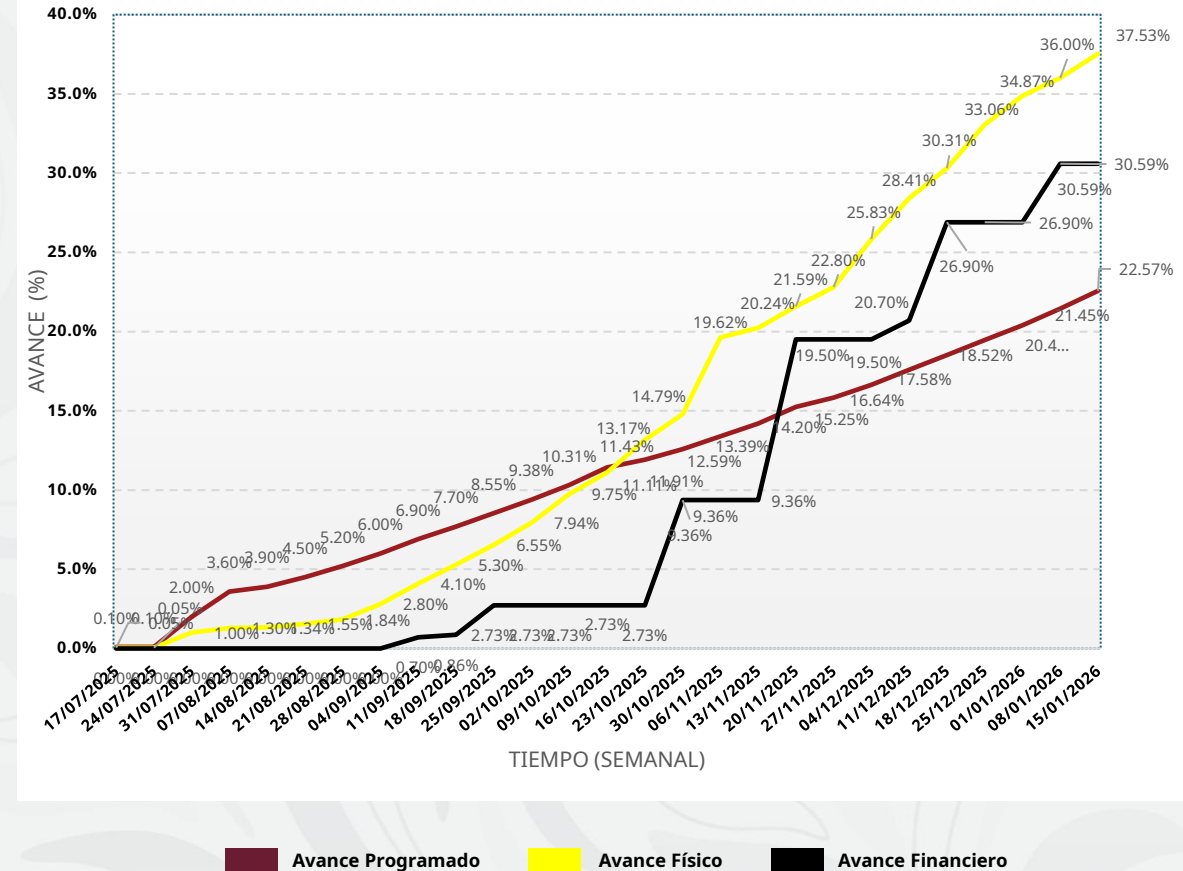

	02 de Enero al 08 de Enero	09 de Enero al 15 de Enero
Fuerza de Trabajo (personas)	41	60
Maquinaria	21	21
Frentes de trabajo	5	5
