

PSV Arco Norte

Colima

- Avance global

• Programado: 53.55%

• Real: 57.25%

• Semanal: 1.39%

• Financiero: 34.11%
- 

Inversión total 2025-2026: 436.0 mdp

Inversión 2025: 185.0 mdp
- 

Meta total: 590 m longitud total, 298 m estructura, 292 m accesos.

Meta 2025: 200.6 m (34.1% (cimentación y subestructura))
- 

Inicio: 10 de junio de 2025

Término: abril 2026

Término meta 2025: diciembre
- 

306,810 habitantes beneficiados
- 

1,109 empleos generados
- 

15 min ahorro en tiempo




Tramo	Empresas
Construcción del Paso Superior Vehicular "Arco Norte"	• Contratista: IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V • Supervisión: JUVISA, INGENIERÍA, S.A DE C.V

PSV Libramiento Arco Norte

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	09/01/26 al 15/01/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos						
Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza)	530.0	530.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Demolición (m)	350.0	350.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Red de media tensión subterránea (m)	2,100.0	2,100.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Reubicación acueducto 36" (m)	736.0	736.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Terracerías						
Corte (m³)	9,295.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00	
Terraplén (m³)	9,292.00	0.00	9,292.00	0.00	0.00	
Subyacente (m³)	3,233.00	0.00	3,233.00	0.00	0.00	
Subrasante (m³)	4,706.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00	
Subestructura						
Pilas (pza)	76.00	76.00	0.00	4.13	0.00	Trabajos concluidos
Zapatas (pza)	20.00	20.00	0.00	1.25	0.00	Trabajos concluidos
Columnas (pza)	42.00	42.00	0.00	2.63	0.00	Trabajos concluidos
Cabezales (pza)	22.00	22.00	0.00	1.38	0.00	Trabajos concluidos

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

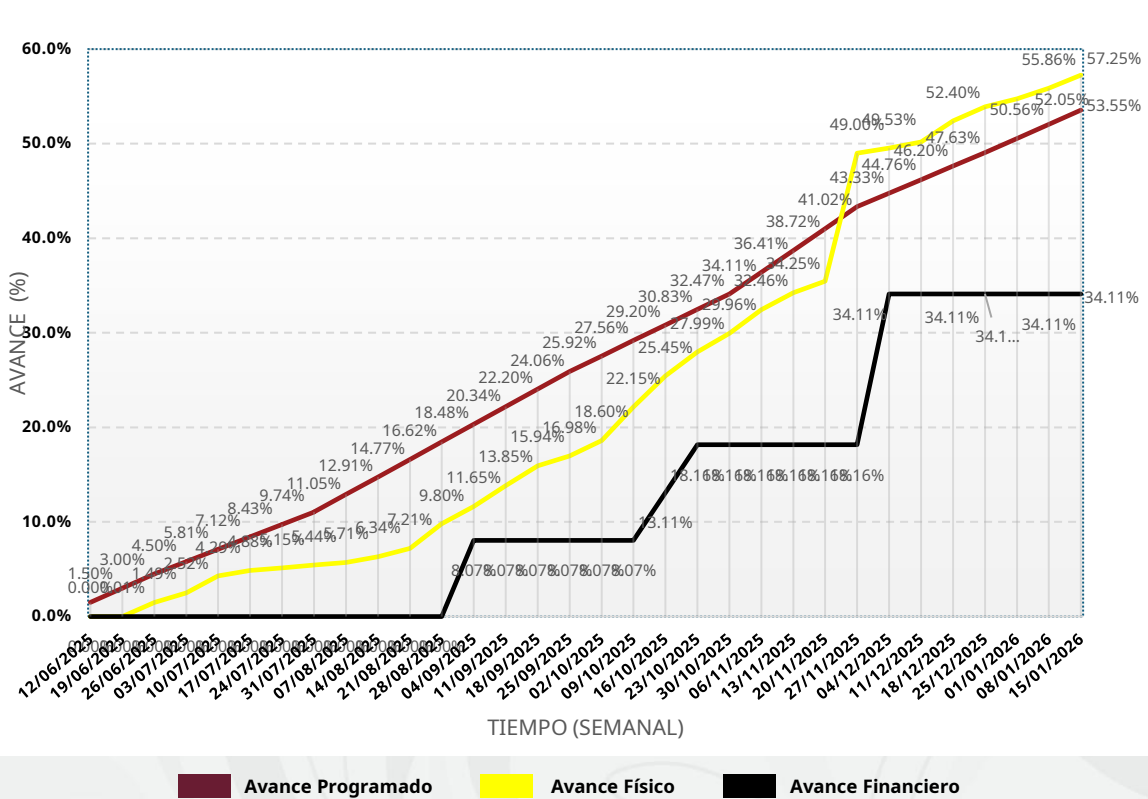

	02 de enero al 08 de enero	09 de enero al 15 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	70	80
Maquinaria	19	19
Frentes de trabajo	5	5
