

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)



Avance global

- Programado: 52.03%
- Real: 67.14%
- Semanal: 1.06%
- Financiero: 45.43%



Inversión total 2025-2026: 700 mdp
Inversión 2025: 319.94 mdp | 1.28 km del Deprimido



Meta total: 1 Deprimido | **1.5 km**
Gasas | 4.1 km



Inicio: 12 de mayo de 2025
Término: abril de 2026
Término meta 2025: Diciembre



351,000 habitantes beneficiados



2,100 empleos generados



25 min ahorro en tiempo




Tramo	Empresas
km 30+300	• Contratista: Convenio de participación conjunta de: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V. • Supervisión: INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	09/01/26 al 15/01/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Reforzamiento Puente Peatonal (lote)	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
Terracerías y Pavimentos						
Terracerías (m3)	14,112.0	6,940.4	7,171.6	940.8	400.0	
Excavación núcleo (m3)	100,069.2	71,364.0	28,705.2	7,697.6	2,800.0	
Base hidráulica (m3)	11,840.0	5,643.3	6,196.7	0.0	0.0	
Base asfáltica (m3)	5,545.0	142.1	5,402.9	0.0	0.0	
Carpeta asfáltica (m3)	1,992.0	142.1	1,849.9	0.0	0.0	
Relleno fluido (m3)	1,680.0	0.0	1,680.0	0.0	0.0	
Pavimento rígido (m3)	3,552.0	0.0	3,552.0	0.0	0.0	
Estructura Paso Inferior Vehicular						
Zapatas (pzas)	12.0	11.0	1.0	0.0	1.0	
Muros de 2 a 7 m (pzas)	12.0	10.0	2.0	0.0	0.0	
Trabes de liga (m)	1,123.6	498.0	625.6	0.0	0.0	
Contratrabes Metálicas (pza)	29.0	0.0	29.0		0.0	
Montaje trabes AASHTO tipo III (pzas)	52.0	32.0	20.0	0.0	6.0	
Concreto lanzado (m2)	7,000.0	0.0	7,000.0	0.0	0.0	
Losas de acceso (m2)	609.8	509.0	100.8	0.0	84.0	
Losas puentes (m2)	1,642.8	16.0	1,626.8	0.0	0.0	
Parapeto (m)	1,725.2	0.0	1,725.2	0.0	0.0	
Guarnición (m3)	375.0	52.1	322.9	0.0	3.0	
Banquetas (m3)	3,304.2	115.0	3,189.2	0.0	7.0	
Drenaje Pluvial (m)	1,600.0	0.0	1,600.0	0.0	0.0	
Registros Pluviales (pza)	32.0	0.0	32.0	0.0	0.0	
Semaforización y Señalamiento						
Semaforización (%)	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	
Horizontal (m)	29,901.7	0.0	29,901.7	0.0	0.0	
Vertical (pza)	273.0	0.0	273.0	0.0	0.0	
Obra inducida						
Alumbrado (pza)	305.0	0.0	305.0	0.0	0.0	

Avance: Programado, Físico y Financiero

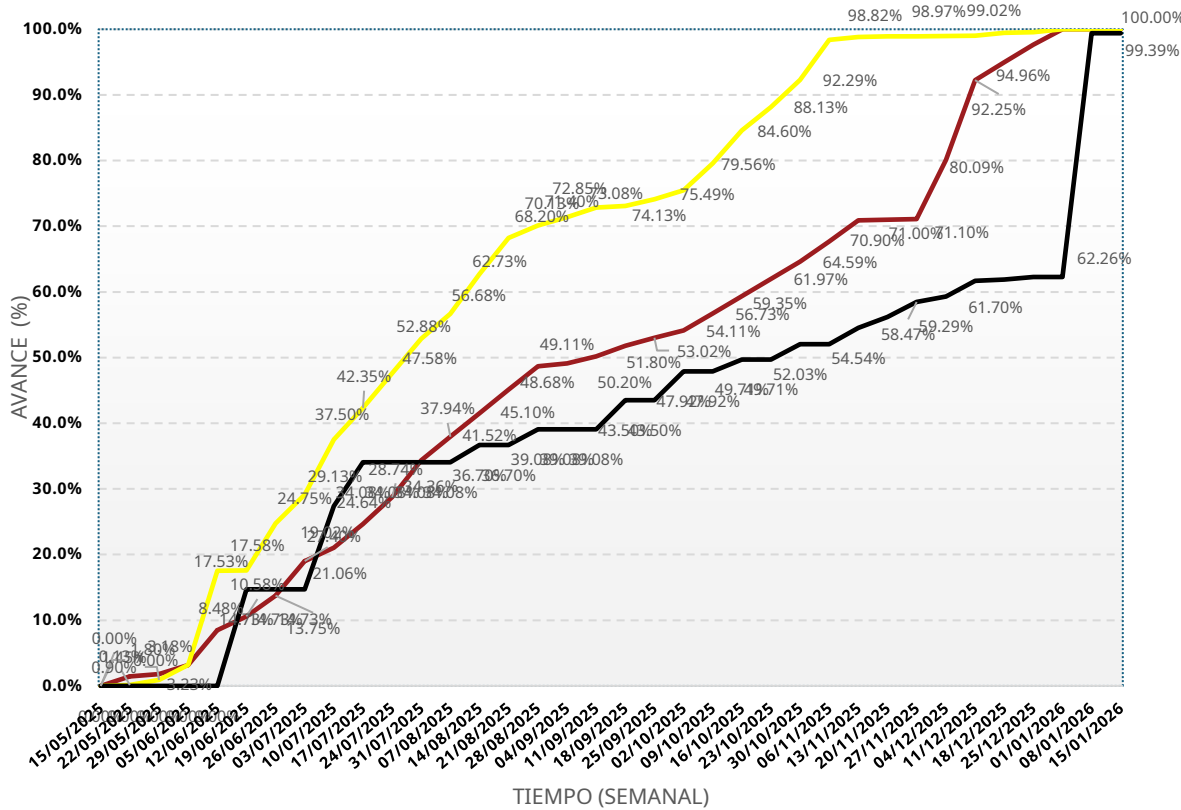

	02 de enero al 08 de enero	09 de enero al 15 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	97	97
Maquinaria	16	16
Frentes de trabajo	9	8
