

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa

La fecha de terminación contractual es agosto 2026

Avance global

- Programado: 61.4%
- Real: 72.76%
- Semanal: 0.76%
- Financiero: 60.1%

 **Inversión total 2025-2026:** 405.0 mdp
Inversión 2025: 225.0 mdp | (66% de PSV)

 **Meta total:** 1 PSV | 0.811 km longitud total

 **Inicio:** 18 de agosto de 2025
Término: marzo 2026


 **862,037** Habitantes beneficiados

 **1,140** empleos generados

 **20 min** ahorro en tiempo

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

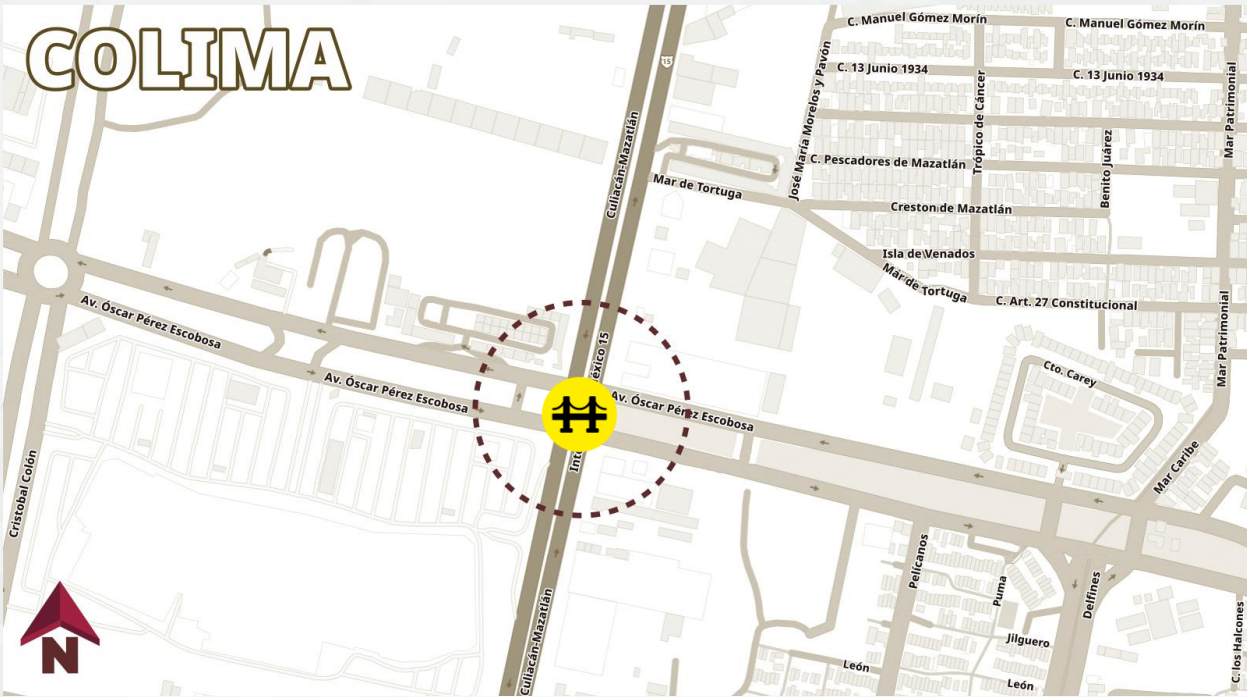


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

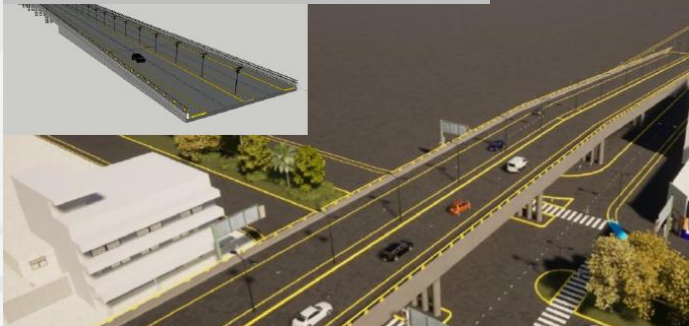


Proyecto

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 09 al 15/01/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.0	0.0	Falta proyecto de semaforización y diseño
Obras inducidas	Actividad	8	0	0.0%	8	0.0	0.0	
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Superestructura	Actividad	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Fabricación de Trabes AASHTO IV								
Superestructura	pieza	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Fabricación de Trabes Nebrazka								
Superestructura	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Montaje de Trabes Nebrazka NU240								
Muro Mecánicamente estabilizado (Fabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	12,940	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Dala de Cerramiento	m	421.2	0.0	0.0%	421.2	0.0	0.0	
Losa de concreto Hidráulico	pieza	3	3.0	100.0%	0.0	0.00	0.6	Se avanza con el armado de acero de refuerzo del claro 2-3
Junta de Calzada	Pieza	4	2	50.0%	2.0	1.00	2.0	
Pavimento de concreto Hidráulico	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Alumbrado	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Señalamiento	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Semaforización	Actividad	1	0	0.0%	1	0	0.0	
Barrera Central	m	269.0	0	0.0%	269.0	0	0.0	
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	0	0.0%	5,032.00	0	0.0	
Base Hidráulilca	m3	3,992.0	0	0.0%	3,992.00	0	0.0	
Riego de impregnación	m2	20,330.0	0	0.0%	20,330.00	0	0.0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.00	0	0.0	
Banqueta	m2	6,922.0	0	0.0%	6,922.00	0	0.0	
Relleno	m3	692.0	0	0.0%	692.00	0	0.0	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

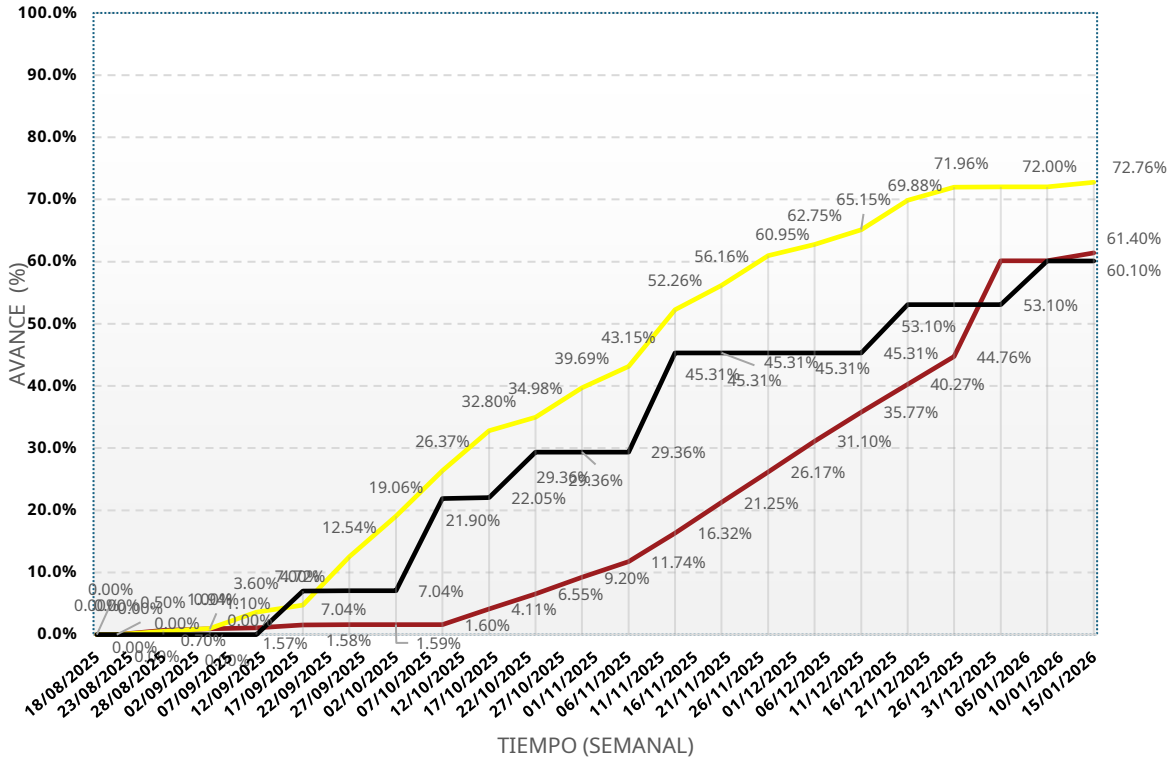

	Del 02 de Enero al 08 de Enero	Del 09 de Enero al 15 de Enero
Personal	10	89
Maquinaria	9	10
Frentes de trabajo	0	9
