

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance global

- Programado: 28.99%
- Real: 38.50%
- Semanal: 0.30%
- Financiero: 24.10%



Inversión total 2025-2026: 740 mdp
Inversión 2025: 140 mdp | 38% de 1 Distribuidor Vial



Meta total: 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)



Inicio: 16 de julio de 2025
Término: julio de 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre




73,215 habitantes beneficiados



7,306 empleos generados



20 min ahorro en tiempo

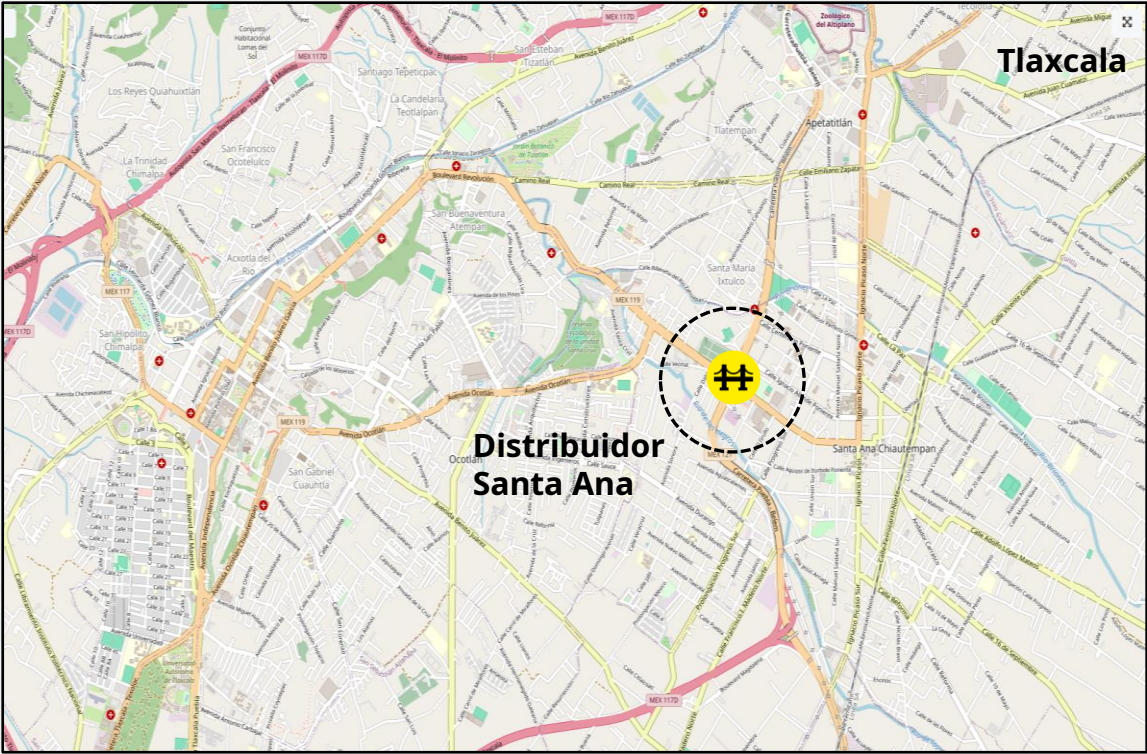

Situación actual



Proyecto


Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	09 al 15-01-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	1 Distribuidor Vial	38.50% 1 Distribuidor Vial	61.50% de 1 Distribuidor Vial	0.50%	0.30%	Se trabaja en: Construcción de cabezales eje #10, 13 y 14, columnas octagonales ejes #5, 7 y 9, columnas circulares eje #3 y 17 y pilas coladas en sitio eje #18.

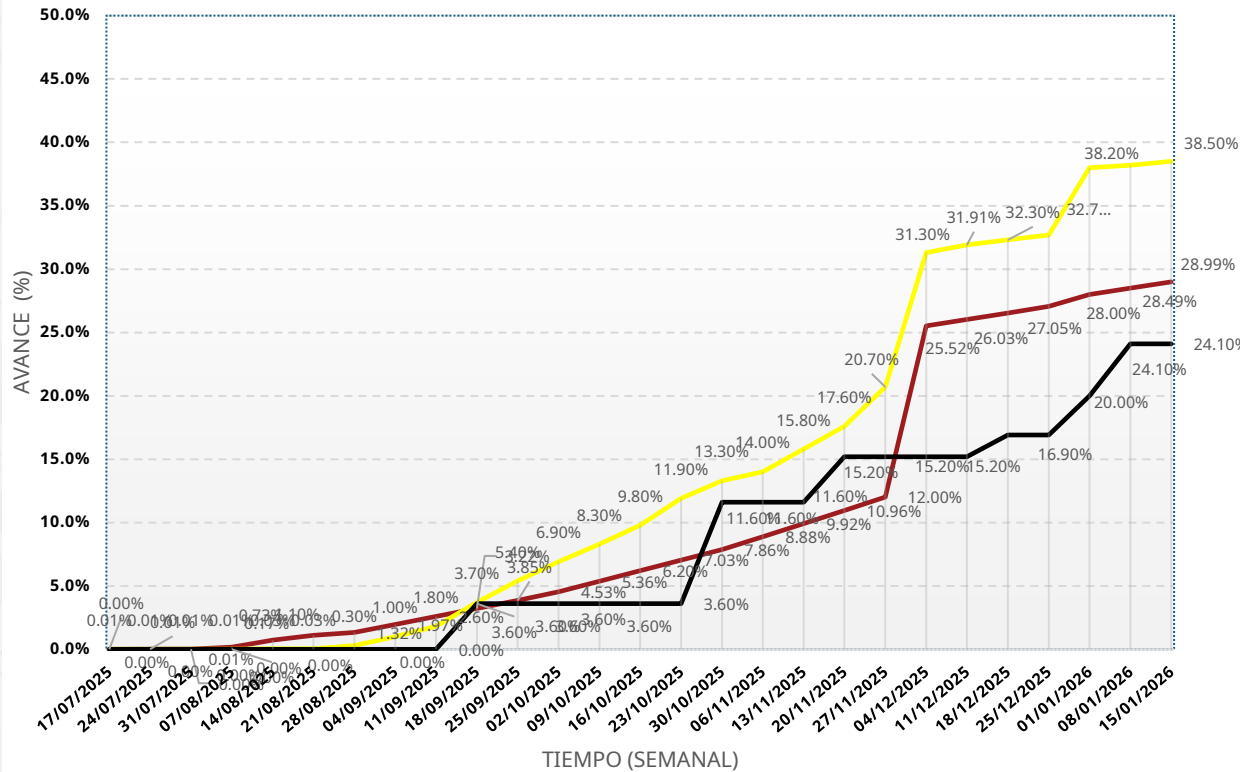

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	02 al 08 de enero	09 al 15 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	80	92
Maquinaria	11	10
Frente de trabajo	9	12
