

Puente La Presa Trancas

Colima

Avance global

• Programado: 45.50 %
• Real: 42.18 %

• Semanal: 2.03 %
• Financiero: 29.98 %



Inversión total 2025-2026: 86.0 mdp

Inversión 2025: 31.0 mdp



Meta total: 0.601 km

Meta 2025: 38.6 % del Puente

Meta 2026: 61.4 % del Puente



Fecha de inicio: 11 de agosto, 2025

Fecha de término: Abril, 2026

Termino meta 2025: 31 de diciembre



4,053 habitantes beneficiados




225 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
Construcción del Puente La Presa Trancas	• Contratista: GRUPO FIRME DE MÉXICO, S.A DE C.V, CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A DE C.V Y CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS VANGUARDIA, S.A DE C.V
	• Supervisión: ANMA INGENIERÍA, SA DE CV

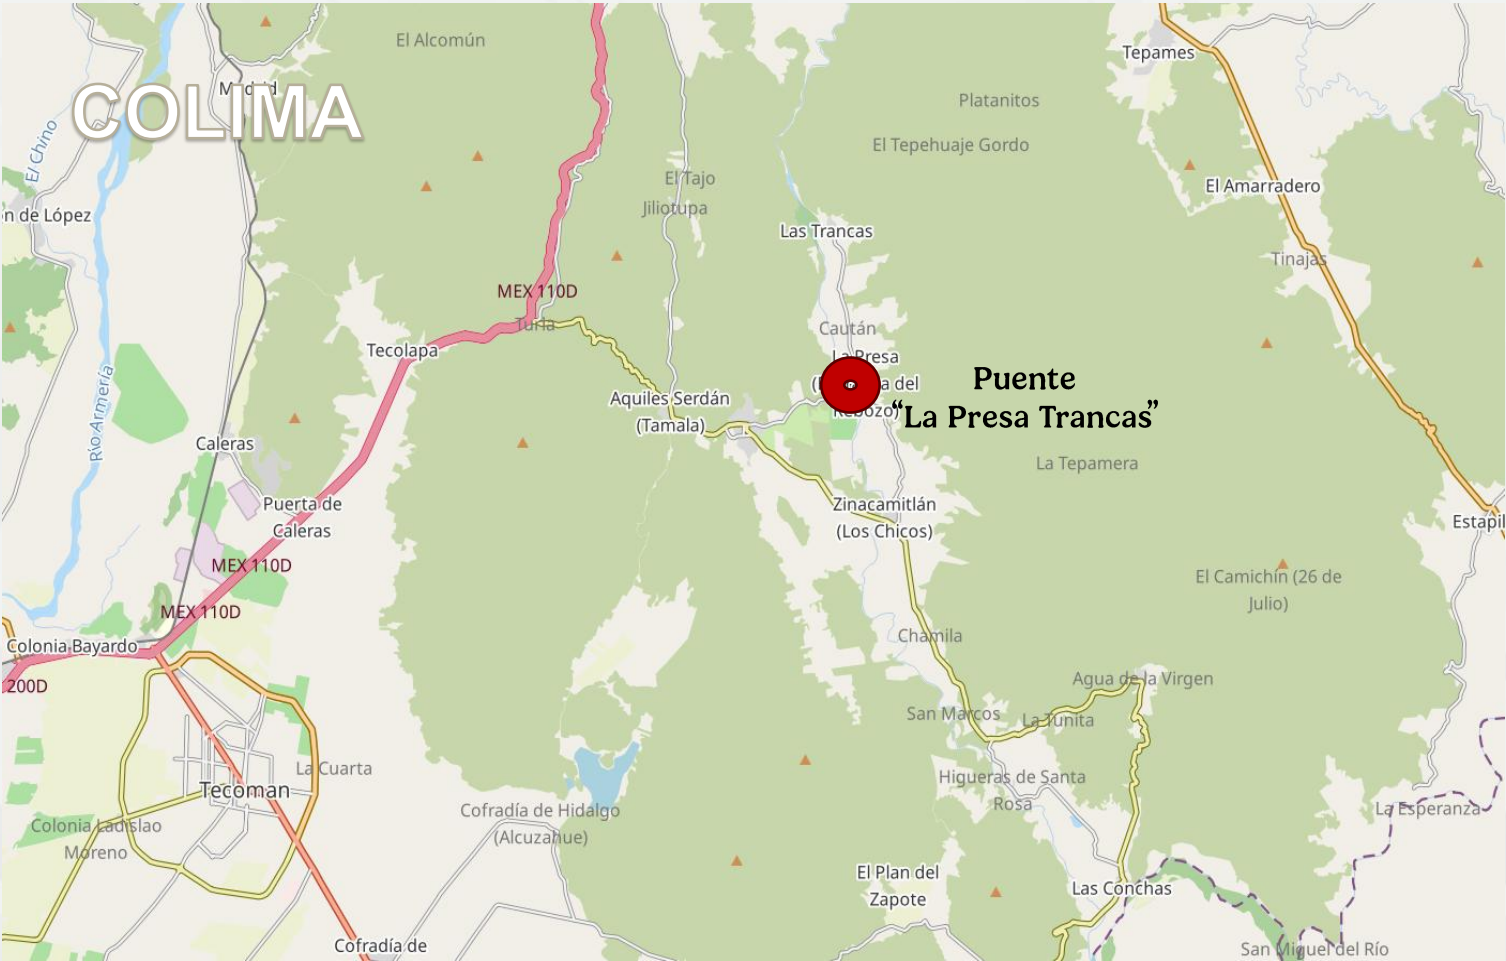


Puente La Presa Trancas

Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	09/01/26 al 15/01/26	
				Programado	Ejecutado
Preliminares					
Desmonte y Despalme (Ha)	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00
Subestructura					
Pilas de cimentación (Perforación). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Pilas de cimentación (Armado). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Pilas de cimentación (Colado). Pza.	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00
Columnas. Pza.	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Cnstruccion de cabezales y bancos. Pza.	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00
Superestructura					
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Fabricación)	18.00	14.00	4.00	2.00	1.00
Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Montaje)	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00
Colado de diafragma y losa. M3	197.1	0.00	197.1	0.00	0.00
Carpeta asfáltica. M3.	220	0.00	220	0.00	0.00
Guarniciones, Banquetas y Parapetos. M3.	43.8	0.00	43.8	0.00	0.00
Accesos, señalamiento y Obras complementarias. M.	182	0.00	182	0.00	0.00

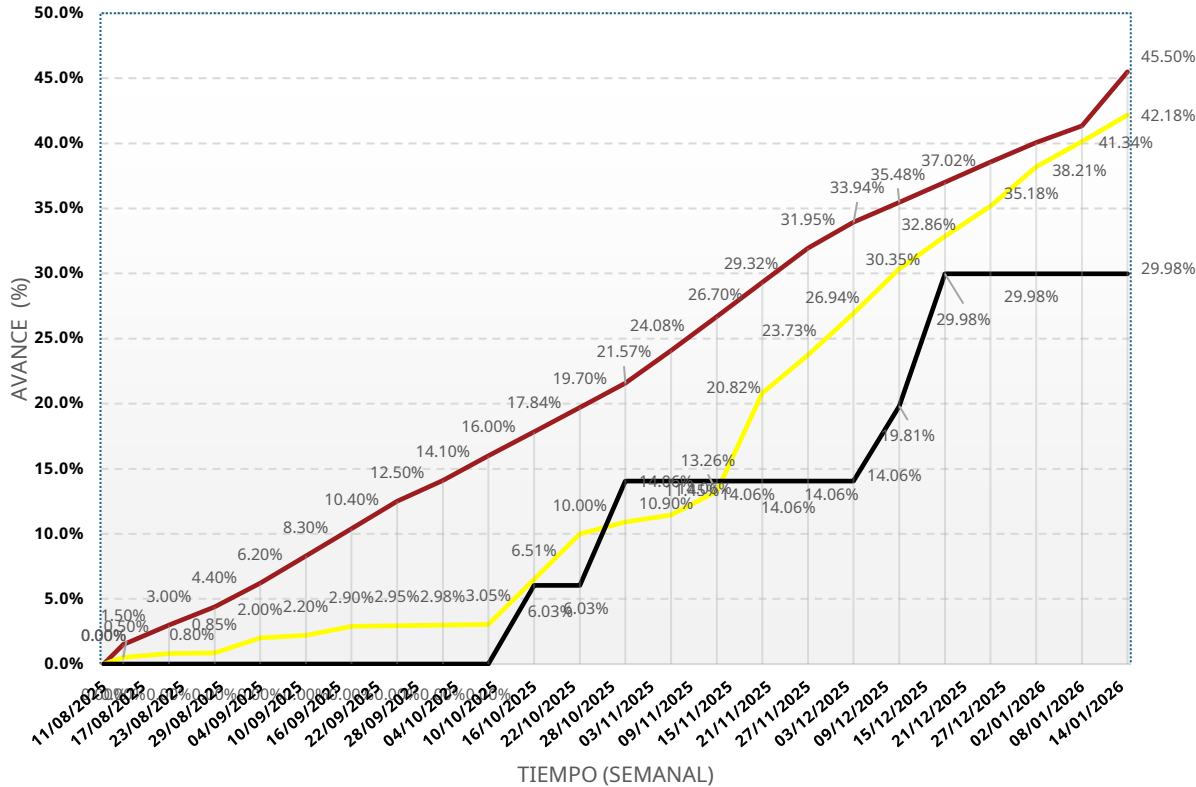

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	02 de enero al 08 de enero	09 de enero al 15 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	34	39
Maquinaria	7	7
Frentes de trabajo	3	6
