

Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes


Avance global

- Programado: 40.3%
- Real: 33.83%
- Semanal: 1.7%
- Financiero: 23.2%

Avance 2025

- Programado: 100%
- Real: 84.6%
- Semanal: 4.3%
- Financiero: 59.0%

Convenio de reprogramación SICT 6.29-303-2396-2025

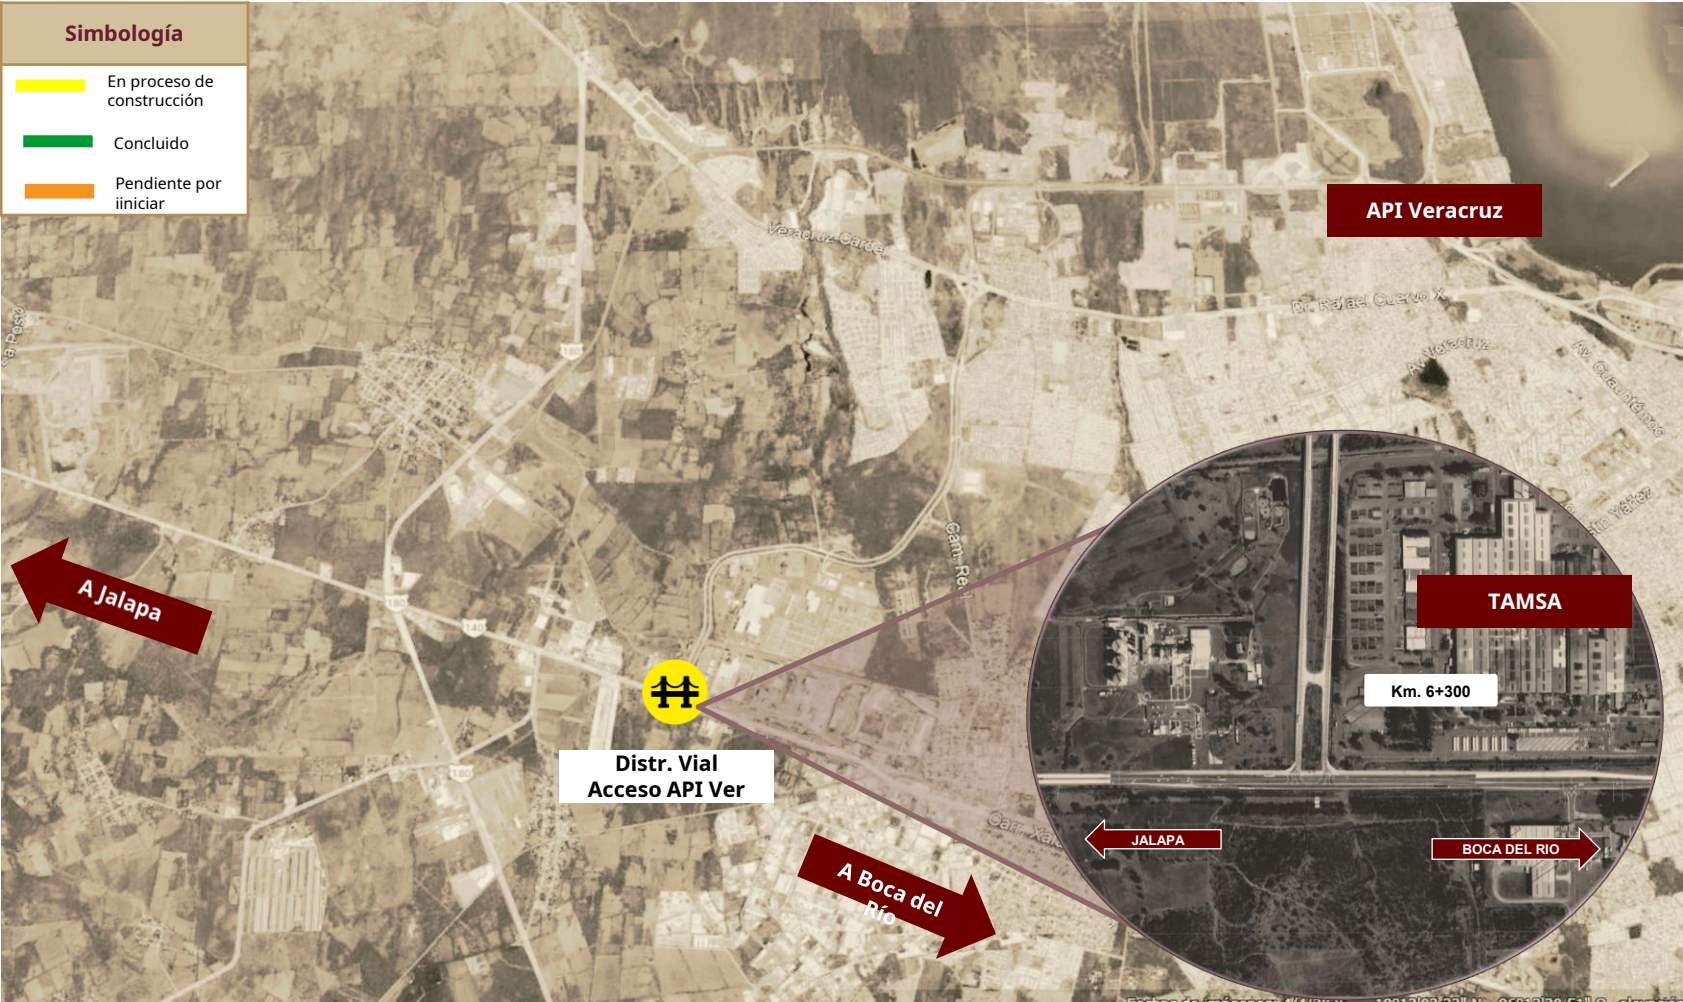

Inversión total 2025-2026: 902 mdp
Inversión 2025: 367.3 mdp | 0.78 km de PSV

Meta total 2025-2026: 1.97 km
1 PSV: 0.872 km
Accesos: 0.532 km
Transiciones: 0.566 km

Inicio: 14 de julio de 2025
Término: junio de 2026
Termino meta 2025: Diciembre

780,441 habitantes beneficiados

2,235 empleos generados

25 min ahorro en tiempo

Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.


Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Cuerpo B (programa 2025)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 26 al 01/01/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
TERRACERÍAS								
Desmonte	Ha	4.10	4.10	100%	0.00	0.00	0.0	Concluido en el cpo B
Despalme	m³	7,213.00	7,213	100.0%	0.00	622.50	0.0	Concluido en el cpo B
Obra Inducida	Lote	1	0	0	1	0.00	0.0	
Excavaciones	m³	52,059.00	36,571.0	70.2%	15,488.00	15,488.00	0.0	
Terraplenes	m³	36,650.00	27,530.0	75.1%	9,120.00	9,120.00	0.0	Se continúa con la formación de la subrasante del km 94+200 al 94+500
Muro Mecánicamente Estabilizado	m³	1,531.00	0	0.0%	1,531.00	382.75	0.0	
Terraplenes en Rampa	m³	4,384.00	0	0.0%	4,384.00	1,096.00	0.0	
Pavimentos asfálticos	m³	3,090.00	0	0.0%	3,090.00	515.00	0.0	
Paraderos	pza.	1	0	0.0%	1	0.00	0.0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	132	132	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Zapatas	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUBESTRUCTURA								
Columnas (pza)	pza.	21	21	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
Cabezales	pza.	23	23	100.0%	0	0	0.0	Concluido en el cpo B
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo AASHTO VI	pza.	132	95	72.0%	37	37	7.0	Se tienen 95 trabes concluidas y 5 trabes adicionales con armado
Montaje de trabes	pza.	132	84	63.6%	48	48	6.0	Se tienen 3 claros del cpo B con trabes montadas.
Díafragmas	pza.	110	60	54.5%	50	25	10.0	
Losa (claro)	pza.	22.00	12	54.5%	10	4	2.0	Se tienen concluidas las losas del 16 al 22 y del claro 7 al 9 y en

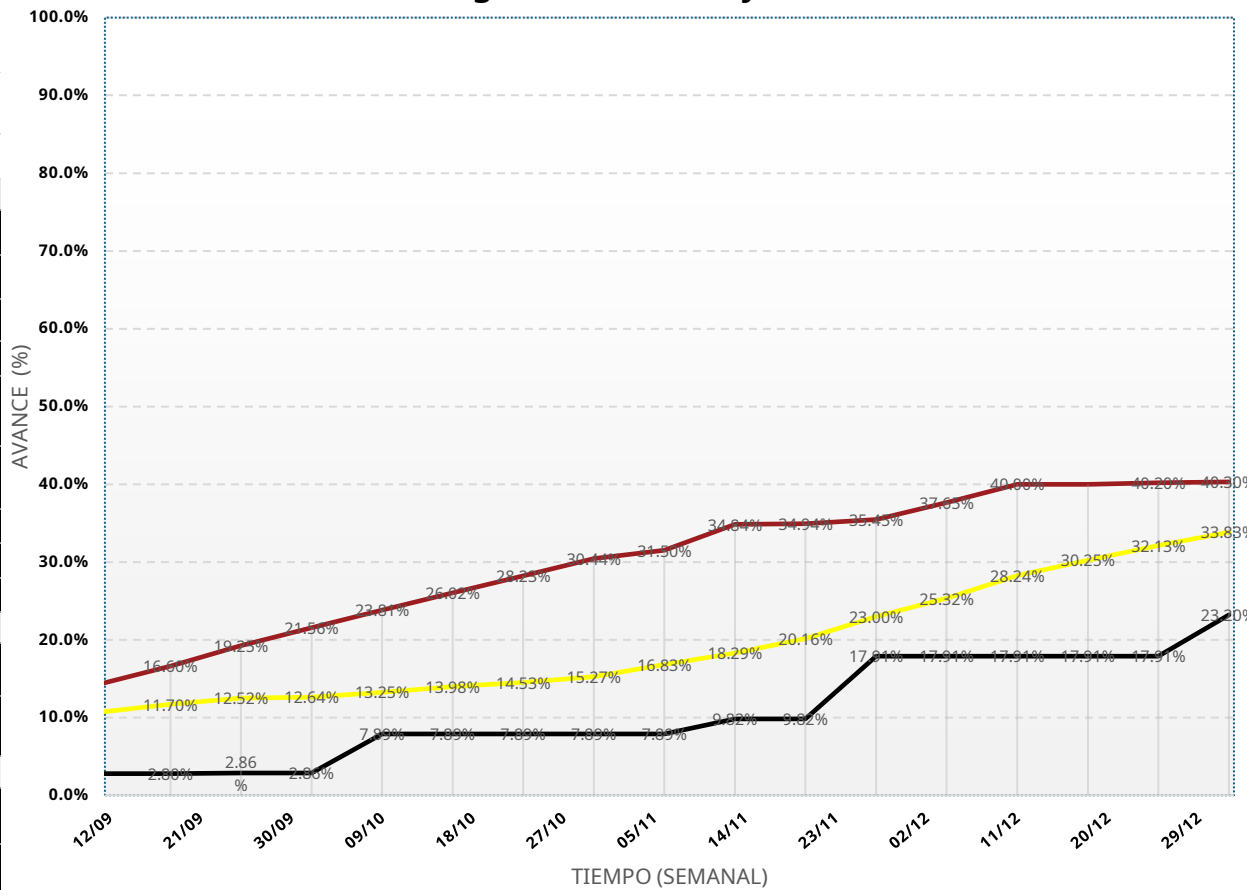

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	19 de Diciembre al 25 de Diciembre	26 de Diciembre al 01 de Enero
Fuerza de Trabajo (personas)	166	114
Maquinaria	34	34
Frentes de trabajo	7	5
