

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Avance global

• Programado: 27.59%
• Real: 32.90%

• Semanal: 0.20%
• Financiero: 16.90%

Avance 2025

• Programado: 100.00%
• Real: 100.00%

• Financiero: 70.80%

 **Inversión total 2025-2026:** 700 mdp
Inversión 2025: 140 mdp | 14% de 1 Distribuidor Vial
Inversión 2026: 560


 **Meta total:** 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)

 **Inicio:** 16 de julio de 2025
Término: julio de 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre

 **73,215** habitantes beneficiados

 **1,950** empleos generados

 **20 min** ahorro en tiempo

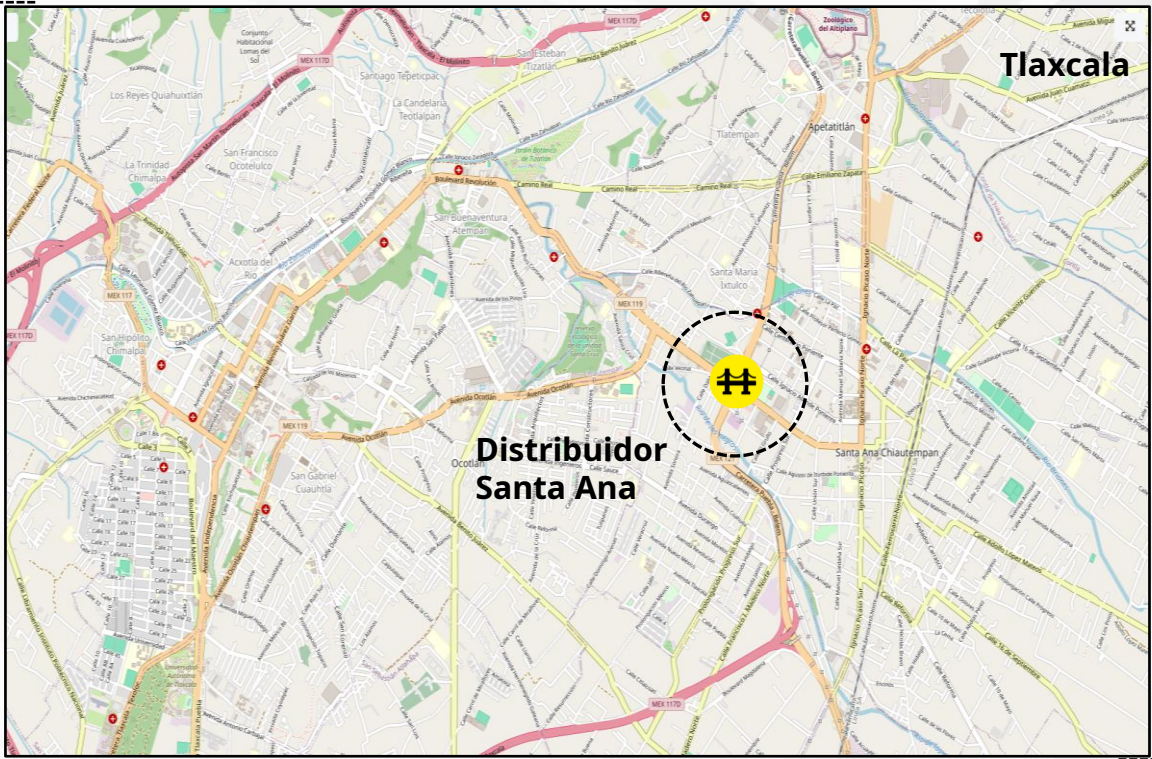


Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	26-12-25 al 01-01-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	14% de 1 Distribuidor Vial	32.90% del 67.10 % de 1 Distribuidor Vial	0.0% del 14% de 1 Distribuidor Vial	0.54%	0.20%	Sin actividades por periodo vacacional del 23 de diciembre al 04 de enero de 2026; solo actividades en la fabricación de trabes, obras marginales y mantenimiento al señalamiento de protección de obra.

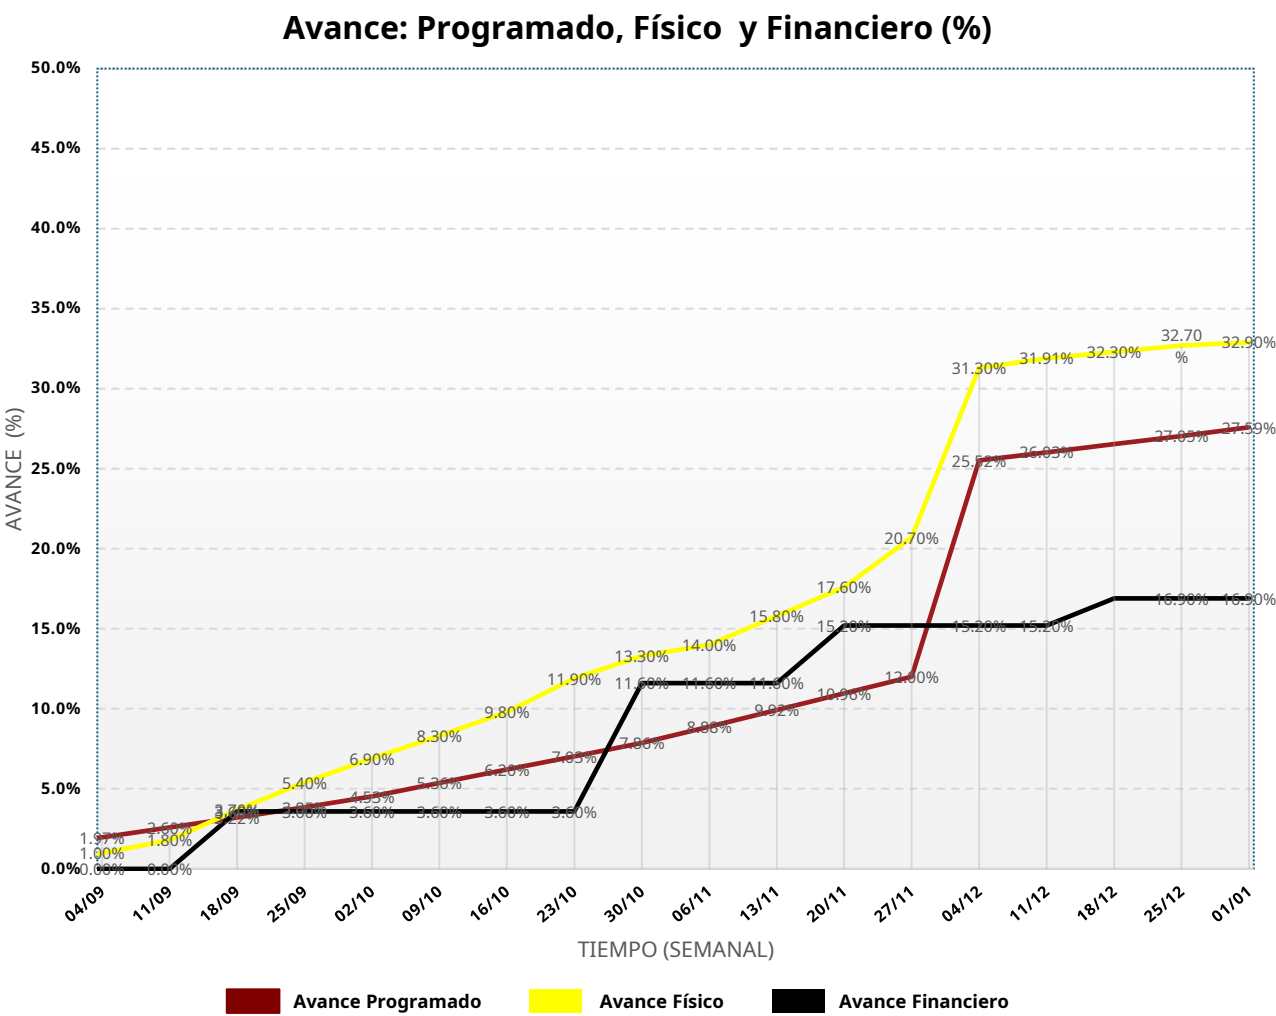

	19 al 25 de diciembre	26-12-25 al 01 de enero de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	127	127
Maquinaria	18	11
Frente de trabajo	13	2
