

Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo

- 

Inversión total: 484 MDP
- 

Meta total: 1.92 km longitud total.
 - 0.77 km puente
- 

Inicio: 27 Abril de 2026
Término: 21 Octubre 2026
- 

Más de 1,320,00 de habitantes beneficiados
- 

2,890 empleos generados
- 

5 minutos ahorro en tiempo


Beneficios:

- Operación más segura para los usuarios, al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes.
- Optimiza la capacidad y eficiencia del flujo vehicular en el acceso y salida del Puente Vehicular Nichupté.
- Fortalecer la seguridad de los residentes y turistas de la zona turística ante situaciones de contingencias ambientales
- Población beneficiada: 20 millones de turistas al año
- Es un distribuidor vial que cuenta con un paso superior con dos cuerpos separados para alojar dos carriles de circulación en un sentido y el otro un solo carril, además de calles laterales para servicios locales.

Tramo	Empresas
Construcción distribuidor vial Kukulcán.	• Contratista: Grupo Formado por las empresas: Consorcio de Ingenieros Constructores y consultores, S.A. de C.V y ASCH, S.A. de C.V. • Supervisión: Grupo formado por las empresas: Triada Geotecnia, S.A.P.I. de C.V. Triada Consultores, S.A.P.I. de C.V. Triada Diseño y Gerencia Construcción S.A.P.I. de C.V. .

Avance físico

- Programado: 57.78%
- Real: 28.86%
- Semanal: 1.71%
- Financiero: 0.0%
- Desviación: 28.92% no imputable a la contratista debido a interferencias con obras inducidas y modificaciones de proyecto ejecutivo.

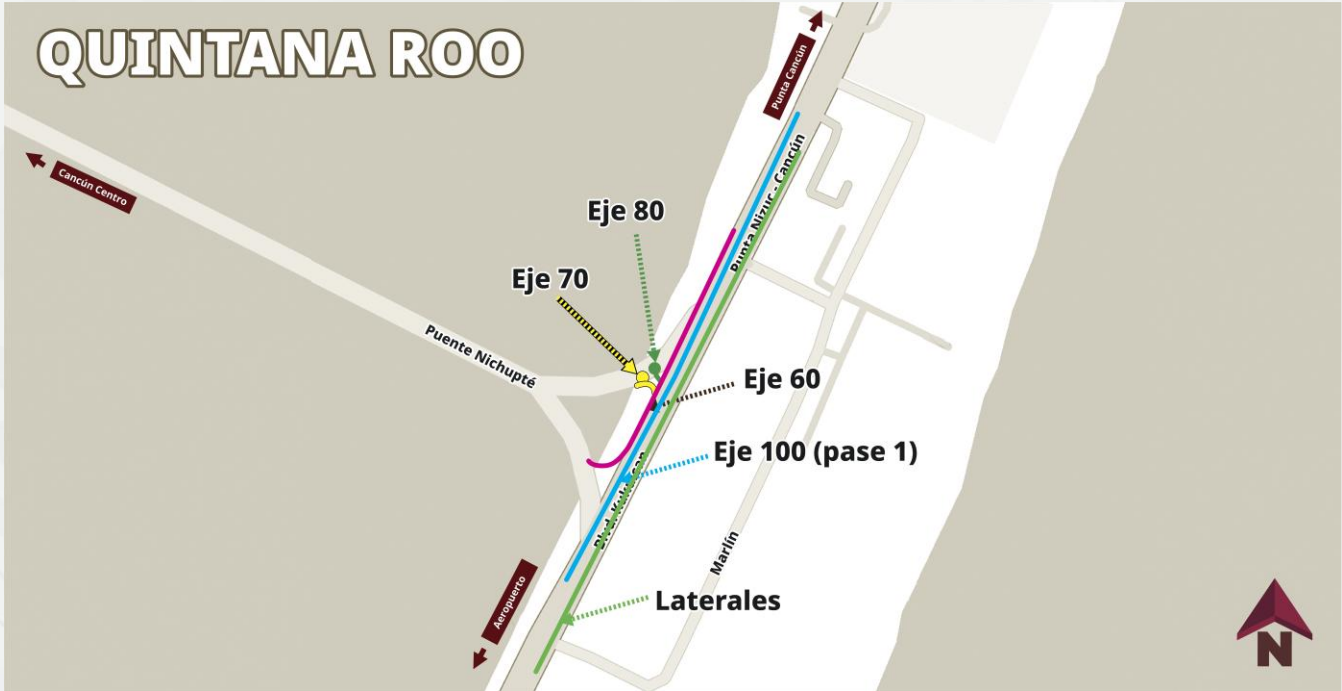

SITUACIÓN ACTUAL



IMAGEN OBJETIVO

Distribuidor Vial Kukulcán


Quintana Roo



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado		Faltante	Ejecutado del 3 de junio al 09 de julio de 2026
Pilas de cimentación (pza)	103	82	80%	21	5
Zapatas (pza)	18	1	6%	17	0
Columnas (pza)	30	0	0%	30	0
Cabezales (pza)	19	0	0%	19	0
Fabricación de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Montaje de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Losas (pza)	17	0	0%	17	0
M.M.E. (m³)	6,176	0	0%	6,176	0

•Nota: se tienen 216.5 mdp de obra ejecutada no pagada por trámites ante FONADIN

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

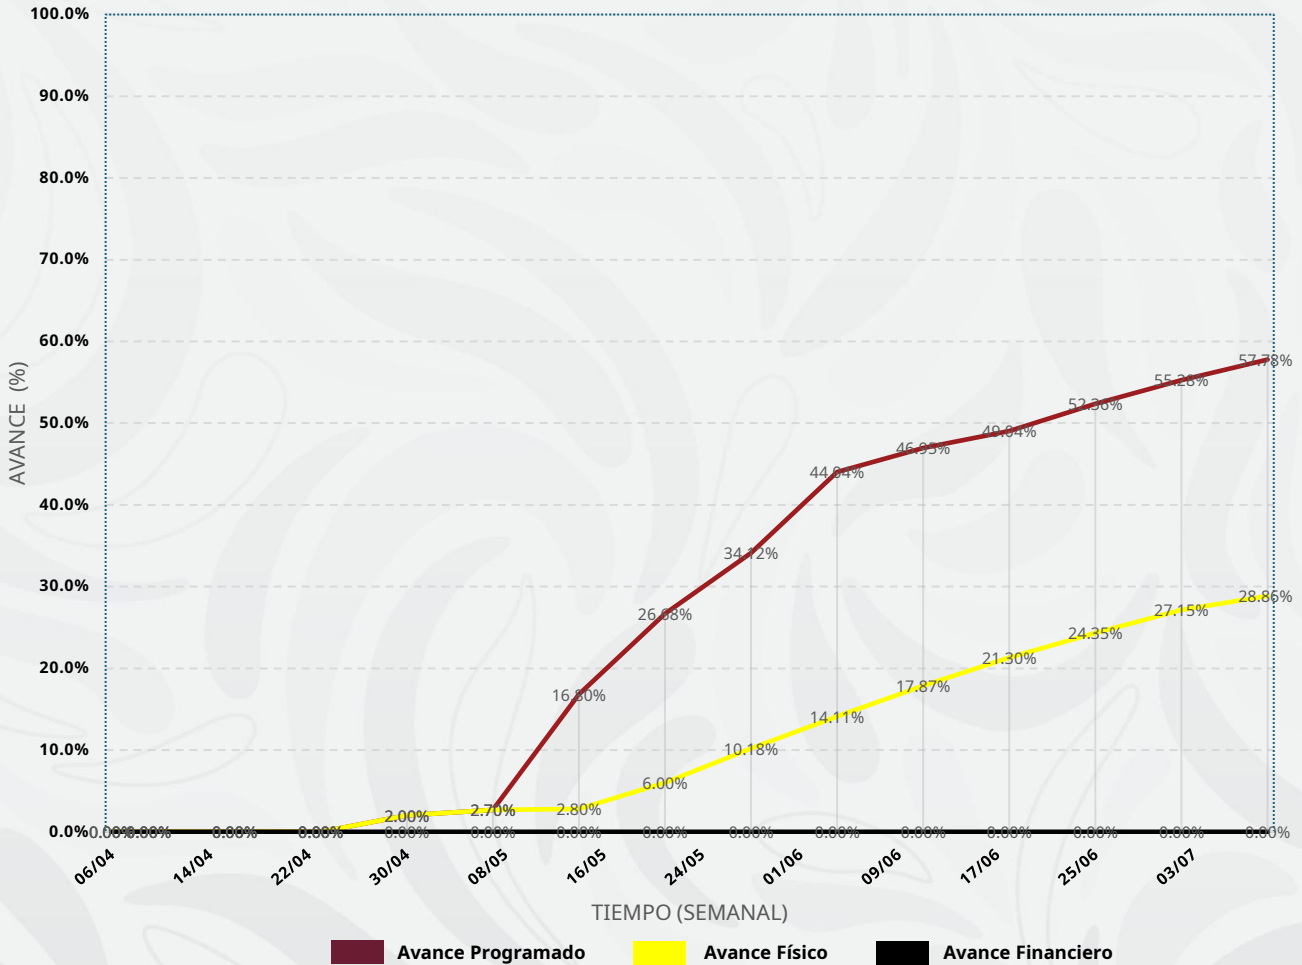

	26 de junio al 2 de julio 2026	03 al 09 de julio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	90	99
Maquinaria	33	33
Frentes de trabajo	6	6
