

# Puente “Las Tunas”

## Colima



Avance global

- Programado: 59.91%
- Real: 60.90%
- Semanal: 4.00%
- Financiero: 31.33%



**Inversión total:** 101.78 MDP



**Meta total:** 503.0 m longitud total (0.153 km estructuras y 0.350 km accesos)



**Inicio:** 25 de febrero de 2026  
**Término:** 15 de agosto (31 de agosto de 2026 obras complementarias)



**157,048** habitantes beneficiados



**235** empleos generados




**15 min** ahorro en tiempo

**Beneficios:**

- Comunicación ininterrumpida en época de lluvias para las comunidades.
- Acceso continuo a los servicios básicos como salud.
- Se garantiza paso constante ante cualquier emergencia.

| Tramo                            | Empresas                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción<br>Puente Las Tunas | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> MARECOMSA, S.A. de C.V</li><li>• <b>Supervisión:</b> VIAS TERRESTRES Y EDIFICACIONES VITED35 A.A DE C.V.</li></ul> |

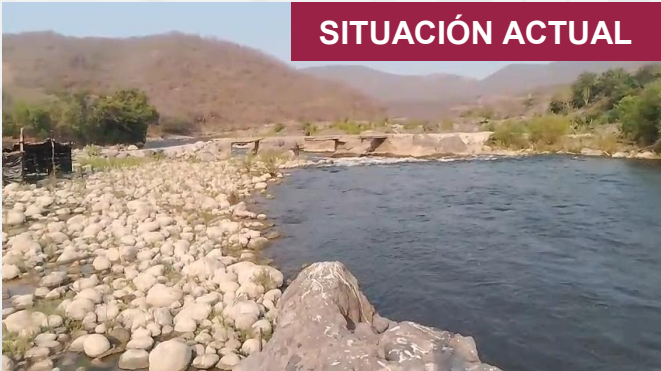

SITUACIÓN ACTUAL




IMAGEN OBJETIVO

# Puente “Las Tunas”

## Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

| Elemento                                   | Intervención | Ejecutado acumulado | Faltante  | 03/07/26 al 09/07/26 |           | Observaciones       |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------------|-----------|---------------------|
|                                            |              |                     |           | Programado           | Ejecutado |                     |
| Resumen de Obra                            |              |                     |           |                      |           |                     |
| Limpieza, Trazo y Nivelación (m3)          | 36,000.00    | 24,314.06           | 11,685.94 | 284.56               | 0.00      |                     |
| Pilas de cimentación (Perforación) (Pza)   | 18.00        | 18.00               | 0.00      | 0.00                 | 0.00      | Trabajos Concluidos |
| Pilas de cimentación (Armado) (Pza)        | 18.00        | 18.00               | 0.00      | 0.00                 | 0.00      | Trabajos Concluidos |
| Pilas de cimentación (Colado)(Pza)         | 18.00        | 18.00               | 0.00      | 0.00                 | 0.00      | Trabajos Concluidos |
| Vigas de Atado (Pza)                       | 4.00         | 4.00                | 0.00      | 0.00                 | 0.00      | Trabajos Concluidos |
| Columnas (Pza)                             | 12.00        | 12.00               | 0.00      | 0.00                 | 0.00      | Trabajos Concluidos |
| Construcción de cabezales y bancos (Pza)   | 6.00         | 6.00                | 0.00      | 0.00                 | 0.00      | Trabajos Concluidos |
| Aleros y Muro de Contención (Pza)          | 4.00         | 0.00                | 4.00      | 0.50                 | 0.00      |                     |
| Fabricación de trabes AASHTO Tipo IV (Pza) | 25.00        | 25.00               | 0.00      | 0.00                 | 0.00      | Trabajos Concluidos |
| Suministro de trabes AASHTO Tipo IV (Pza)  | 25.00        | 15.00               | 10.00     | 0.00                 | 0.00      |                     |
| Montaje de trabes AASHTO Tipo IV (Pza)     | 25.00        | 15.00               | 10.00     | 3.50                 | 0.00      |                     |
| Prelosas (pza)                             | 600.0        | 290.00              | 310.00    | 31.00                | 0.00      |                     |
| Colado de diafragma y losa (m3)            | 376.81       | 86.35               | 290.46    | 87.92                | 86.35     |                     |
| Carpeta Asfáltica (m3)                     | 55.16        | 0.00                | 55.16     | 30.44                | 0.00      |                     |
| Guarniciones y banquetas (m3)              | 86.84        | 0.00                | 86.84     | 0.00                 | 0.00      |                     |
| Accesos (ml)                               | 80.00        | 0.00                | 80.00     | 0.00                 | 0.00      |                     |
| Señalamiento (ml)                          | 650.00       | 0.00                | 650.00    | 0.00                 | 0.00      |                     |

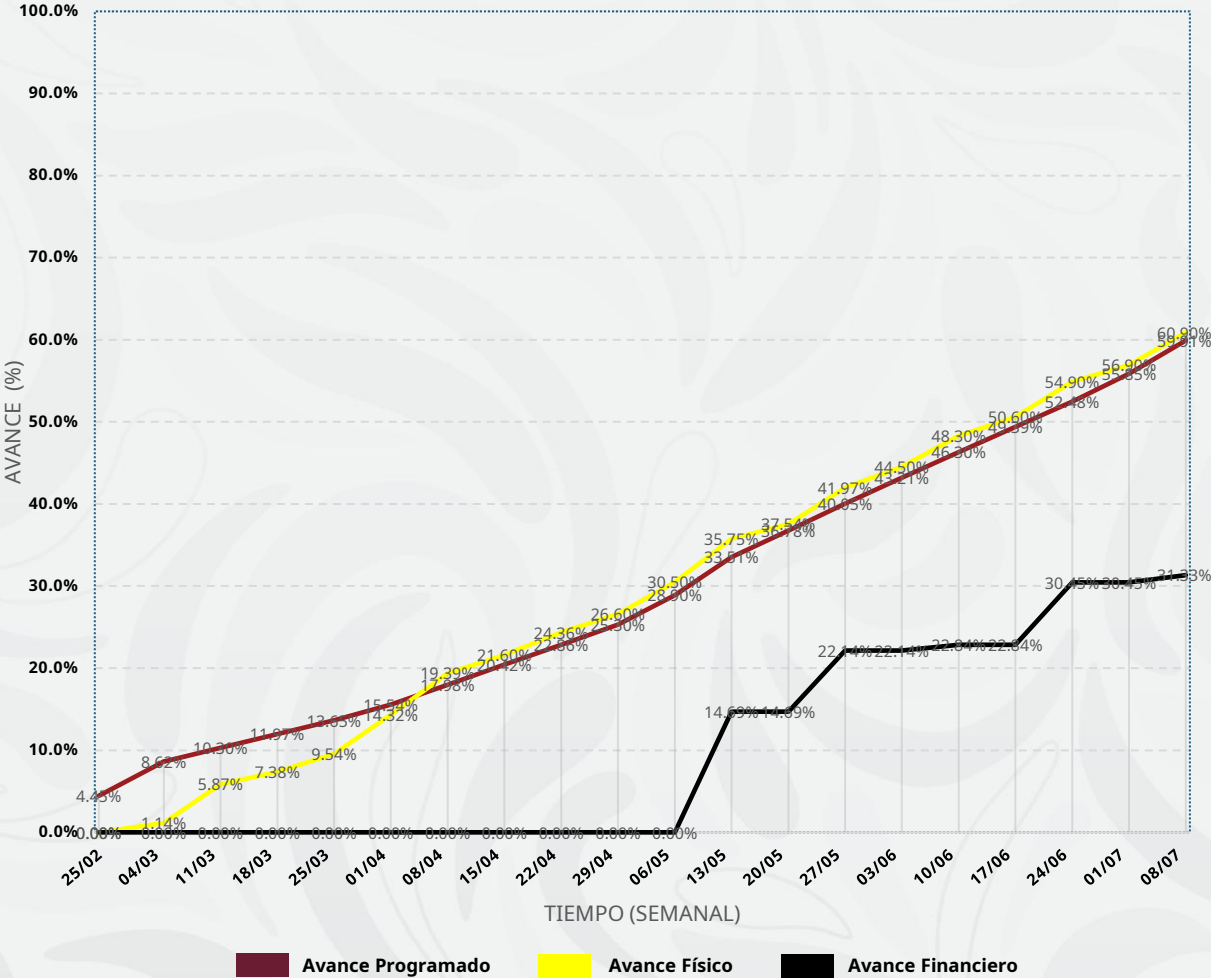

|                              | 26 de junio al 02 de julio | 03 al 09 de julio |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 32                         | 32                |
| Maquinaria                   | 12                         | 12                |
| Frentes de trabajo           | 3                          | 3                 |
