

Puente UAEM Morelos



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 20.52%
- Real: 8.05%
- Semanal: 0.55%
- Financiero: 5.60%



Inversión total: 400.0 MDP



Meta total: 1.0 km.

- 0.3 km puente y viaducto
- 0.7 km accesos (4 gasas principales)



Inicio:

Original

Marzo 2026

Modificado

Mayo 2026

Término:

Noviembre 2026

Diciembre 2026



450,000 habitantes beneficiados



1,200 empleos generados



45 min ahorro en tiempo


Beneficios:

- Acceso continuo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
- Se garantiza paso constante ante cualquier emergencia.

Acceso vehicular a la UAEM con estructura principal de 2 carriles de circulación y ramal de acceso principal de 4 carriles de circulación.

Tramo	Empresas
Construcción Puente UAEM	• Contratista: Grupo Constructor TRANSPORTIEREN, S.A. de C.V., en participación conjunta con JAVA Soluciones Energéticas y Construcción, S.A. de C.V. • Supervisión: ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.

No se iniciaron trabajos el 17 de marzo, debido a falta de liberación de Derecho de Vía UAEM, Ejidos Ocatepec y Chamilpa, que representan 71 días de atraso, en proceso reprogramación.

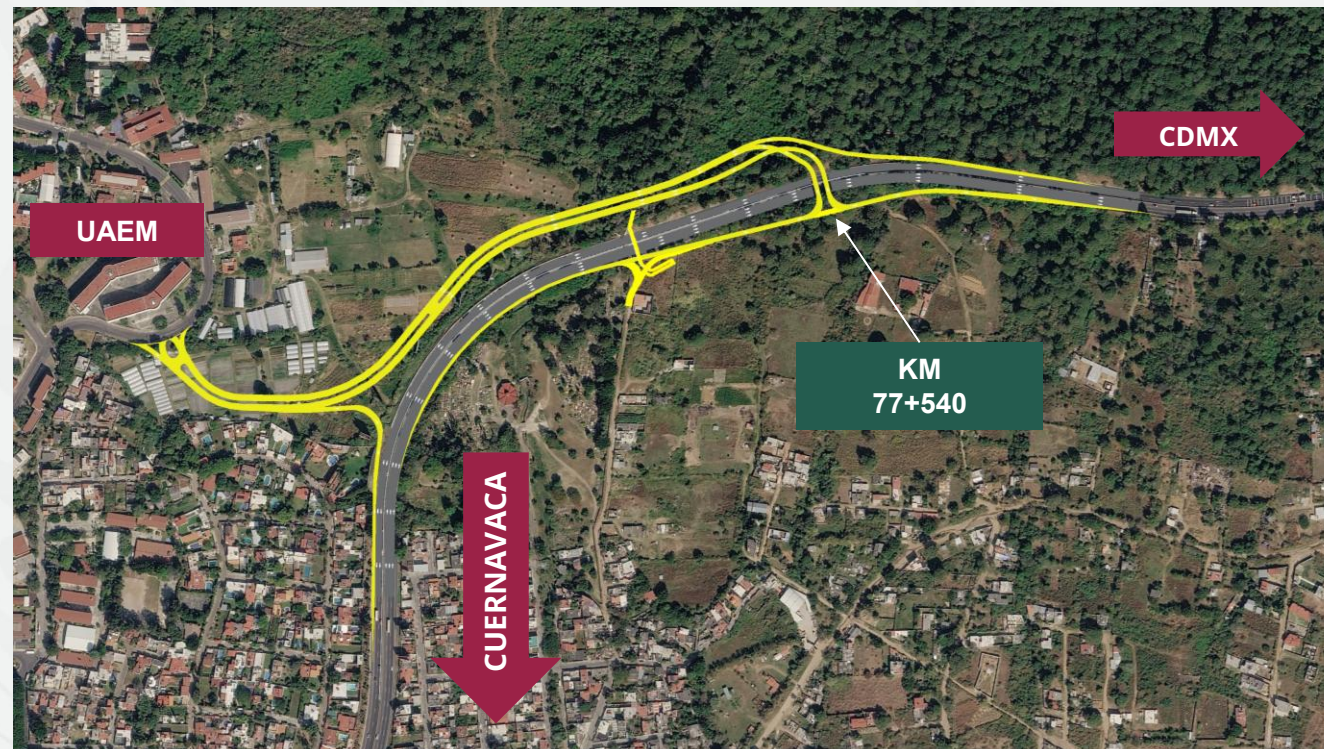


Puente UAEM
Morelos



Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	03/07/26 al 09/07/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terracerías y Pavimentos						
Terracerías (m3)	111,176.4	11,251.0	99,925.4	496.0	0.0	En ejecución solo desmonte
Base hidráulica (m3)	5,024.8	-	5,024.8	-	-	Sin iniciar
Base asfáltica (m3)	2,261.2	-	2,261.2	-	-	Sin iniciar
Carpeta asfáltica (m3)	1,739.1	-	1,739.1	-	-	Sin iniciar
Estructura Paso Inferior Vehicular						
MME (M3)	568.1	-	568.1	-	-	Sin iniciar
Zapatas (pzas)	12.0	-	12.0	-	-	Sin iniciar
Pilas (pzas)	36.0	-	36.0	-	-	Sin iniciar
Trabes (pzas)	74.0	4	70.0	3	3	En ejecución
Montaje trabes (pzas)	74.0	-	74.0	-	-	Sin iniciar
Terraplenes de Acceso (m2)	7159.1	-	7,159.1	-	-	Sin iniciar
Losas (pzas)	10.0	-	10.0	-	-	Sin iniciar
Parapeto (m)	767.0	-	767.0	-	-	Sin iniciar
Guarnición (m3)	110.5	-	110.5	-	-	Sin iniciar
Banquetas (m3)	2,848.3	-	2,848.3	-	-	Sin iniciar
Estructura Paso Peatonal						
Zapatas (pzas)	6.0	-	6.0	-	-	Sin iniciar
Pilas (pzas)	3.0	-	3.0	-	-	Sin iniciar
Trabes (pzas)	1.0	-	1.0	-	-	Sin iniciar
Losas (pzas)	6.0	-	6.0	-	-	Sin iniciar
Muros de contención						
Excavación (m3)	1261.2	-	1,261.2	-	-	Sin iniciar
Relleno (m3)	949.2	-	949.2	-	-	Sin iniciar
Acero (ton)	68.1	-	68.1	-	-	Sin iniciar
Concreto (m3)	726.9	-	726.9	-	-	Sin iniciar
Obras de drenaje						
Tubo de concreto (pza)	3.0	-	3.0	-	-	Sin iniciar
Losa de concreto (pza)	5.0	-	5.0	-	-	Sin iniciar
Boveda (pza)	4.0	-	4.0	-	-	Sin iniciar
Señalamiento						
Horizontal (m)	12,515.0	-	12,515.0	-	-	Sin iniciar
Vertical (pza)	183.0	-	183.0	-	-	Sin iniciar
Obra complementaria						
Defensa metálica (ml)	963.0	-	963.0	-	-	Sin iniciar
Cunetas (ml)	509.6	-	509.6	-	-	Sin iniciar

Avance: Programado, Físico y Financiero

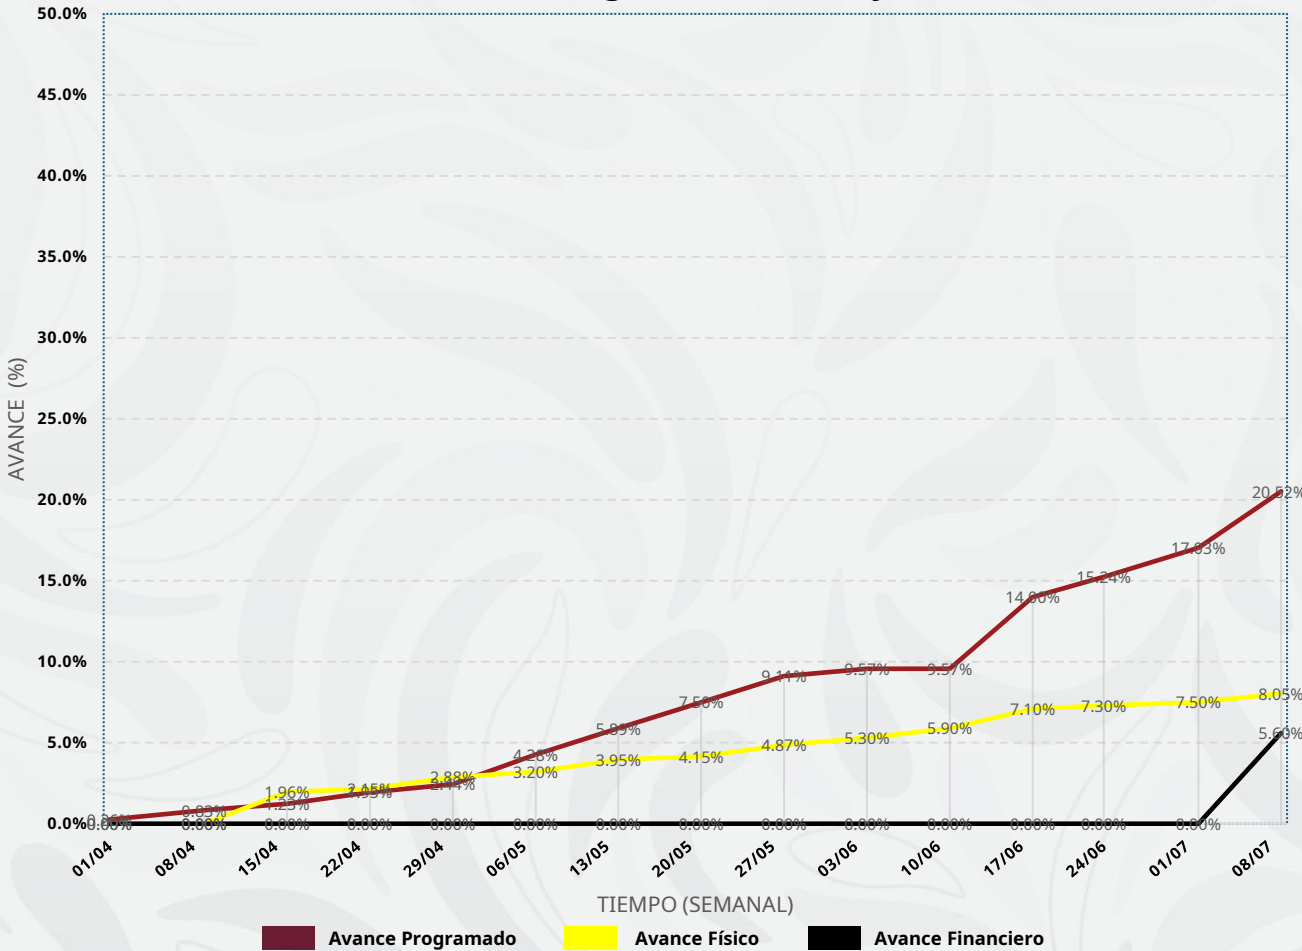

	26 de junio al 02 de julio	03 de julio al 09 de julio
Fuerza de Trabajo (personas)	42	42
Maquinaria	16	20
Frentes de trabajo	4	6
