

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)



Avance global

- Programado: 50.69%
- Real: 66.08%
- Semanal: 0.96%
- Financiero: 45.43%

Avance 2025

- Programado: 100%
- Real: 100%
- Semanal: 0.0%
- Financiero: 99.39%

Inversión total 2025-2026: 700 mdp
Inversión 2025: 319.94 mdp | 1.28 km del Deprimido

Meta total: 1 Deprimido | **1.5 km**
Gasas | 4.1 km

Inicio: 12 de mayo de 2025
Término: abril de 2026
Término meta 2025: Diciembre

351,000 habitantes beneficiados

2,100 empleos generados

25 min ahorro en tiempo




Tramo	Empresas
km 30+300	• Contratista: Convenio de participación conjunta de: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V. • Supervisión: INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	02/01/26 al 08/01/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Retiro de vegetación (pzas)	480.0	480.0	-	-	-	Concluido
Reubicación de Monumento FONATUR (pza)	1.0	1.0	-	-	-	Concluido
Terracerías						
Terracerías (m3)	14,112.0	6,540.4	7,571.6	940.8	0.0	
Excavación núcleo (m3)	100,069.2	68,564.0	31,505.2	7,697.6	0.0	
Relleno fluido (m3)	1,680.0	0.0	1,680.0	0.0	0.0	
Base hidráulica (m3)	11,840.0	5,643.3	6,196.7	0.0	0.0	
Estructura Paso Inferior Vehicular						
Zapatas (pzas)	14.0	10.0	4.0	0.0	0.0	Reducción de meta por cambio de proyecto.
Muros de 2 a 7 m (pzas)	14.0	10.0	4.0	0.0	0.0	Reducción de meta por cambio de proyecto.
Pilas tangentes (pzas)	1,311.0	1,311.0	0.0	-	-	Concluido
Trabes de liga (m)	1,123.6	498.0	625.6	0.0	20.0	
Fabricación de cabezal (pzas)	8.0	8.0	0.0	-	-	Concluido
Fabricación trabes AASHTO tipo III (pzas)	52.0	52.0	0.0	-	-	Concluido
Montaje trabes AASHTO tipo III (pzas)	52.0	26.0	26.0	0.0	0.0	
Losas de acceso (m2)	609.8	425.0	184.8	0.0	200.0	
Losas puentes (m2)	1,642.8	16.0	1,626.8	0.0	16.0	
Guarnición (m3)	375.0	49.1	325.9	0.0	3.0	
Banquetas (m3)	3,304.2	108.0	3,196.2	0.0	66.0	
Pavimento rígido (m3)	5,227.0	0.0	5,227.0	0.0	0.0	
Pavimento flexible (m3)	34,720.0	142.10	34,577.9	0.0	0.0	
Parapeto (m)	1,795.2	0.0	1,795.2	0.0	0.0	
Semaforización						
Semaforización (%)	100	0.0	100	0.0	0.0	
Obra inducida						
Reubicación de línea de media tensión de CFE (m)	1,723.0	1,723.0	-	-	-	Concluido

Avance: Programado, Físico y Financiero

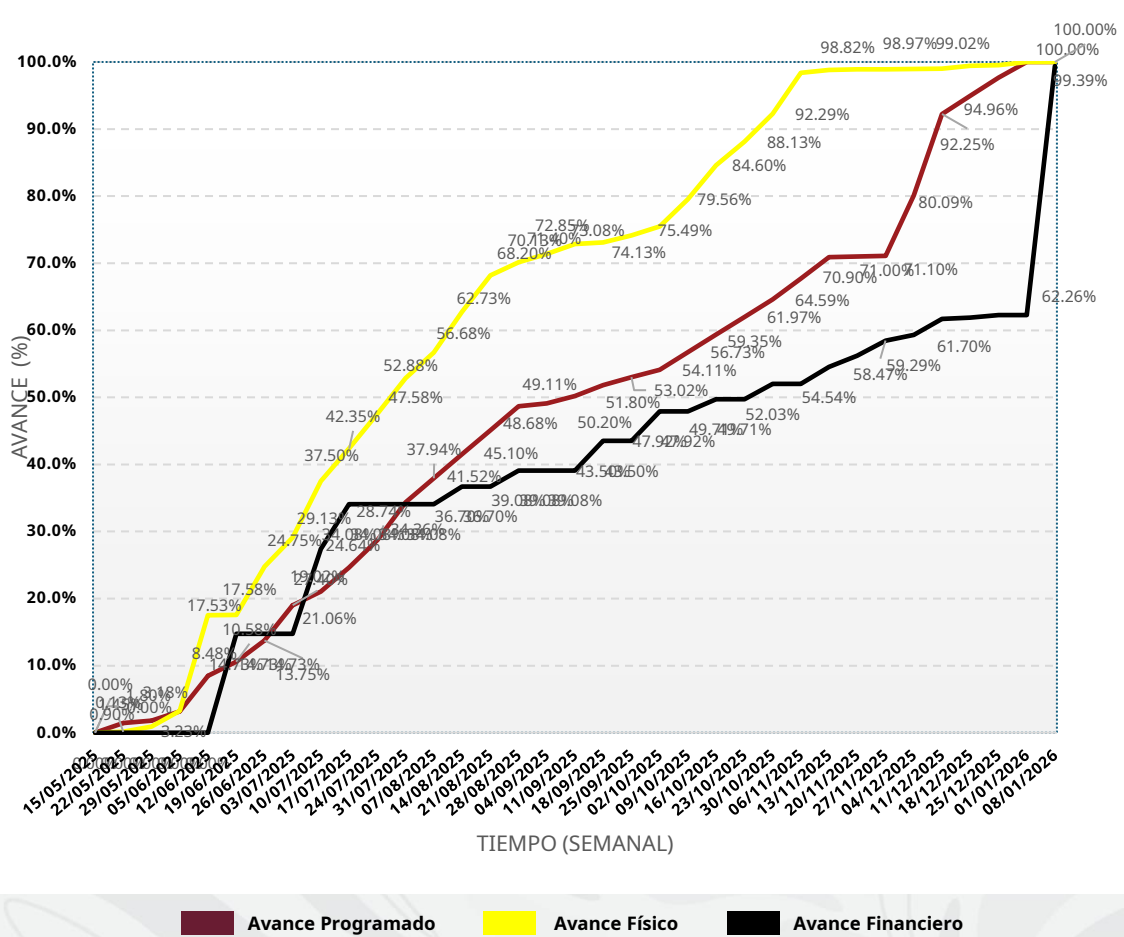

	26 de diciembre al 01 de enero	02 de enero al 08 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	52	97
Maquinaria	16	16
Frentes de trabajo	5	9
