

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa

Avance global

- Programado: 60.13%
- Real: 72.0%
- Semanal: 0.0%
- Financiero: 60.1%

Avance 2025

- Programado 100%
- Real: 100%
- Semanal: 0.0%
- Financiero: 99.9%



Inversión total 2025-2026: 452.0 mdp
Inversión 2025: 225.0 mdp | (66% de PSV)



Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total



Inicio: 18 de agosto de 2025
Término: junio 2026
Término meta 2025: Diciembre



862,037 Habitantes beneficiados



1,140 empleos generados




20 min ahorro en tiempo

Cambio de fecha de conclusión, por retraso por obras inducidas

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

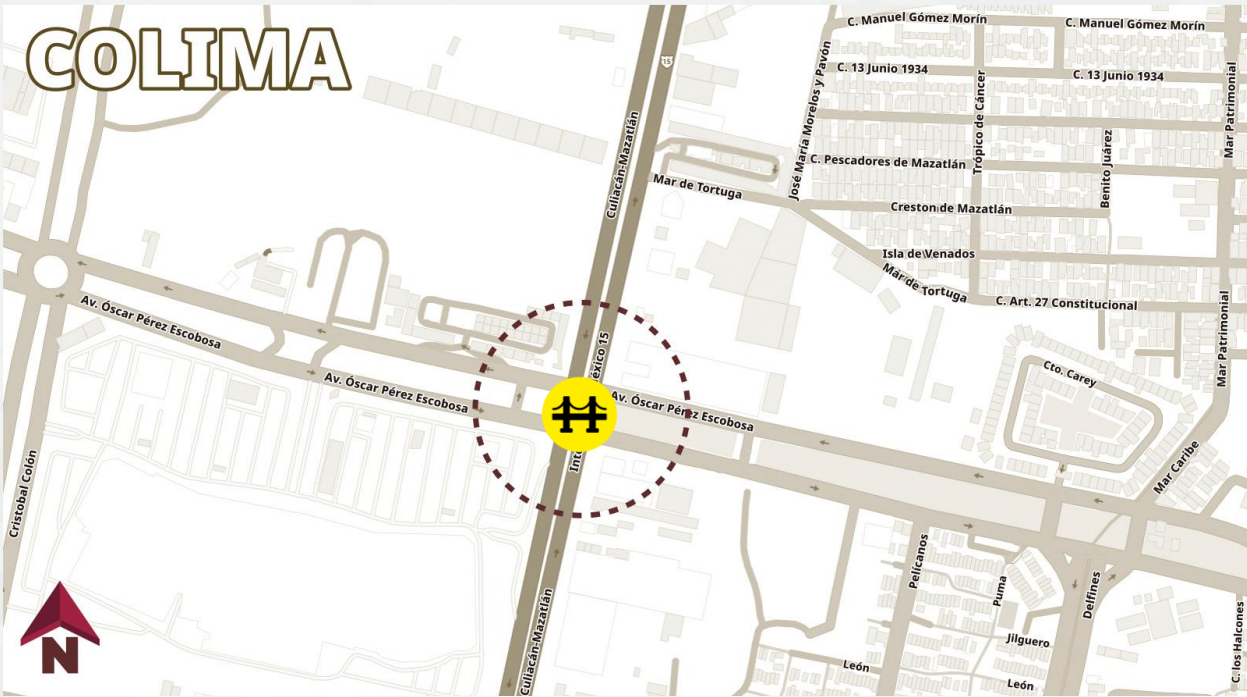


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

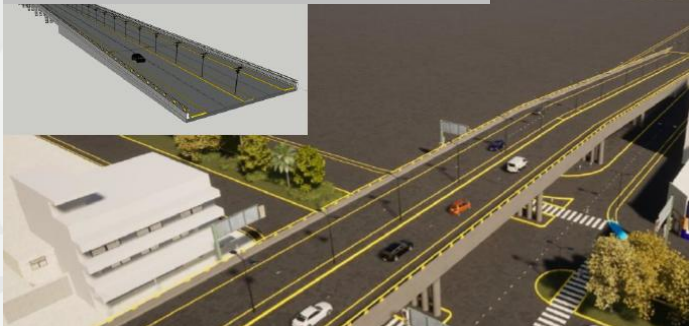


Proyecto

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

Sinaloa

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 02 al 08/01/26		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
PRECIO ALZADO								
Estudios y Proyecto Ejecutivo	Actividad	2	1.9	95.0%	0.1	0.0	0.0	Falta proyecto de semaforización v diseño
Cimentación	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Columnas y Cabezales	Apoyo	9	9	100.0%	0.0	0	0.0	Concluido
Superestructura Fabricación de Traves AASHTO IV	Actividad	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura Montaje de Traves AASHTO IV	pieza	77	77	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura Fabricación de Traves Nebraska	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Superestructura Montaje de Traves Nebraska NU240	pieza	11	11	100.0%	0	0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0.0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)	m2	1,365	1,365.0	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Muro Mecánicamente estabilizado Relleno	m3	12,940	12,940	100.0%	0	0.0	0.0	Concluido
Losa de concreto Hidráulico	pieza	3	2.4	80.0%	0.6	0.00	0.0	Se avanza con el armado de acero de refuerzo del
Pavimento de concreto Hidráulico	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Alumbrado	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Señalamiento	Actividad	2	0	0.0%	2	0	0.0	
Semaforización	Actividad	1	0	0.0%	1	0	0.0	
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	0	0.0%	5,032.00	0	0.0	
Base Hidráulica	m3	3,992.0	0	0.0%	3,992.00	0	0.0	
Riego de impregnación	m2	20,330.0	0	0.0%	20,330.00	0	0.0	
Fresado de superficie	m2	23,420.0	0	0.0%	23,420.00	0	0.0	
Banqueta	m2	6,922.0	0	0.0%	6,922.00	0	0.0	
Relleno	m3	692.0	0	0.0%	692.00	0	0.0	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

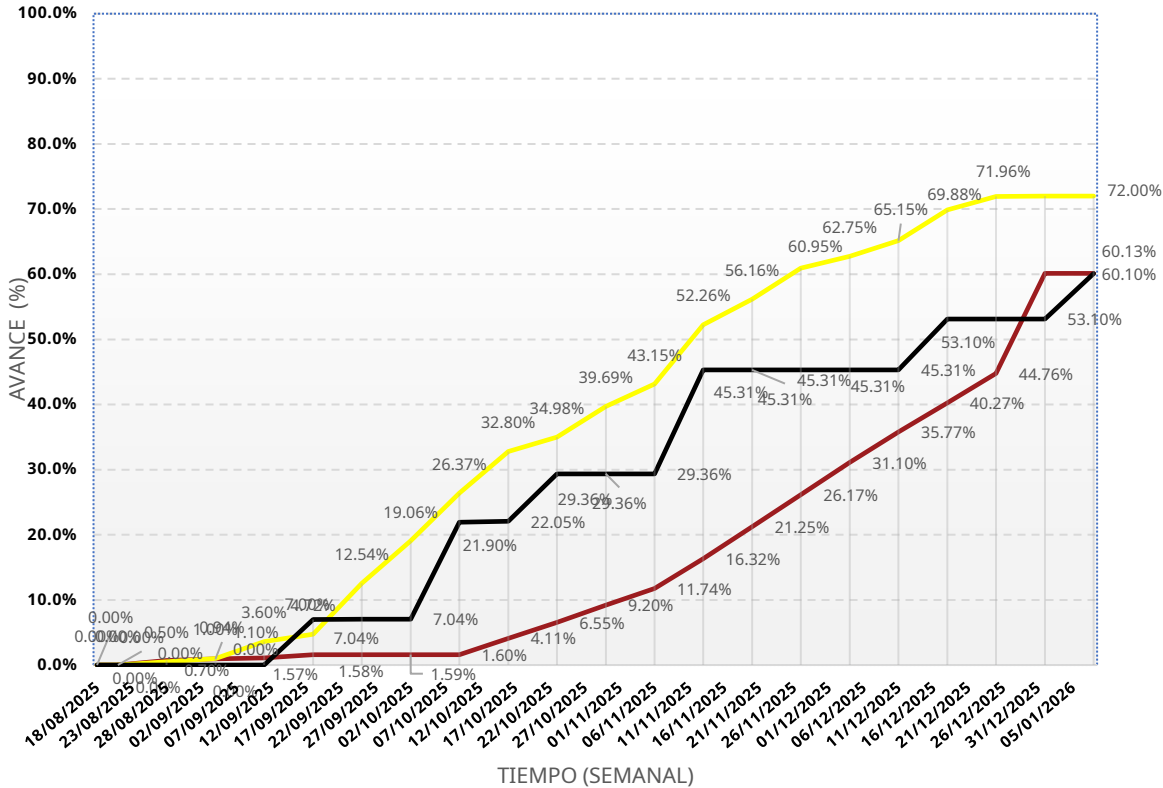

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 26 de Diciembre al 01 de Enero	Del 02 de Enero al 08 de Enero
Personal	73	10
Maquinaria	11	9
Frentes de trabajo	6	0
