

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance global

• Programado: 28.49%
• Real: 38.20%

• Semanal: 0.20%
• Financiero: 24.10%

Avance 2025

• Meta 2025: CONCLUIDA

Avance 2026

• Programado: 0.68%
• Real: 0.32%

• Semanal: 0.32%
• Financiero: 0.00%

 **Inversión total 2025-2026:** 700 mdp
Inversión 2025: 140 mdp | 38% de 1 Distribuidor Vial
Inversión 2026: 560 mdp | 62% de 1 Distribuidor Vial

 **Meta total:** 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)


 **Inicio:** 16 de julio de 2025
Término: julio de 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre

 **73,215** habitantes beneficiados

 **7,306** empleos generados

 **20 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

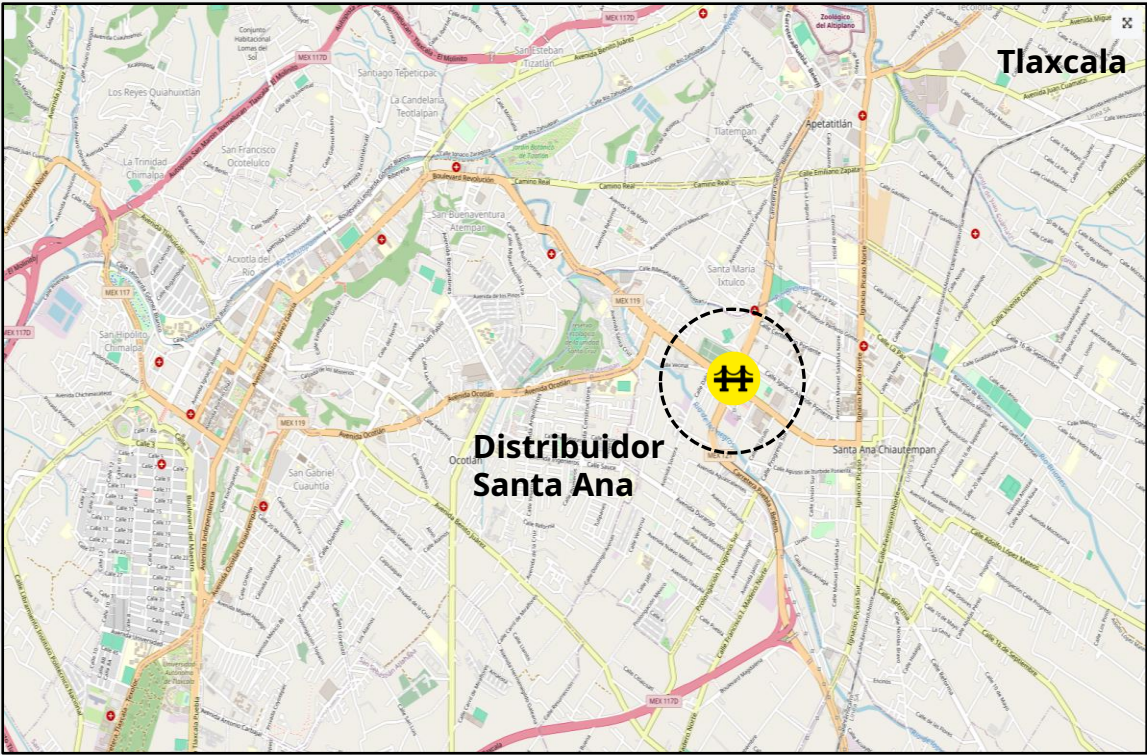


Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	02 al 08-01-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	1 Distribuidor Vial	38.20% 1 Distribuidor Vial	61.80% de 1 Distribuidor Vial	0.49%	0.20%	Se trabaja en: Construcción de cabezales eje #10, columnas octagonales ejes #5, 7 y 9, columnas circulares eje #17 y pilas coladas en sitio eje #18.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

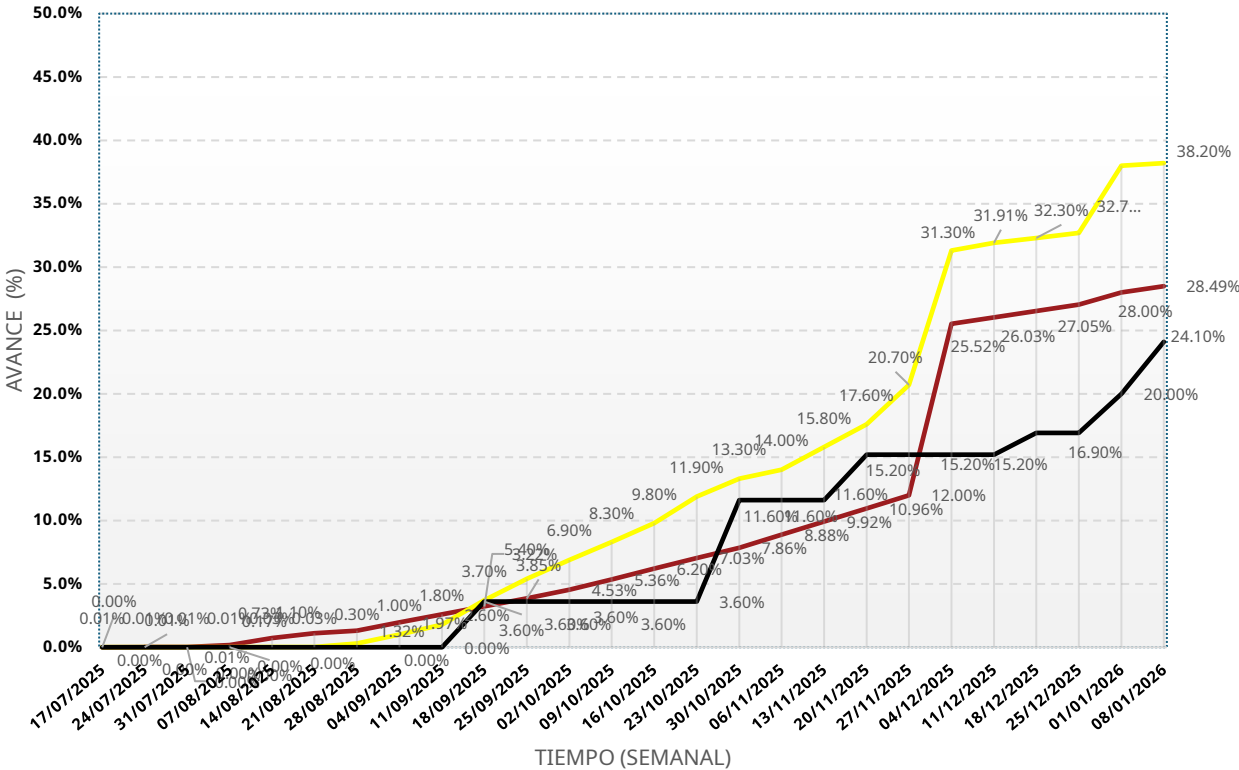

	26 al 01 de enero	02 al 08 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	127	80
Maquinaria	11	11
Frente de trabajo	2	9
