

# Puente La Presa Trancas

## Colima

- Avance global**
  - Programado: 41.34 %
  - Real: 40.15 %
  - Semanal: 1.94 %
  - Financiero: 29.98 %
- Avance 2025**
  - Programado: 100.0 %
  - Real: 100.0 %
  - Semanal: 4.47 %
  - Financiero: 100.0 %

**Inversión total 2025-2026:** 86.0 mdp

**Inversión 2025:** 31.0 mdp

**Meta total:** 0.601 km

**Meta 2025:** 38.6 % del Puente

**Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025


**Fecha de término:** Abril, 2026

**Termino meta 2025:** 31 de diciembre

**4,053** habitantes beneficiados

**225** empleos generados

**15 min** ahorro en tiempo

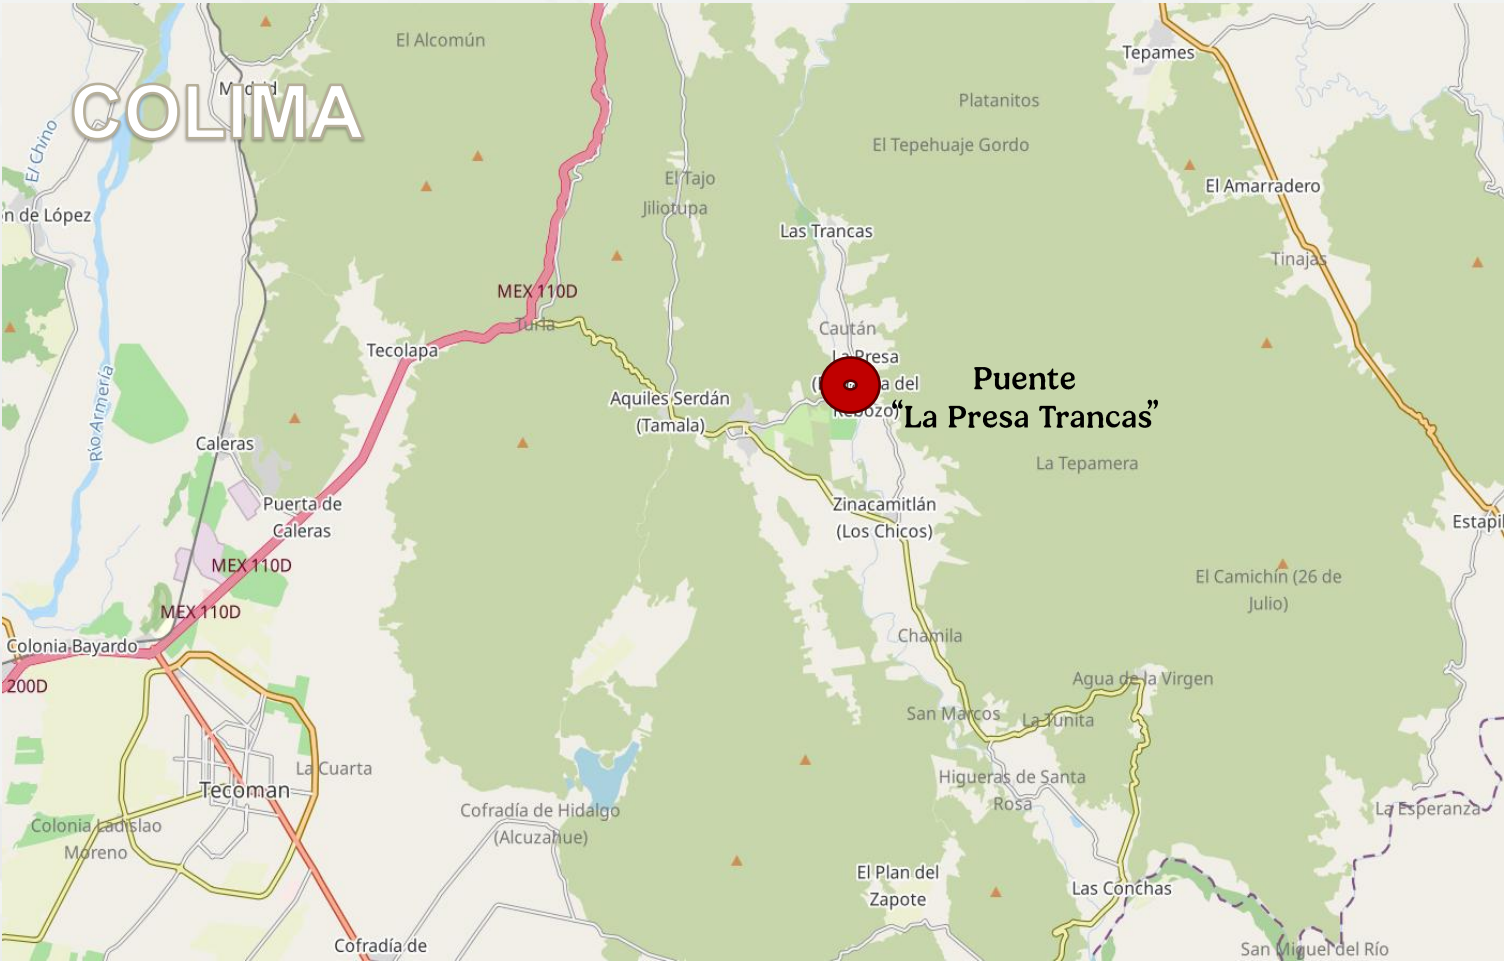


| Tramo                                    | Empresas                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción del Puente La Presa Trancas | • <b>Contratista:</b> GRUPO FIRME DE MÉXICO, S.A DE C.V, CONSTRUCTORA SANTOS CHISUM, S.A DE C.V Y CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS VANGUARDIA, S.A DE C.V |
|                                          | • <b>Supervisión:</b> ANMA INGENIERÍA, SA DE CV                                                                                                       |

# Puente La Presa Trancas

## Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

| Elemento                                              | Intervención | Ejecutado<br>acumulado | Faltante | 02/01/26 al 08/01/26 |           |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------|----------------------|-----------|
|                                                       |              |                        |          | Programado           | Ejecutado |
| Preliminares                                          |              |                        |          |                      |           |
| Desmonte y Despalme (Ha)                              | 0.83         | 0.83                   | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| Subestructura                                         |              |                        |          |                      |           |
| Pilas de cimentación (Perforación). Pza.              | 26.00        | 26.00                  | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| Pilas de cimentación (Armado). Pza.                   | 26.00        | 26.00                  | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| Pilas de cimentación (Colado). Pza.                   | 26.00        | 26.00                  | 0.00     | 0.00                 | 0.00      |
| Columnas. Pza.                                        | 2.00         | 0.00                   | 2.00     | 1.00                 | 0.00      |
| Cnstruccion de cabezales y bancos. Pza.               | 4.00         | 0.00                   | 4.00     | 1.30                 | 0.00      |
| Superestructura                                       |              |                        |          |                      |           |
| Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Fabricación) | 18.00        | 13.00                  | 5.00     | 3.00                 | 0.00      |
| Trabes pretensadas AASHTO TIPO VI (Pza) (Montaje)     | 18.00        | 0.00                   | 18.00    | 0.00                 | 0.00      |
| Colado de diafragma y losa. M3                        | 197.1        | 0.00                   | 197.1    | 0.00                 | 0.00      |
| Carpeta asfáltica. M3.                                | 220          | 0.00                   | 220      | 0.00                 | 0.00      |
| Guarniciones, Banquetas y Parapetos. M3.              | 43.8         | 0.00                   | 43.8     | 0.00                 | 0.00      |
| Accesos, señalamiento y Obras complementarias. M.     | 182          | 0.00                   | 182      | 0.00                 | 0.00      |

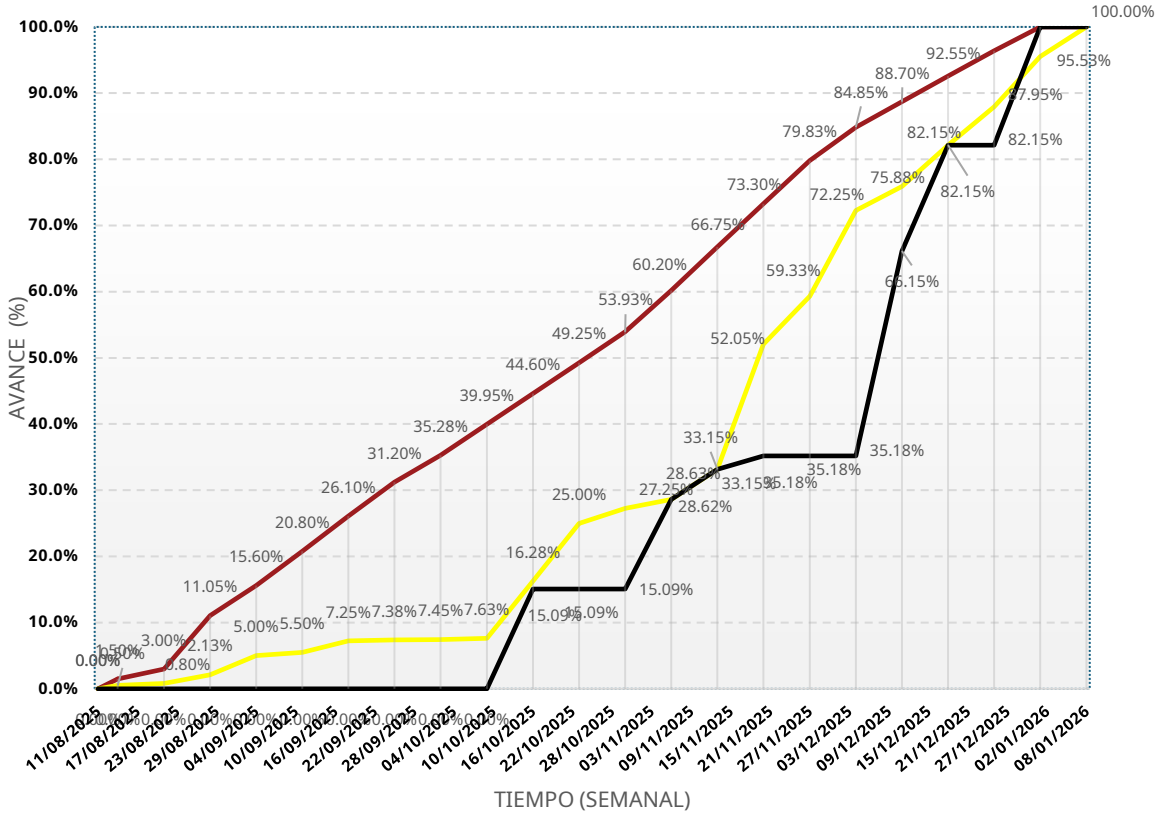

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

|                              | 26 de diciembre al 01 de enero | 02 de enero al 08 de enero |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 34                             | 34                         |
| Maquinaria                   | 7                              | 7                          |
| Frentes de trabajo           | 3                              | 3                          |
