

# CDMX

## Alameda Oriente

### Avance global

- Programado: 37.33%
- Real: 34.17%
- Semanal: 4.23%
- Financiero: 26.65%



**Inversión total 2025-2027:** 2,000 mdp  
**Meta total:** 2 puentes | 1.2 km longitud total.



**Inversión 2025:** 315.81 mdp  
**Meta 2025:** 16.86% de 2 puentes  
**Inversión 2026:** 670 mdp  
**Meta 2026:** 33.86% de 2 puentes



**Inicio:** 17 de junio de 2025  
**Término:** Octubre 2027  
**Término meta 2026:** Diciembre 2026



**1,798,474** habitantes beneficiados



**6,000** empleos generados



**15 min** ahorro en tiempo

**Beneficios:** Contribuye a mejorar la conectividad de la zona oriente de la CDMX y EDO. MEX. mejorando el nivel de servicio, actualmente el Puente 1 opera en doble sentido de circulación (2 carriles en sentido Sur-Norte y 1 sentido Norte-Sur) debido al daño estructural en el Puente 2 ocasionado por los sismos de los años 2017, 2020 y 2021, reduciendo la capacidad de movilidad de 6 a 3 carriles.

### Empresas


- **Contratista:** CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.

ACTUALIZADA 26/05/2026



**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

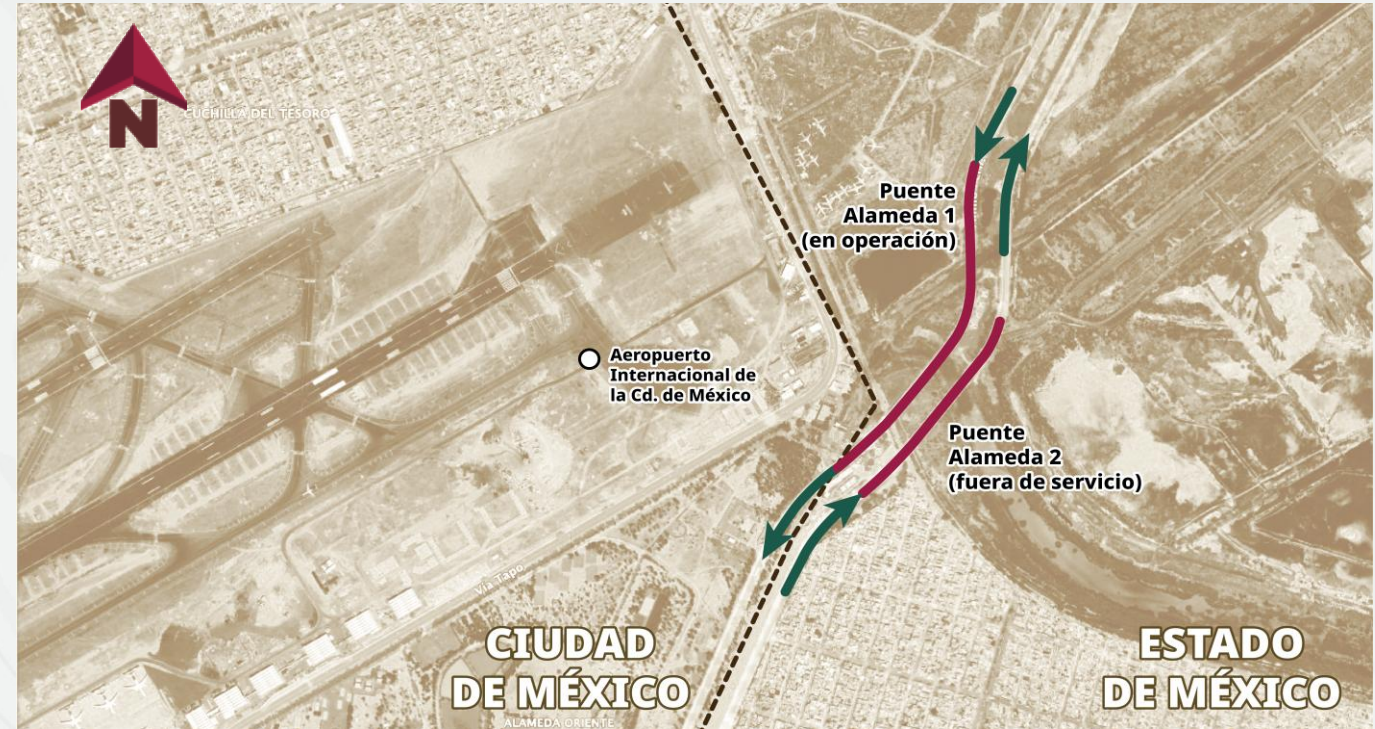

Situación actual



Proyecto




# Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente

## (Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)

| Elemento                                                            | Intervención | Unidad    | Ejecutado |           | 15/may/26 al 21/may/26 |           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|
|                                                                     |              |           | Acumulado | Faltante  | Programado             | Ejecutado |
| Estudios (Puente 1 y 2)                                             | 1            | Actividad | 1         | 0         | 0                      | 0         |
| Proyectos (Puente 1 y 2)                                            | 1            | Actividad | 1         | 0         | 0                      | 0         |
| Demolición y retiro de estructura (Puente 2)                        | 500          | m         | 500       | 0         | 0                      | 0         |
| Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puente 2)                  | 18           | Pzs       | 18        | 0         | 0                      | 0         |
| Desmantelamiento de señal tipo puente (Puente 1 y 2)                | 2            | Pzs       | 2         | 0         | 0                      | 0         |
| Despalme en caminos de servicio (Puente 1 y 2)                      | 8,941.38     | m3        | 7,233.75  | 1,707.63  | 398.66                 | 0         |
| Excavación en caminos de servicio (Puente 1 y 2)                    | 44,810.84    | m3        | 33,082.07 | 11,728.77 | 1,936.27               | 1,441.63  |
| Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 1 y 2)     | 65,681.44    | m3        | 44,810.84 | 20,870.6  | 2,928.47               | 0         |
| Construcción de tramos de pilotes de concreto y de acero (Puente 2) | 1,892        | Pzs       | 1,892     | 0         | 0                      | 0         |
| Hincado de pilotes de concreto y de acero (Puente 2)                | 1,892        | Pzs       | 1,575     | 317       | 51.14                  | 30        |
| Excavación para desplante de Zapatas (Puente 2)                     | 1,984.1      | m3        | 1,405.8   | 578.3     | 85.73                  | 0         |
| Construcción de Zapatas (Puente 2)                                  | 3            | Pzs       | 1         | 2         | 0.12                   | 0         |
| Excavación para desplante de Cajones (Puente 2)                     | 4,159.81     | m3        | 3,679.86  | 479.95    | 143.44                 | 200       |
| Construcción de Cajones (Puente 2)                                  | 8            | Pzs       | 2         | 6         | 0.31                   | 0.05      |
| Construcción de Columnas (Puente 2)                                 | 11           | Pzs       | 2         | 9         | 0.8                    | 0         |
| Construcción de Cabezales (Puente 2)                                | 11           | Pzs       | 1         | 10        | 0.54                   | 0.4       |
| Fabricación de trabes pretensadas (Puente 2)                        | 44           | Pzs       | 10        | 34        | 2                      | 0         |
| Traslado y montaje de trabes pretensadas (Puente 2)                 | 44           | Pzs       | 0         | 44        | 2.07                   | 0         |
| Fabricación de trabes de Acero (Puente 2)                           | 3            | Pzs       | 0         | 3         | 0.14                   | 0         |
| Traslado y montaje de trabes de Acero (Puente 2)                    | 3            | Pzs       | 0         | 3         | 0.04                   | 0         |
| Construcción de Losas de calzada (Puente 2)                         | 10           | Claros    | 0         | 10        | 0                      | 0         |
| Construcción de Guarnición, Parapeto y Banqueta (Puente 2)          | 960          | m         | 0         | 960       | 0                      | 0         |
| Construcción de Accesos (Puente 2)                                  | 2            | Accesos   | 0         | 2         | 0                      | 0         |
| Construcción de línea de alumbrado publico (Puente 2)               | 1            | Línea     | 0         | 1         | 0                      | 0         |
| Señalamiento Horizontal y Vertical (Puente 2)                       | 1            | Lote      | 0         | 1         | 0                      | 0         |

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

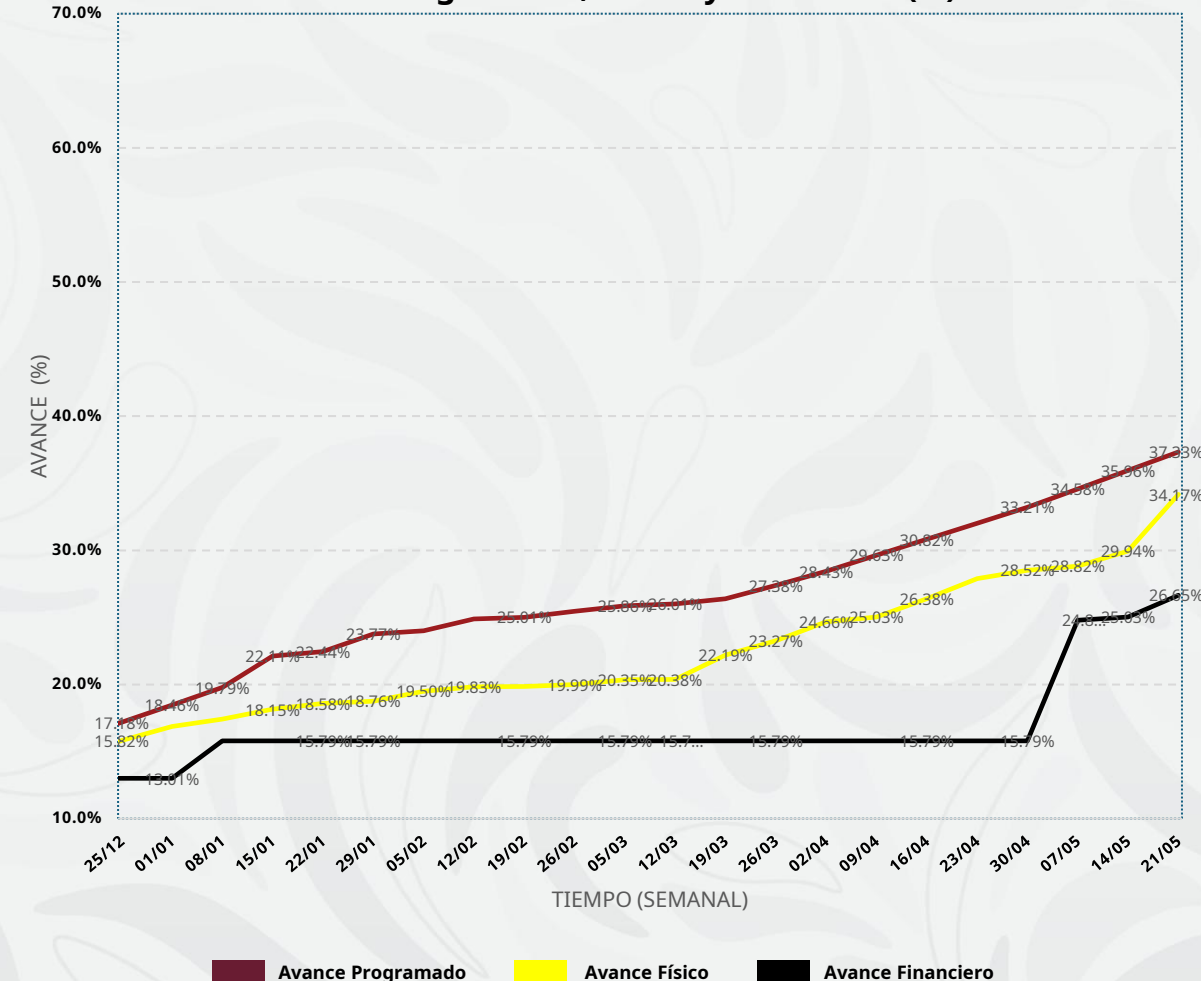

|                              | Del 08 al 14 de mayo de 2026 | Del 15 al 21 de mayo de 2026 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 149                          | 154                          |
| Maquinaria                   | 16                           | 16                           |
| Frentes de trabajo           | 10                           | 12                           |
