

PSV Celsa Virgen Pérez (Arco Norte)

Colima

ACTUALIZADA 26/05/2026



Avance global

- Programado: 94.58%
- Real: 98.62%

- Semanal: 1.48%
- Financiero: 73.99%



Inversión total 2025-2026: 436.0 MDP



Meta total: 590.0 m longitud total, 298.0 m estructura, 292.0 m accesos



Inversión 2025: 184.3 MDP



Meta 2025: 323 m (54.8% (subestructura))



Inversión 2026: 251.7 MDP



Meta 2026: 267 m (45.2% (superestructura, pavimentos, accesos, iluminación y obras complementarias bajo puente))



Inicio: 10 de junio de 2025



Término: 23 abril 2026 *Concluido, se trabajan vialidades laterales)*



306,810 habitantes beneficiados



1,109 empleos generados




15 min ahorro en tiempo

Beneficios:

- Mejorará la conexión entre la zona metropolitana del Estado (Colima-Villa de Álvarez)
- Impulsará el crecimiento económico y social del estado
- Optimizará el flujo vehicular eliminando un punto critico de congestión vial
- Reducción de tiempo de recorrido para los usuarios

Paso superior con dos cuerpos de 3 carriles por sentido

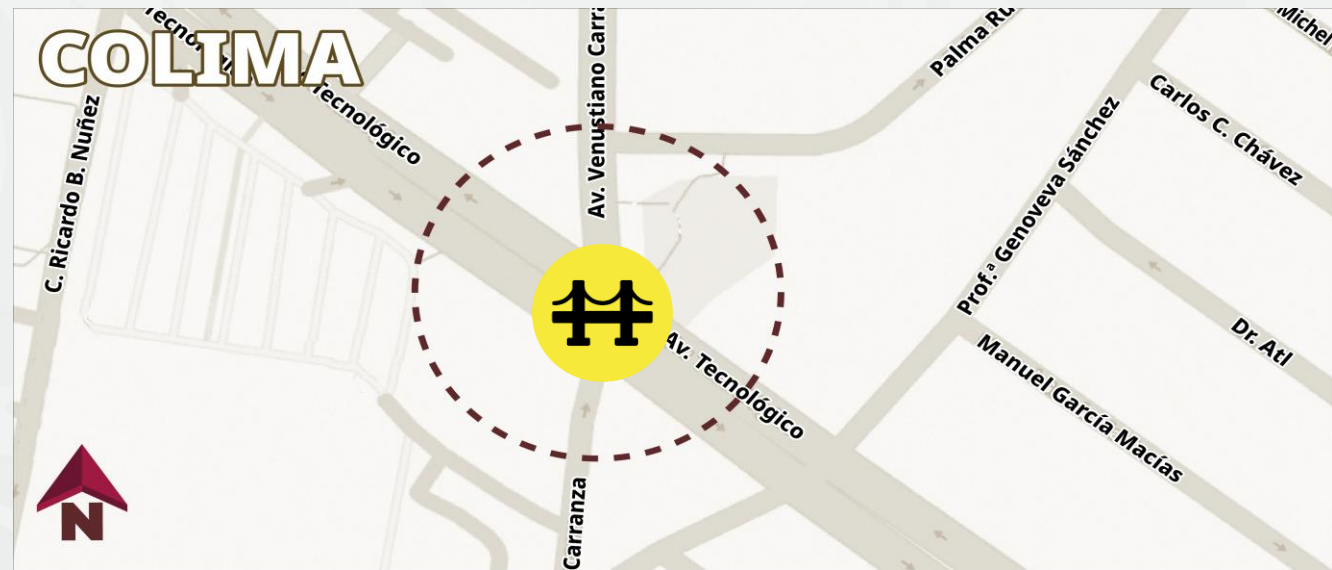


Tramo	Empresas
Construcción del Paso Superior Vehicular "Arco Norte"	• Contratista: IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V • Supervisión: JUVISA, INGENIERÍA, S.A DE C.V

PSV Celsa Virgen Pérez (Arco Norte)

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	15/05/26 al 21/05/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos						
Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza)	530.0	530.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Demolición (m)	350.0	350.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Red de media tensión subterránea (m)	2,100.0	2,100.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Reubicación acueducto 36" (m)	736.0	736.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Subestructura						
Pilas (pza)	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Zapatas (pza)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Columnas (pza)	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos
Cabezales (pza)	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	Trabajos concluidos

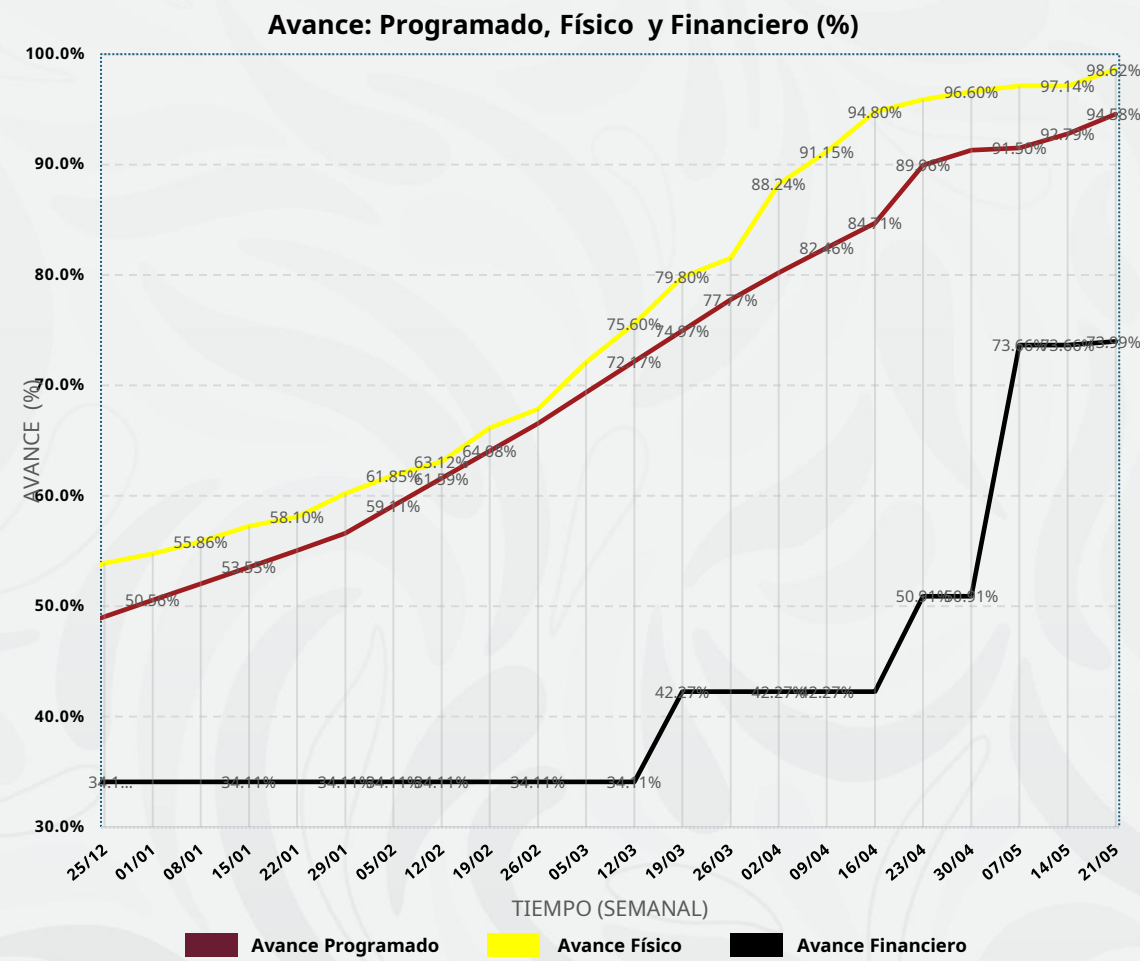

	08 de mayo al 14 de mayo	15 de mayo al 21 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	60	35
Maquinaria	7	5
Frentes de trabajo	5	4
