



Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)

Avance global

- Programado: 93.14%
- Real: 100%
- Semanal: 0.94%
- Financiero: 82.59%



Inversión total 2025-2026: 700 mdp

Meta total: 1.5 km deprimido y 4.1 km gasas



Inversión 2026: 380 mdp

Meta 2026: 0.22 km de Deprimido y 3.83 km de gasas



Inicio: 12 de mayo de 2025

Término: mayo de 2026



351,000 habitantes beneficiados



2,100 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Beneficios: Ofrecerá flujo continuo a los usuarios que circulan entre Cabo San Lucas y San José del Cabo y reducirá la probabilidad de accidentes al evitar entrecruzamientos a nivel con el tránsito que circula sobre la carretera federal MEX-001 Cabo San Lucas – La Paz.

Paso inferior con 2 carriles por sentido, ciclovía bidireccional y cruces peatonales



Tramo	Empresas
km 30+300	• Contratista: Convenio de participación conjunta de: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO INTEGRAL DICSSA, S.A. DE C.V. • Supervisión: INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.




Glorieta de las Mujeres Libres de Baja California Sur

Los Cabos, BCS (Carretera Cabo San Lucas – La Paz)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	15/05/26 al 21/05/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Preliminares						
Reforzamiento Puente Peatonal (lote)	1.0	1.0	0.0	-	-	Concluido
Terracerías y Pavimentos						
Terracerías (m3)	14,112.0	14,112.0	0.0	-	-	Concluido
Excavación núcleo (m3)	100,069.2	100,069.2	0.0	-	-	Concluido
Base hidráulica (m3)	11,840.0	11,840.0	0.0	-	-	Concluido
Base asfáltica (m3)	5,545.0	5,545.0	0.0	-	-	Concluido
Carpeta asfáltica (m3)	1,992.0	1,992.0	0.0	-	92.0	Concluido
Relleno fluido (m3)	1,680.0	1,680.0	0.0	-	-	Concluido
Pavimento rígido (m3)	3,552.0	3,552.0	0.0	-	-	Concluido
Estructura Paso Inferior Vehicular						
Zapatas (pzas)	12.0	12.0	0.0	-	-	Concluido
Muros de 2 a 7 m (pzas)	12.0	12.0	0.0	-	-	Concluido
Trabes de liga (m)	1,123.6	1,123.6	0.0	-	-	Concluido
Contratrabes Metálicas (pza)	29.0	29.0	0.0	-	-	Concluido
Limpieza de pilas (m2)	7,000.0	7,000.0	0.0	-	-	Concluido
Juntas de dilatación (pza)	8.0	8.0	0.0	-	-	Concluido
Montaje trabes AASHTO tipo III (pzas)	52.0	52.0	0.0	-	-	Concluido
Losas de acceso (m2)	609.8	609.8	0.0	-	-	Concluido
Losas puentes (m2)	1,642.8	1,642.8	0.0	-	-	Concluido
Parapeto (m)	1,725.2	1,725.2	0.0	-	-	Concluido
Guarnición (m3)	5,800.0	5,800.0	0.0	-	100.0	Concluido
Banquetas (m2)	10,068.0	10,068.0	0.0	-	-	Concluido
Drenaje Pluvial (m)	1,600.0	1,600.0	0.0	-	-	Concluido
Registros Pluviales (pza)	32.0	32.0	0.0	-	-	Concluido
Semaforización y Señalamiento						
Semaforización (%)	100.0	100.0	0.0	-	-	Concluido
Horizontal (m)	29,901.7	29,901.7	0.0	-	20,365.7	Concluido
Vertical (pza)	273.0	273.0	0.0	-	203.0	Concluido
Obra inducida						
Alumbrado (pza)	305.0	305.0	0.0	-	-	Concluido
Reubicación de la vegetación (pza)	500.0	500.0	0.0	-	500.0	Concluido

Avance: Programado, Físico y Financiero

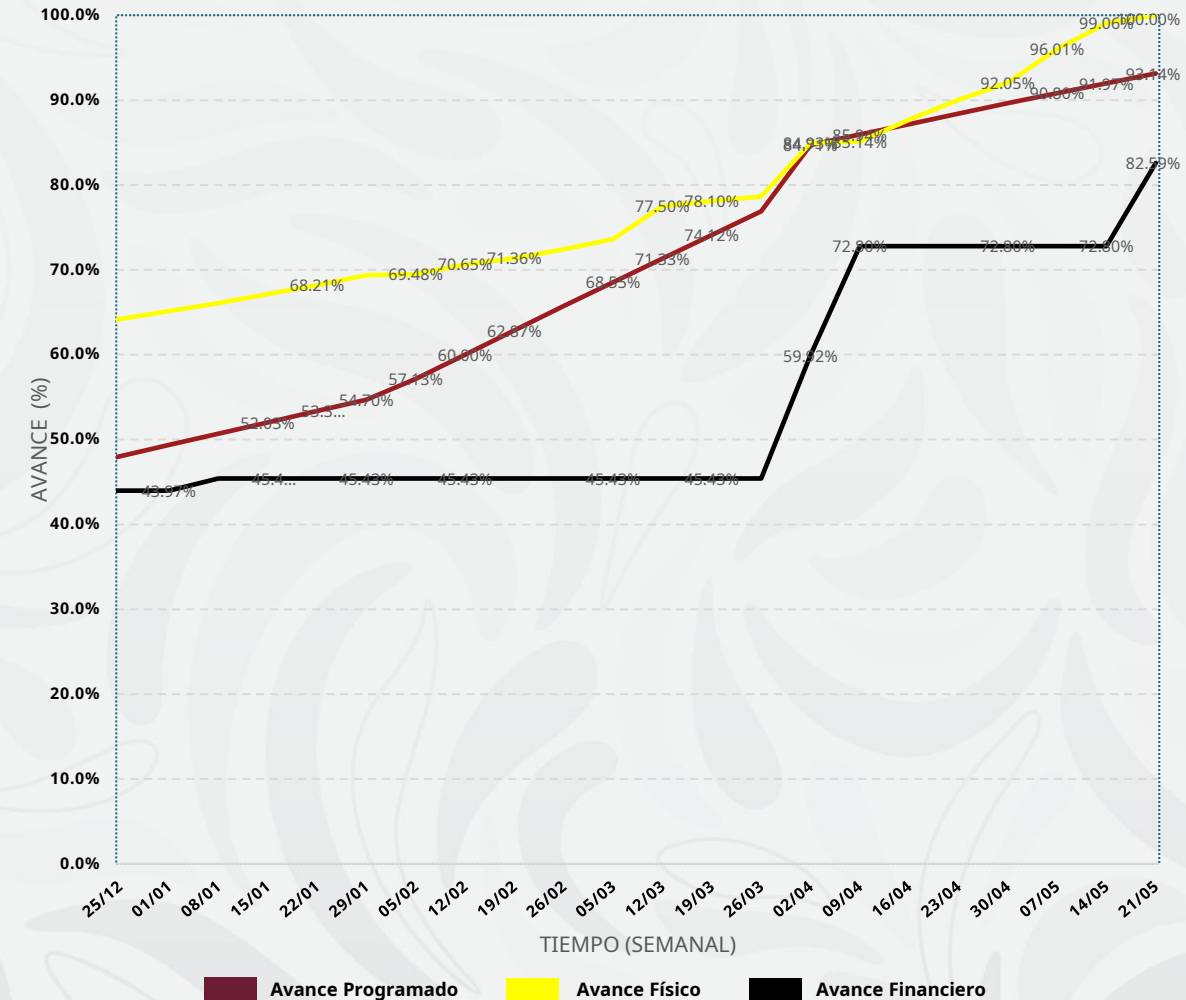

	08 de mayo al 14 de mayo	15 de mayo al 21 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	60	45
Maquinaria	10	4
Frentes de trabajo	7	3
