



Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Avance global

- Programado: 48.77%
- Real: 51.60%
- Semanal: 0.90%
- Financiero: 45.40%



Inversión total 2025-2026: 740 mdp

Meta total: 1 Distribuidor | **1.204 km** (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)



Inversión 2025: 140 mdp

Meta 2025: 38% de 1 Distribuidor Vial

Inversión 2026: 600 mdp

Meta 2026: 62% de 1 Distribuidor Vial



Inicio: 16 de julio de 2025

Término meta 2025: Diciembre 2025

Término meta total: Julio de 2026



73,215 habitantes beneficiados



2,220 empleos generados




20 min ahorro en tiempo

Beneficios Avanzar en la modernización y mejoramiento de la infraestructura vial, fortaleciendo la actividad económica, turística y comercial de la región. Además, se tendrán beneficios para los usuarios de largo recorrido al lograrse mayores velocidades de desplazamiento, lo que contribuye a la disminución de los costos de operación vehicular, en los tiempos de recorrido y accidentes.

Paso superior con dos carriles por sentido


Tramo	Empresas
KM 29+980 AL KM 30+183.58	• Contratista: PROACON MÉXICO, S.A. DE C.V. - CONSTRUCCIONES ALDESEM, S.A. DE C.V. - CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V., • Supervisión: URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

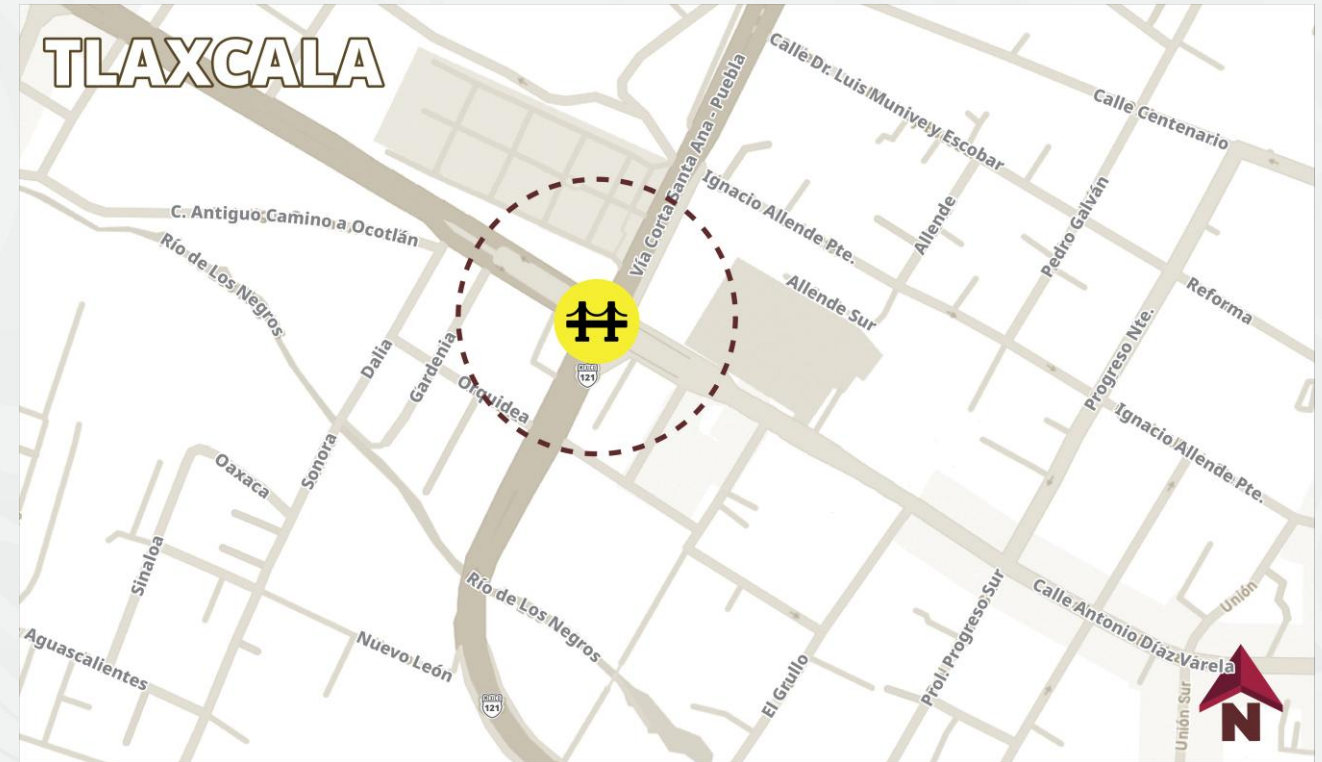

Distribuidor Vial Santa Ana

Tlaxcala

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	Del 15-05-26 al 21-05-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	1 Distribuidor Vial	51.60% 1 Distribuidor Vial	48.40% de 1 Distribuidor Vial	1.68%	0.90%	Se trabaja en: Losas, cabezal, drenaje pluvial y construcción de pilas de 1.50 m de φ.

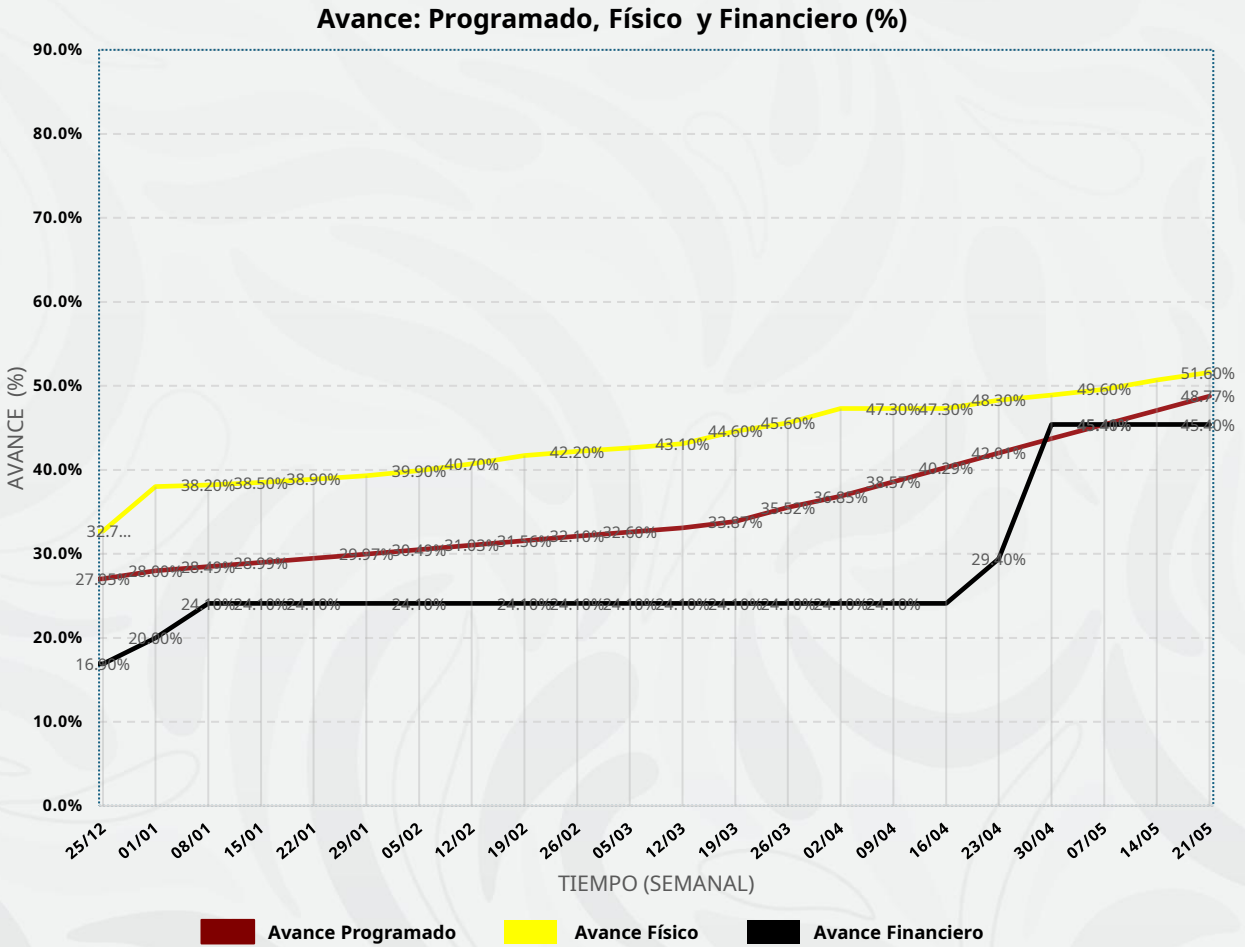

	08 al 14 de mayo	15 al 21 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	56	50
Maquinaria	13	11
Frente de trabajo	8	6
