

# CDMX

## Alameda Oriente

- Avance global**
  - Programado: 7.94%
  - Real: 6.98%
  - Semanal: 0.72%
  - Financiero: 4.90%
- Avance 2025**
  - Programado: 49.63%
  - Real: 43.63%
  - Semanal: 4.5%
  - Financiero: 36.68%

-  **Inversión total 2025-2027:** 2,000 mdp  
**Inversión 2025:** 267 mdp | (16% de 2 puentes)
-  **Meta total:** 2 puentes | 1,174.95 m longitud total.
-  **Inicio:** 17 de junio de 2025  
**Término:** Octubre 2027  
**Término meta 2025:** Diciembre
-  **1,798,474** habitantes beneficiados
-  **6,000** empleos generados
-  **15 min** ahorro en tiempo

| Empresas              |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| • <b>Contratista:</b> | CEMEX Concretos, S.A. de C.V. |
| • <b>Supervisión:</b> | ORVA Ingeniería, S.A. de C.V. |




# Construcción de dos Puentes Alameda Oriente

(Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)

| Elemento                                                                                           | Intervención | Unidad    | Ejecutado | Faltante  | 10/oct/25 al 16/oct/25 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|
|                                                                                                    |              |           | Acumulado |           | Programado             | Ejecutado |
| Estudios (Puente 1 y 2)                                                                            | 1            | Actividad | 1         | 0         | 0                      | 0         |
| Proyectos (Puente 1 y 2)                                                                           | 1            | Actividad | 1         | 0         | 0                      | 0         |
| Demolición y retiro de estructura (Puente 2)                                                       | 500          | m         | 450       | 50        | 4.11                   | 50        |
| Suministro y colocación de acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2 para pilotes (Puente 2)               | 843,000      | kg        | 135,059.6 | 707,940.4 | 30,579.12              | 36,615.8  |
| Suministro y colocación de concreto clase I, f'c 400 kg/cm2 para pilotes (Puente 2)                | 2,072        | m3        | 421.68    | 1,650.32  | 75.13                  | 112.88    |
| Hincado de pilotes de 40cmx40cm de perforación (Puente 2)                                          | 12,898       | m         | 0         | 12,898    | 505.26                 | 0         |
| Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puente 2)                                                 | 18           | Pzs       | 18        | 0         | 0                      | 0         |
| Desmantelamiento, almacenamiento, rehabilitación y reubicación de señal tipo puente (Puente 1 y 2) | 2            | Pzs       | 2         | 0         | 0                      | 0         |
| Despalme en caminos de servicio (Puente 2)                                                         | 4,740.40     | m3        | 3,986.78  | 753.62    | 175.77                 | 120.97    |
| Excavación en caminos de servicio (Puente 2)                                                       | 58,115.16    | m3        | 8,671.26  | 49,443.9  | 2,111.29               | 542.31    |
| Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 2)                                        | 42,615.03    | m3        | 11,370.47 | 31,244.56 | 1,782.13               | 1,833.92  |

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

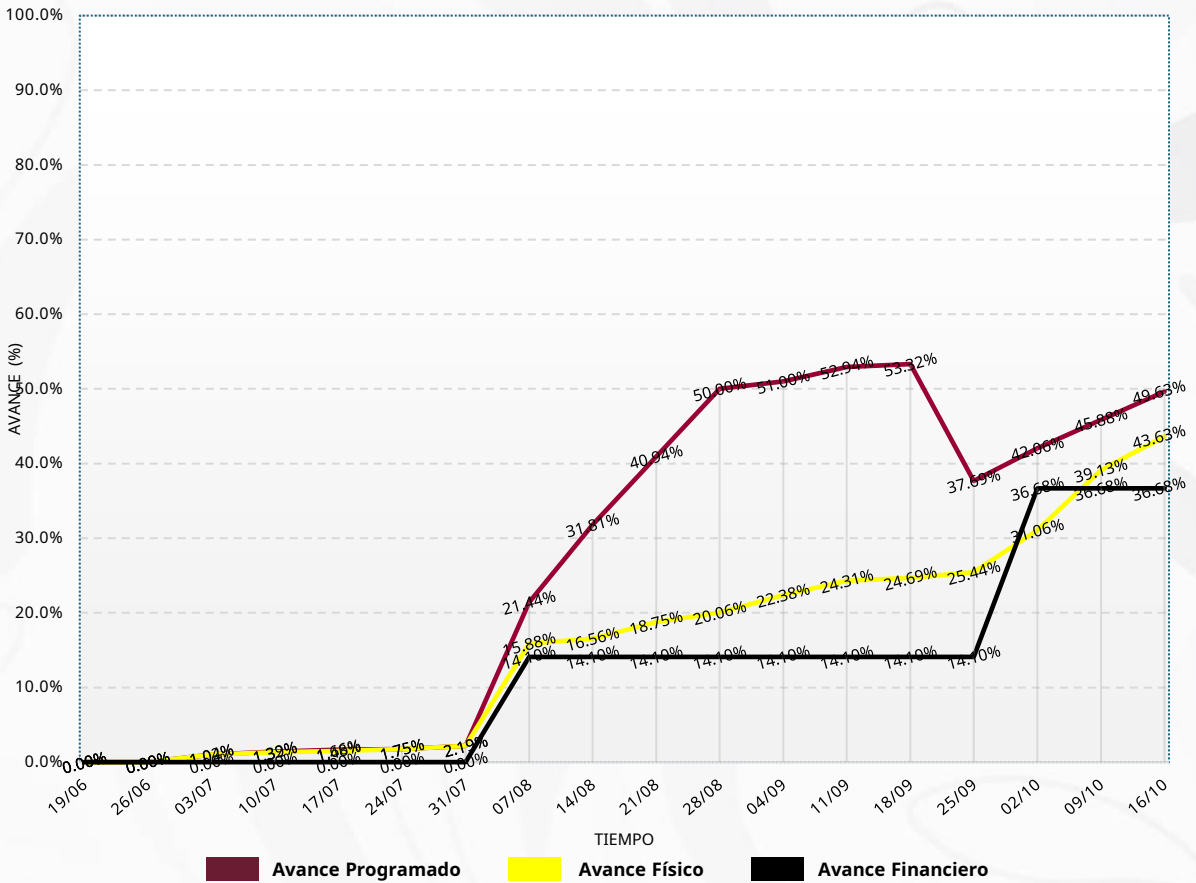

|                              | Del 03 al 09 de octubre de 2025 | Del 10 al 16 de octubre de 2025 |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 32                              | 32                              |
| Maquinaria                   | 8                               | 10                              |
