

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco



Gobierno de
México


Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 11.43%
- Semanal: 1.36%
- Real: 11.11%
- Financiero: 2.73%

Avance 2025

- Programado: 57.15%
- Semanal: 6.8%
- Real: 55.55%
- Financiero: 8.4%

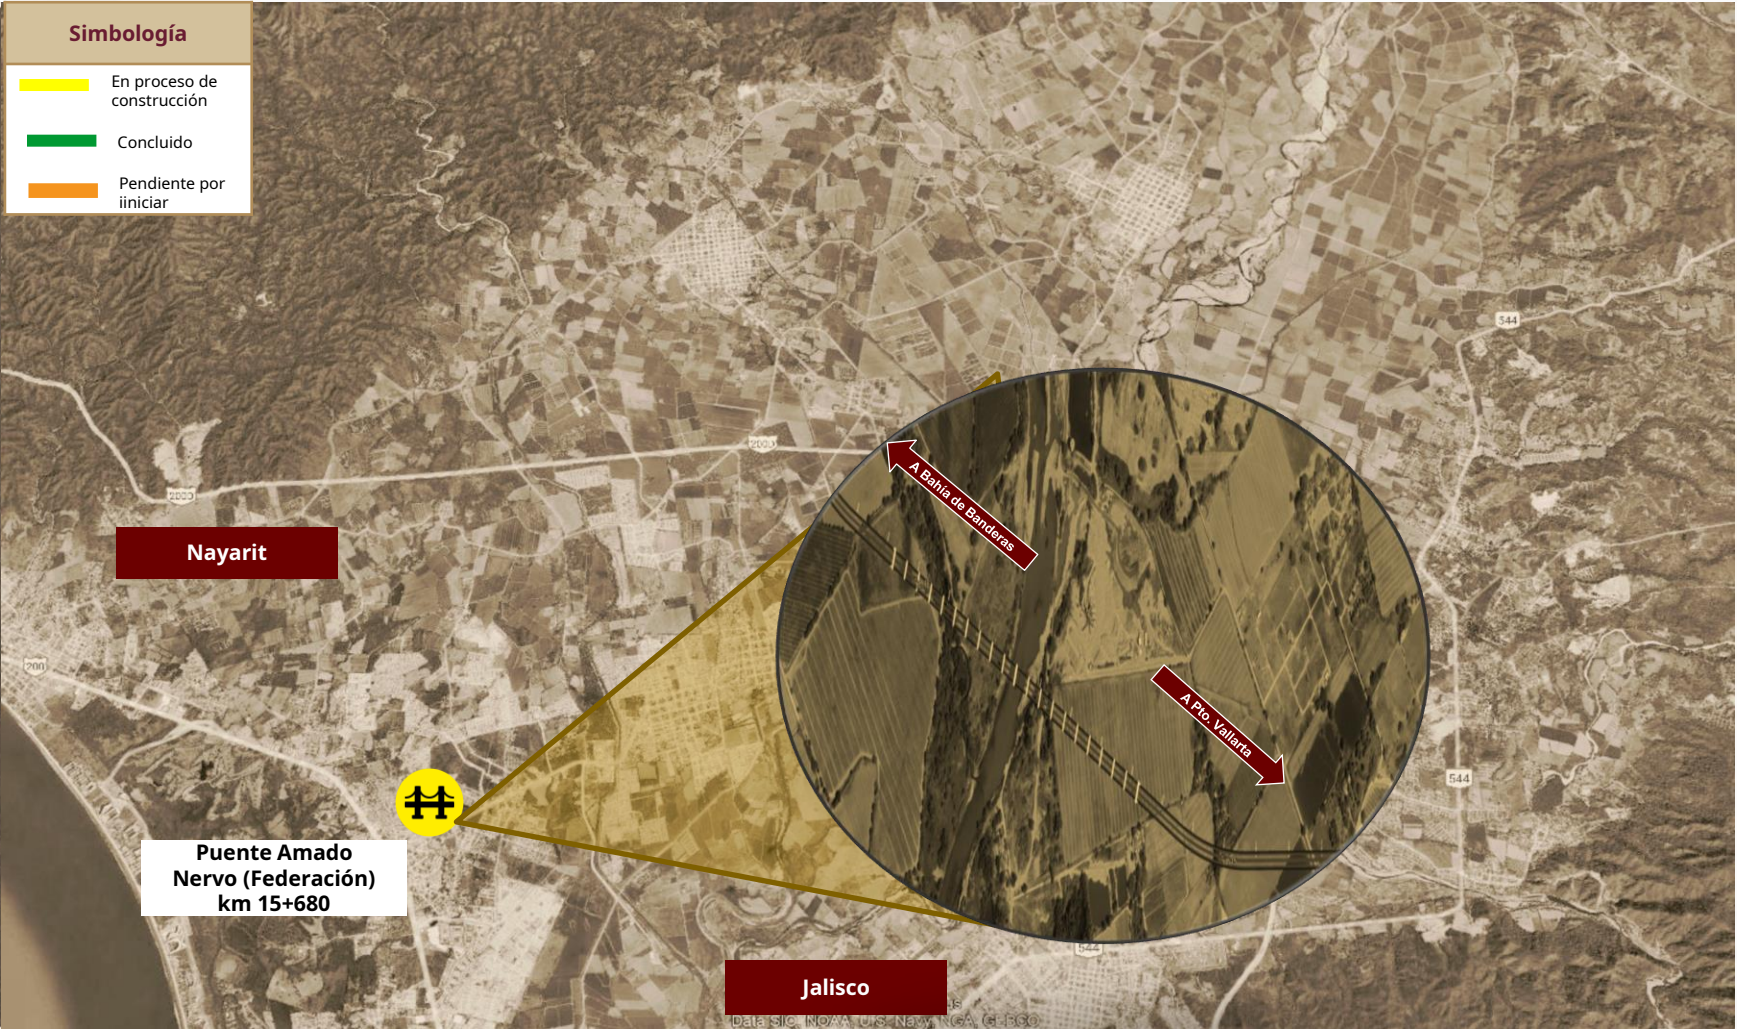

- Inversión total 2025-2026:** 900.0 mdp
Inversión 2025: 200.0 mdp | 0.4 km de Puente
- Meta total:** 1 Puente | 0.798 km
Accesos | 1.222 km
- Inicio:** 14 de julio de 2025
Término: 31 Diciembre de 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre
- 479,471** habitantes beneficiados
- 2,700** empleos generados
- 25 min** ahorro en tiempo

Empresas	
• Contratista:	Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
• Supervisión:	Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.

Puente Amado Nervo (Federación)

km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 10 al 16/10/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	0.60	8.6%	6.40	1.00	0	Concluido lado Nayarit, se realiza desmonte lado Jalisco.
Despalme	m3	14,042.0	5,764.00	41.0%	8,278.0	827.80	0	Concluido lado Nayarit, se realiza despalme lado Jalisco.
Cortes	m3	10,823.0	0	0.0%	10,823.0	0.00	0	
Terraplenes	m3	161,117.0	13,917	8.6%	147,200.0	3,985.20	92	Se continuan trabajos de pedraplén en el lado Nayarit y se inicia acarreo de piedra en lado Jalisco.
Base Estabilizada	m3	6,192.0	0	0.0%	6,192.0	0.00	0	
Carpeta de Concreto Hidráulico	m3	9,687.0	0	0.0%	9,687.0	0.00	0	
Losas de Acceso	m3	83.0	0	0.0%	83.0	0.00	0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	83	65.9%	43	5	11	Se tienen colados 83 pilotes, asimismo se tienen armados 29 pilotes
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	29	23.0%	97.00	6	8	Se tienen coladas 21 columnas del apoyo 18, 19, 20 y 21
Cabezales	pza.	21	0	0	21	0	0	
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	0	0.0%	160	0	0	
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	0	0.0%	160	0	0	
Losas y Diafragmas	m3	4,450.40	0	0.0%	4,450.40	0	0	
Parapeto y Guarnición	m	1,597.00	0	0.0%	1,597.00	0	0	
Obras de Drenaje	pza.	4.00	0	0.0%	4.00	2	0	Llegada de cajones prefabricados al sitio de los trabajos
PASOS SUPERIORES								
PSV's	pza.	2.00	0.3	15.0%	1.70	0.3	0.0	Se trabaja en armado de acero para PSV lado Nayarit.
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

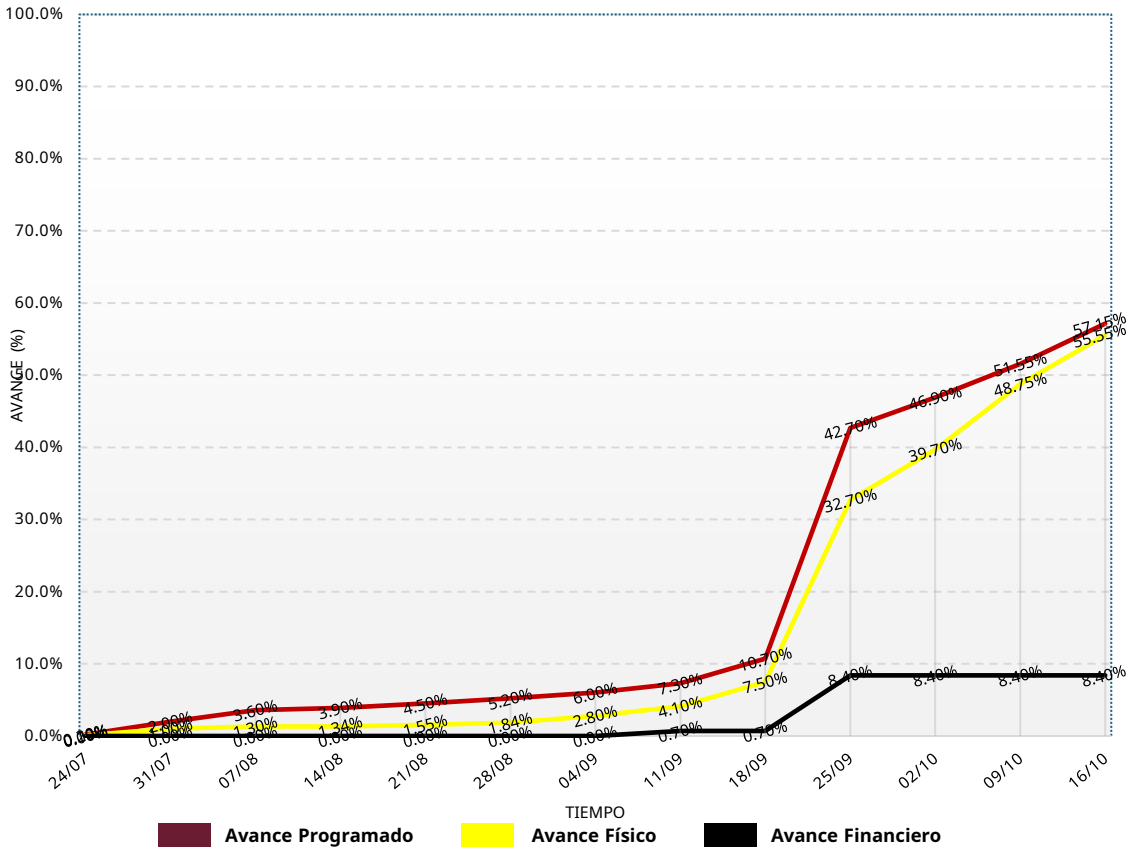

	03 de octubre al 09 de Octubre	10 de octubre al 16 de Octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	83	85
Maquinaria	16	16
