

# PSV Arco Norte Colima

**Avance global**

- Programado: 15.13%
- Real: 25.45%
- Semanal: 3.30%
- Financiero: 18.48%

**Avance 2025**

- Programado: 44.36%
- Real: 74.62%
- Semanal: 9.68%
- Financiero: 54.18%

 **Inversión total 2025-2026:** 369.7 mdp  
**Inversión 2025:** 127.4 mdp

 **Meta total:** 590 m longitud total, 298 m estructura, 292 m accesos.  
**Meta 2025:** 298 m Subestructura

 **Inicio:** 10 de junio de 2025  
**Término:** 09 de junio de 2026  
**Término meta 2025:** diciembre

 **306,810** habitantes beneficiados

 **1,109** empleos generados


 **15 min** ahorro en tiempo

| Tramo                                                 | Empresas                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construcción del Paso Superior Vehicular "Arco Norte" | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Contratista:</b> IDEVSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V Y CONSORCIO CONTINENTAL DE INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V</li><li>• <b>Supervisión:</b> JUVISA, INGENIERÍA, S.A DE C.V</li></ul> |



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

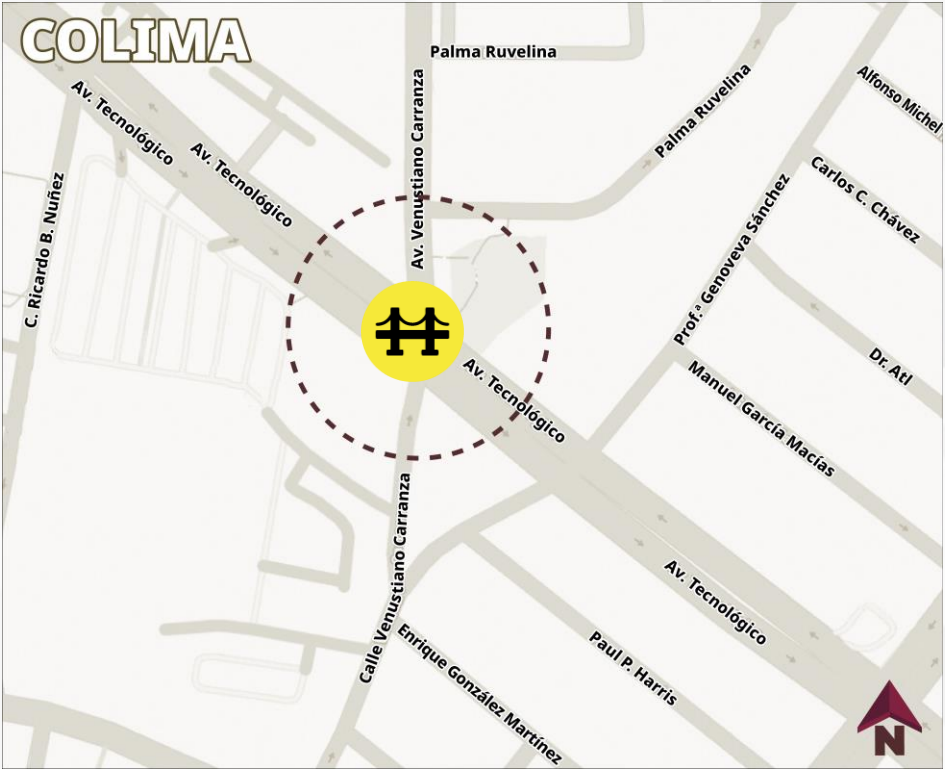

# PSV Libramiento Arco Norte

## Colima




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

| Elemento                                          | Intervención | Ejecutado acumulado | Faltante | 10/10/25 al 16/10/25 |           | Observaciones |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------------|-----------|---------------|
|                                                   |              |                     |          | Programado           | Ejecutado |               |
| Trabajos diversos                                 |              |                     |          |                      |           |               |
| Desmantelamiento de dispositivos existentes (pza) | 530.0        | 530.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | Concluido     |
| Demolición (m)                                    | 350.0        | 350.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | Concluido     |
| Red de media tensión subterránea (m)              | 2,100.0      | 2,100.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | Concluido     |
| Reubicación acueducto 36" (m)                     | 736.0        | 736.00              | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | Concluido     |
| Terracerías                                       |              |                     |          |                      |           |               |
| Corte (m³)                                        | 9,295.00     | 0.00                | 9,295.00 | 0.00                 | 0.00      |               |
| Terraplén (m³)                                    | 9,292.00     | 0.00                | 9,292.00 | 0.00                 | 0.00      |               |
| Subyacente (m³)                                   | 3,233.00     | 0.00                | 3,233.00 | 0.00                 | 0.00      |               |
| Subrasante (m³)                                   | 4,706.00     | 0.00                | 4,706.00 | 0.00                 | 0.00      |               |
| Subestructura                                     |              |                     |          |                      |           |               |
| Pilas (pza)                                       | 76.00        | 38.00               | 38.00    | 3.30                 | 5.00      |               |
| Zapatas (pza)                                     | 20.00        | 12.00               | 8.00     | 1.00                 | 1.00      |               |
| Columnas (pza)                                    | 42.00        | 24.00               | 18.00    | 2.10                 | 2.00      |               |
| Cabezales (pza)                                   | 22.00        | 6.00                | 16.00    | 1.10                 | 1.00      |               |

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

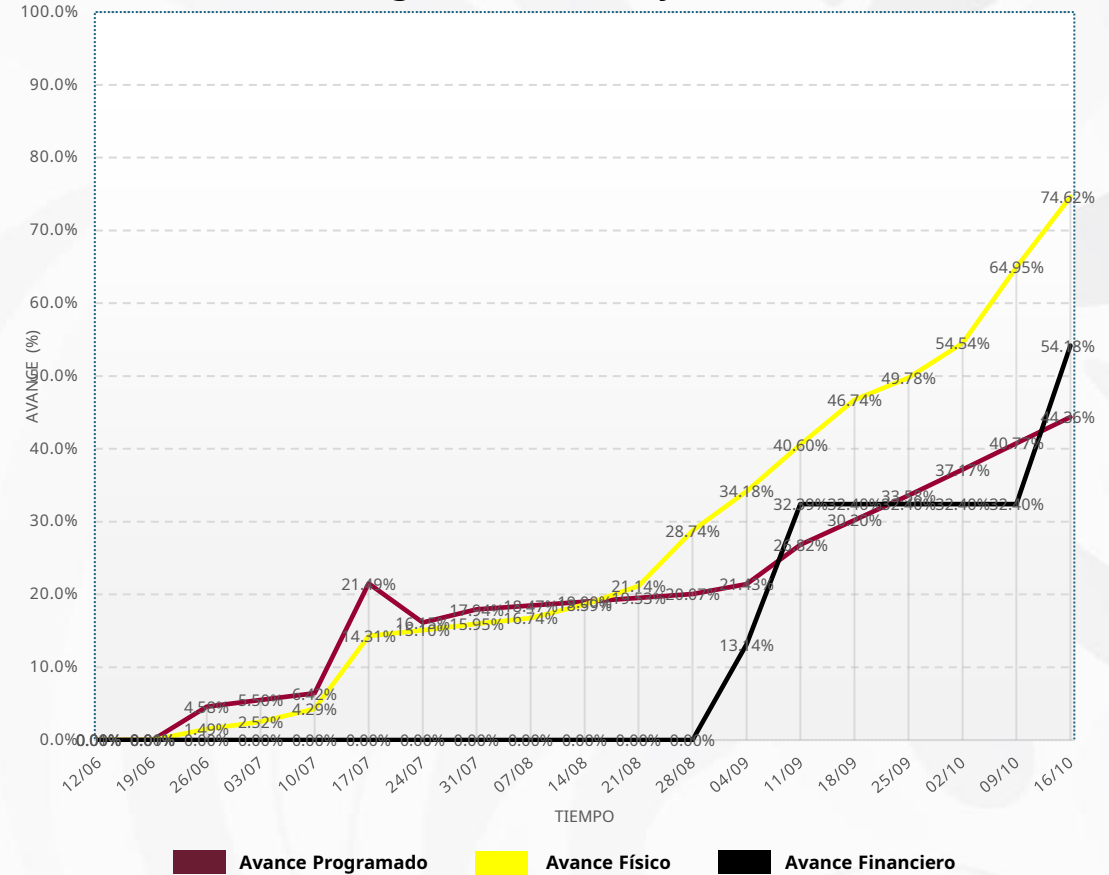

|                              | 03 de octubre al 09 de octubre | 10 de octubre al 16 de octubre |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 80                             | 80                             |
| Maquinaria                   | 14                             | 15                             |
