

PSF Arco Sur

Colima

Avance global

- Programado: 11.94%
- Real: 30.10%
- Semanal: 3.23%
- Financiero: 11.61%

Avance 2025

- Programado: 25.83%
- Real: 65.11%
- Semanal: 6.99%
- Financiero: 24.34%

 **Inversión total 2025-20265:** 575.4 mdp
Inversión 2025: 227.4 mdp

 **Meta total:** 1.2 km (puente y accesos)
Meta 2025: 0.55 km (**46% del puente (cimentación y subestructura)**)

 **Inicio:** 03-Julio de 2025
Término: Julio de 2026
Término meta 2025: Diciembre

 **157,048** habitantes beneficiados

 **1,431** empleos generados


 **15 min** ahorro en tiempo

Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: DITAPSA CONSULTORES, S.A DE C.V




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

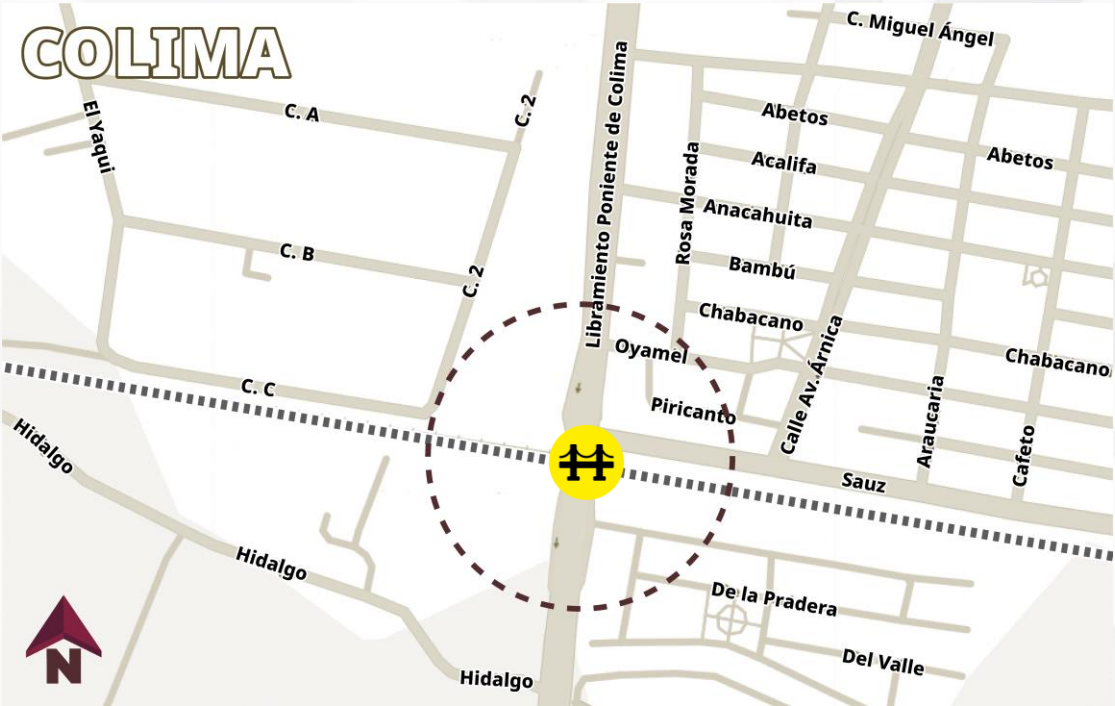

PSF Arco Sur
Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	10/10/25 al 16/10/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos (pzs)	254.0	90.06	163.94	15.69	0.0	
Reubicación de obras inducidas (m)	2,477.55	2,032.36	445.19	161.05	0.0	
Construcción de cruce prov. FFCC (pza)	223.00	202.09	20.91	16.21	1.82	
Losa plana para mantenimiento CONAGUA (m3)	80.03	0.00	80.03	0.00	0.00	
SUBESTRUCTURA PUENTE LATERAL						
Pilas (pza)	4.00	3.72	0.28	0.16	2.14	
Cabezales (pza)	2.00	1.03	0.97	0.15	0.97	
Accesos (m3)	210.02	0.72	209.30	1.77	0.00	
Superestructura puente lateral (pza)	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
Adecuación lateral no. 1 (m3)	994.56	962.25	32.31	27.19	0.00	
Adecuación lateral no. 2 (m3)	790.42	414.03	376.39	5.21	92.97	
Accesos al PSF (m)	896.00	17.81	878.19	11.50	2.61	

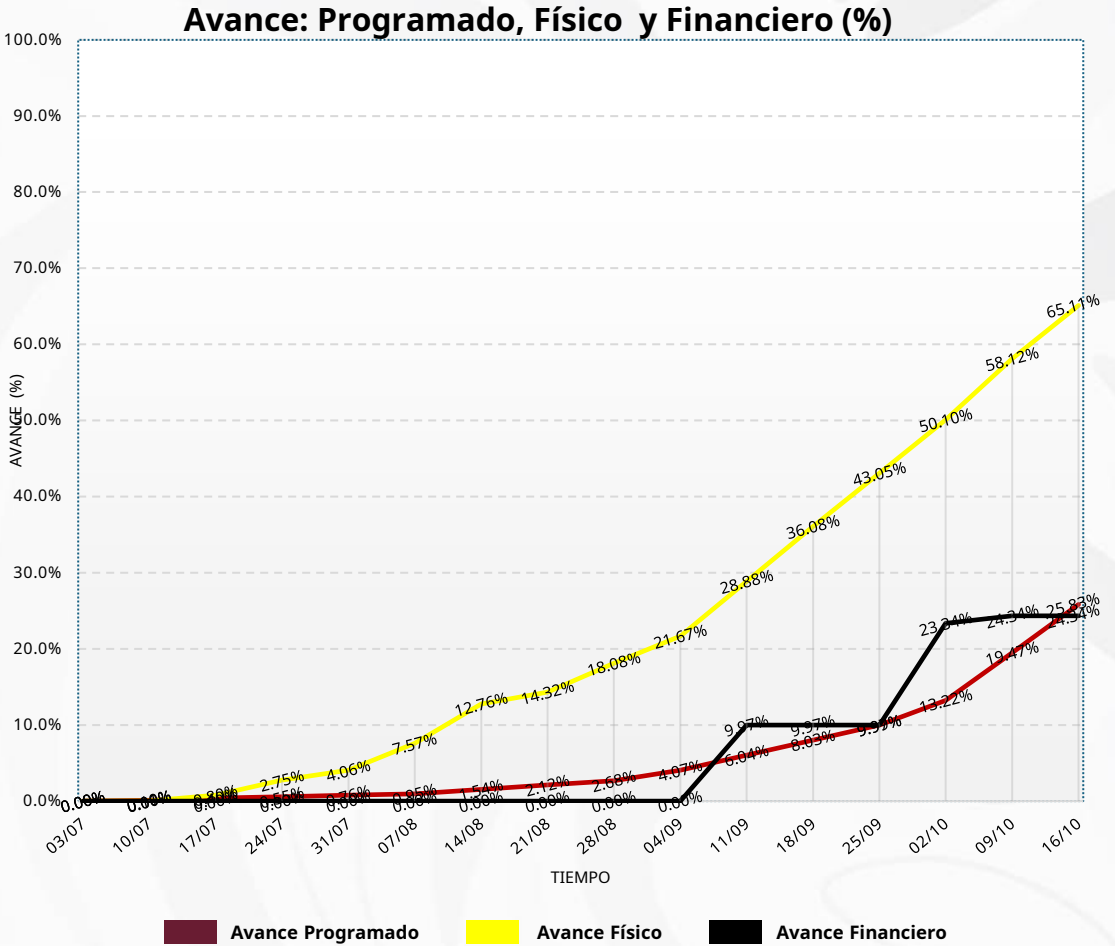

	03 al 09 de octubre	10 al 16 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	245	282
Maquinaria	49	48
