

CDMX

Alameda Oriente

Avance global

- Programado: 14.63%
- Real: 13.72%
- Semanal: 1.56%
- Financiero: 8.62%

Avance 2025

- Programado: 91.44%
- Real: 85.75%
- Semanal: 9.75%
- Financiero: 54.38%*

* El decremento del avance financiero deriva de la ampliación de 50 mdp para el ejercicio fiscal 2025

Inversión total 2025-2027: 2,000 mdp
Inversión 2025: 317 mdp | (16% de 2 puentes)

Nota: El 03/dic/25 se asignaron 50 mdp adicionales al ejercicio fiscal 2025

Meta total: 2 puentes | 1,174.95 m longitud total.

Inicio: 17 de junio de 2025
Término: Octubre 2027
Término meta 2025: Diciembre

1,798,474 habitantes beneficiados

6,000 empleos generados

15 min ahorro en tiempo


Empresas

- **Contratista:** CEMEX Concretos, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** ORVA Ingeniería, S.A. de C.V.



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

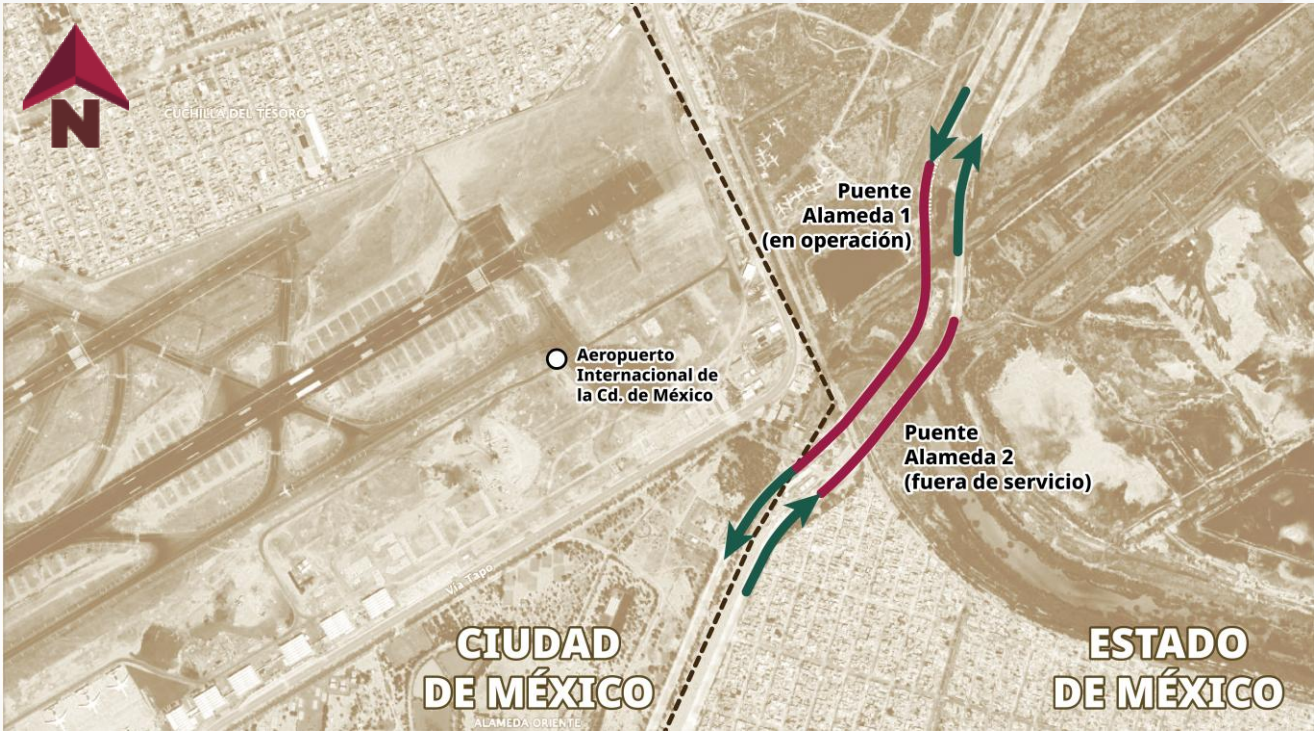

Construcción de dos Puentes en Alameda Oriente

(Interconexión con las Autopistas Mex 150D y Mex 136D)




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	05/dic/25 al 11/dic/25	
			Acumulado		Programado	Ejecutado
Estudios (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Proyectos (Puente 1 y 2)	1	Actividad	1	0	0	0
Demolición y retiro de estructura (Puente 2)	500	m	450	50	0	0
Desmantelamiento de postes de alumbrado (Puente 2)	18	Pzs	18	0	0	0
Desmantelamiento de señal tipo puente (Puente 1 y 2)	2	Pzs	2	0	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puente 2)	4,740.4	m3	4,169.54	570.86	0	0
Excavación en caminos de servicio (Puente 2)	58,115.16	m3	9,076.71	49,038.45	2,694.08	0
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 2)	42,615.03	m3	13,451.32	29,163.71	1,807.91	1,271.32
Construcción de tramos de pilotes de concreto y de acero (Puente 2)	1,892	Pzs	1,000	892	115.17	45
Hincado de pilotes de concreto y de acero (Puente 2)	1,892	Pzs	348	1,544	92.62	24
Excavación para desplante de Zapatas (Puente 2)	1,984.10	m3	0	1,984.1	23.62	0
Construcción de Zapatas (Puente 2)	3.00	Pzs	0	3	0	0
Excavación para desplante de Cajones (Puente 2)	1,984.10	m3	0	1,984.1	21.8	0
Construcción de Cajones (Puente 2)	8.00	Pzs	0	8	0	0
Construcción de Columnas (Puente 2)	11.00	Pzs	0	11	0	0
Construcción de Cabezales (Puente 2)	11.00	Pzs	0	11	0	0
Fabricación de trabes pretensadas (Puente 2)	44.00	Pzs	0	44	0	0
Traslado y montaje de trabes pretensadas (Puente 2)	44.00	Pzs	0	44	0	0
Fabricación de trabes de Acero (Puente 2)	3.00	Pzs	0	3	0	0
Traslado y montaje de trabes de Acero (Puente 2)	3.00	Pzs	0	3	0	0
Construcción de Losas de calzada (Puente 2)	10.00	Claros	0	10	0	0
Construcción de Guarnición, Parapeto y Banqueta (Puente 2)	960.00	m	0	960	0	0
Construcción de Accesos (Puente 2)	1.00	Accesos	0	1	0	0
Construcción de línea de alumbrado publico (Puente 2)	1.00	Línea	0	1	0	0
Señalamiento Horizontal y Vertical (Puente 2)	1.00	Lote	0	1	0	0
Despalme en caminos de servicio (Puente 1)	5,222.6	m3	4,546	676.6	0	0
Excavación en caminos de servicio (Puente 1)	64,026.84	m3	9,663	54,363.84	0	0
Mejoramiento con tezontle en caminos de servicio (Puente 1)	46,949.97	m3	12,180	34,769.97	0	0

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

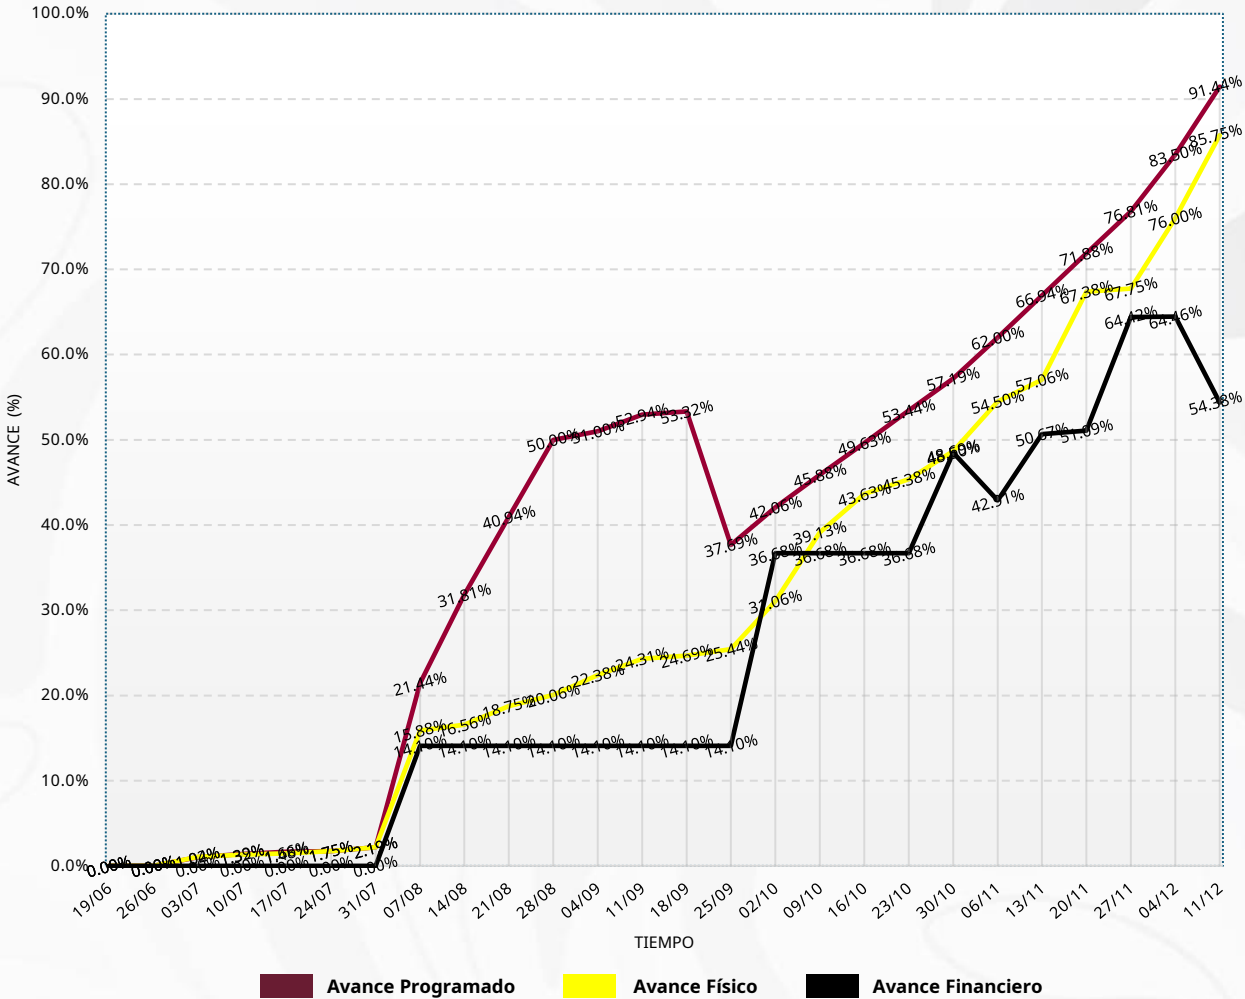

	Del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2025	Del 05 al 11 de diciembre de 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	70	70
Maquinaria	18	18
Frentes de trabajo	8	6
