

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco



Gobierno de
México


Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 17.58%
- Real: 28.41%
- Semanal: 2.58%
- Financiero: 20.7%

Avance 2025

- Programado: 73.5%
- Real: 94.7%
- Semanal: 1.7%
- Financiero: 60.1%

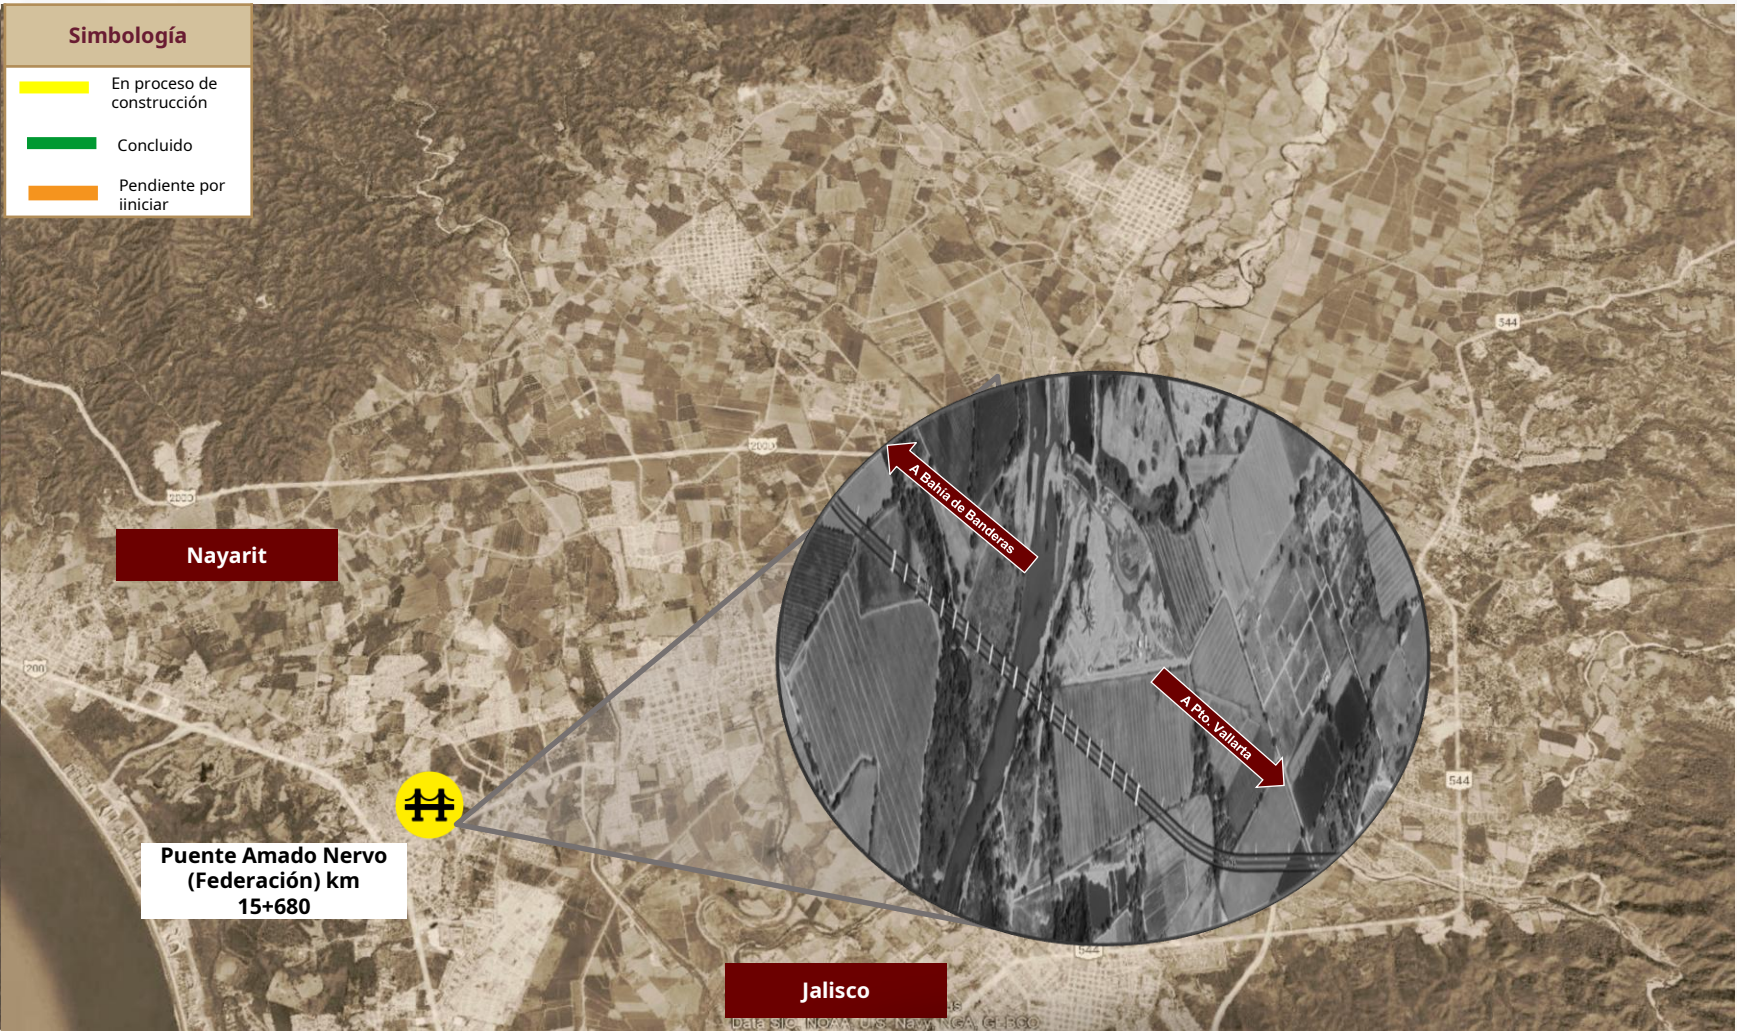

- Inversión total 2025-2026:** 900.0 mdp
Inversión 2025: 230.0 mdp | 0.6 km de Puente
- Meta total:** 1 Puente | 0.798 km
Accesos | 1.222 km
- Inicio:** 14 de julio de 2025
Término: Septiembre de 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre
- 479,471** habitantes beneficiados
- 2,700** empleos generados
- 25 min** ahorro en tiempo

Empresas

- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.

Puente Amado Nervo(Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 05 al 11/12/25		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	2.00	28.6%	5.00	5.00	0	Concluido lado Nayarit, se realiza desmonte lado Jalisco.
Despalme	m3	14,042.0	7,689.0	54.8%	6,353.0	3,176.50	0	Concluido lado Nayarit, se realiza despalme lado Jalisco
Cortes	m3	10,823.0	0	0.0%	10,823.0	5,411.50	0	
Terraplenes	m3	161,117.0	44,587	27.7%	116,530.0	3,807.30	1,866	Se continuan trabajos de pedraplén en lado Jalisco.
Base Estabilizada	m3	6,192.0	0	0.0%	6,192.0	0.00	0	
Losa de Concreto Hidráulico	m3	9,687.0	0	0.0%	9,687.0	0.00	0	
Losas de Acceso	m3	83.0	0	0.0%	83.0	0.00	0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	120	95.2%	6	3	3	Se tienen armados 9 pilotes adicionales
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	96	76.2%	30	3	13	Se tienen coladas 96 columnas
Cabezales	pza.	21	12	57.1%	9	1	2	Se tienen colados los cabezales de los apoyos 1, 2 y 12 al 21
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	20	12.5%	140	5	6	Se tienen coladas 14 trabes y se trabaja en los armados de 2 adicionales.
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	14	8.8%	146	8	6	
Losas y Diafragmas	m3	4,450.40	0	0.0%	4,450.40	0	0	
Parapeto y Guarnición	m	1,597.00	0	0.0%	1,597.00	0	0	
Obras de Drenaje	pza.	4.00	1	23.8%	3.05	2	1	Se realizó el acomodo de 22 cajones de concreto prefabricados.
PASOS SUPERIORES								
PSV's	pza.	2.00	1.1	55.0%	0.90	0.2	0	Se continua con el armado y colado de PSV lado Nayarit y PSV lado Jalisco.
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

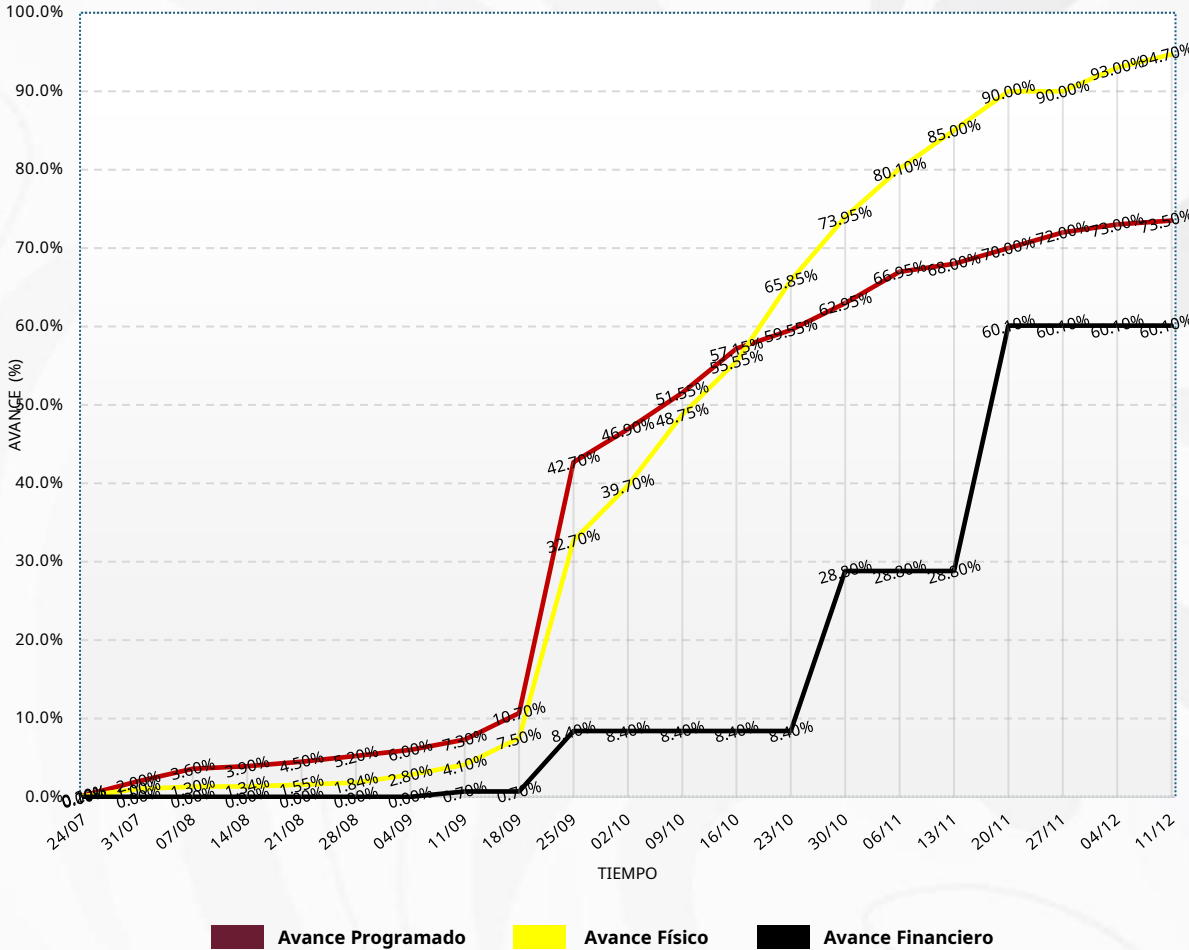

	28 de noviembre al 04 de Diciembre	05 al 11 de Diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	73	76
Maquinaria	19	19
Frentes de trabajo	5	5
