

# PSF Arco Sur

## Colima

**Avance global**

- Programado: 37.97%
- Real: 54.55%
- Semanal: 1.51%
- Financiero: 33.64%

**Avance 2025**

- Programado: 82.13%
- Real: 100.0%
- Semanal: 3.27%
- Financiero: 70.51%

 **Inversión total 2025-20265:** 575.4 mdp  
**Inversión 2025:** 227.4 mdp

 **Meta total:** 1.2 km (puente y accesos)  
**Meta 2025:** 0.55 km (**46% del puente (cimentación y subestructura)**)

 **Inicio:** 03-Julio de 2025  
**Término:** abril de 2026  
**Término meta 2025:** Diciembre 2025

 **157,048** habitantes beneficiados

 **1,431** empleos generados


 **15 min** ahorro en tiempo

| Tramo        | Empresas                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PSF Arco Sur | <ul style="list-style-type: none"><li>• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V</li><li>• Supervisión: DITAPSA CONSULTORES, S.A DE C.V</li></ul> |




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

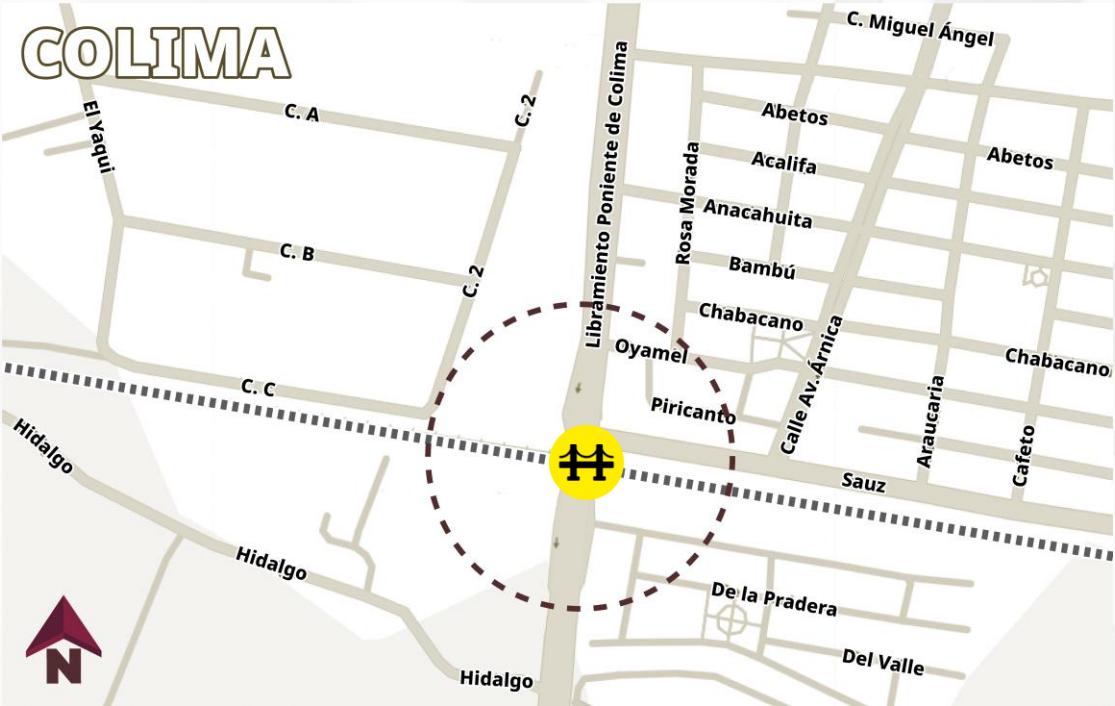

PSF Arco Sur  
Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

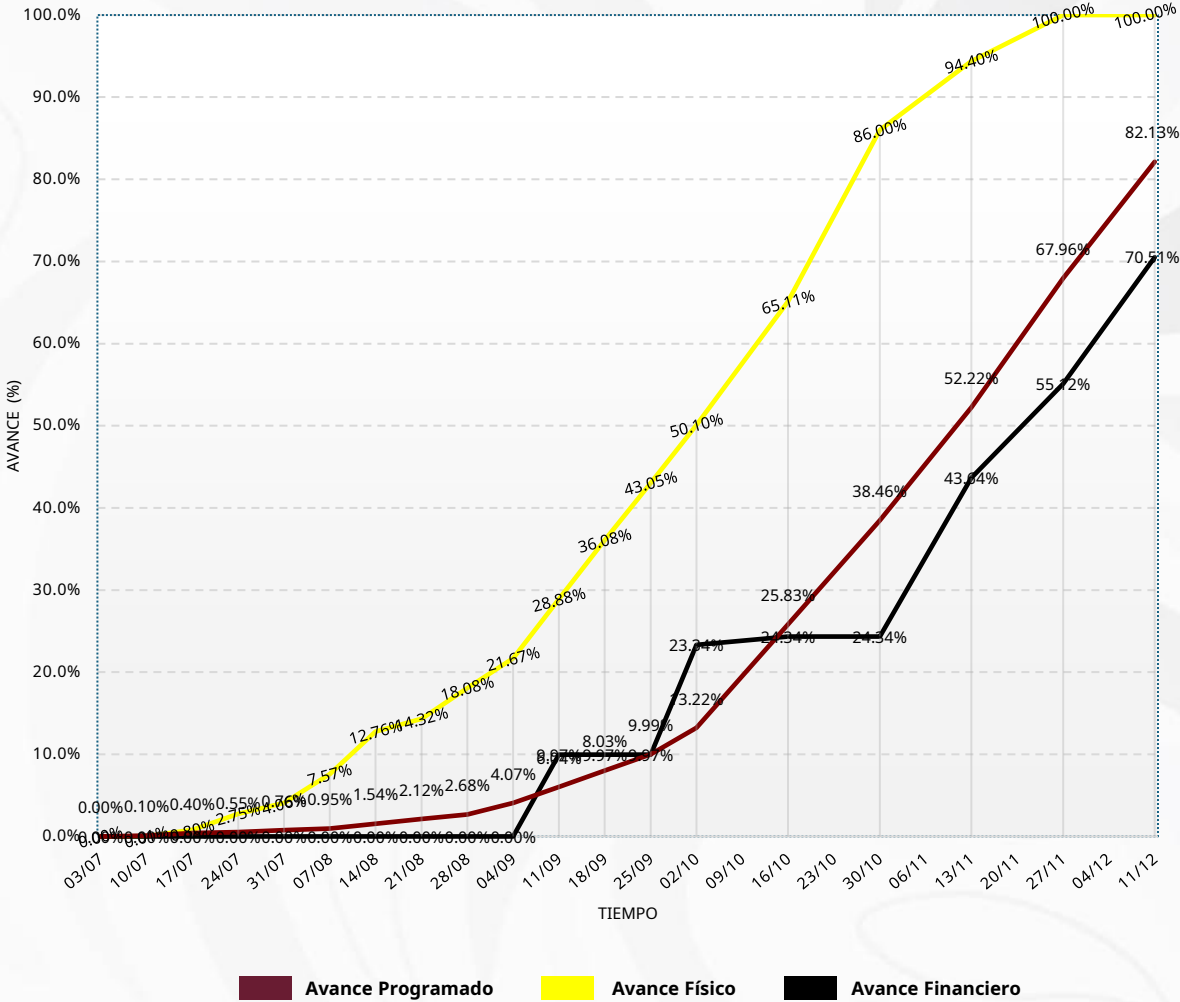

| Elemento                                   | Intervención | Ejecutado acumulado | Faltante | 05/12/25 al 11/12/25 |           | Observaciones      |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------|----------|----------------------|-----------|--------------------|
|                                            |              |                     |          | Programado           | Ejecutado |                    |
| Trabajos diversos (pzs)                    | 254.0        | 127.68              | 126.32   | 2.24                 | 8.63      |                    |
| Reubicación de obras inducidas (m)         | 2,477.55     | 2, 322.01           | 155.54   | 16.68                | 0.00      |                    |
| Construcción de cruce prov. FFCC (pza)     | 223.00       | 219.44              | 3.56     | 4.18                 | 2.87      |                    |
| Losa plana para mantenimiento CONAGUA (m3) | 80.03        | 0.00                | 80.03    | 0.00                 | 0.00      |                    |
| SUBESTRUCTURA PUENTE LATERAL               |              |                     |          |                      |           |                    |
| Pilas (pza)                                | 4.00         | 4.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | Partida concluida. |
| Cabezales (pza)                            | 2.00         | 2.00                | 0.00     | 0.00                 | 0.00      | Partida concluida. |
| Accesos (m3)                               | 210.02       | 12.45               | 197.57   | 3.76                 | 0.00      |                    |
| Superestructura puente lateral (pza)       | 4.00         | 4.00                | 0.00     | 0.41                 | 0.00      | Partida concluida  |
| Adecuación lateral no. 1 (m3)              | 994.56       | 962.25              | 32.31    | 12.13                | 0.00      |                    |
| Adecuación lateral no. 2 (m3)              | 790.42       | 737.76              | 52.66    | 62.55                | 0.00      |                    |
| Accesos al PSF (m)                         | 896.00       | 218.82              | 677.18   | 6.48                 | 6.04      |                    |

|                              | 28 de noviembre de al 04 de diciembre | 05 al 11 de diciembre |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 268                                   | 268                   |
| Maquinaria                   | 55                                    | 59                    |
| Fuerza de trabajo            | 13                                    | 13                    |
