

Puente El Chical

Colima


Avance global

• Programado: 18.01 %	• Semanal: 2.46 %
• Real: 65.79 %	• Financiero: 19.67 %

Avance 2025

• Programado: 79.00 %	• Semanal: 10.79 %
• Real: 100.00 %	• Financiero: 86.27 %

-  **Inversión total 2025-2026:** 110 mdp
Inversión 2025: 20.6 mdp
-  **Meta total:** 0.736 km
Meta 2025: 24.0 % del Puente
-  **Fecha de inicio:** 11 de agosto, 2025
Fecha de término: Marzo, 2026
Termino meta 2025: 31 de diciembre, 2025
-  **4,053** habitantes beneficiados
-  **330** empleos generados
-  **15 min** ahorro en tiempo

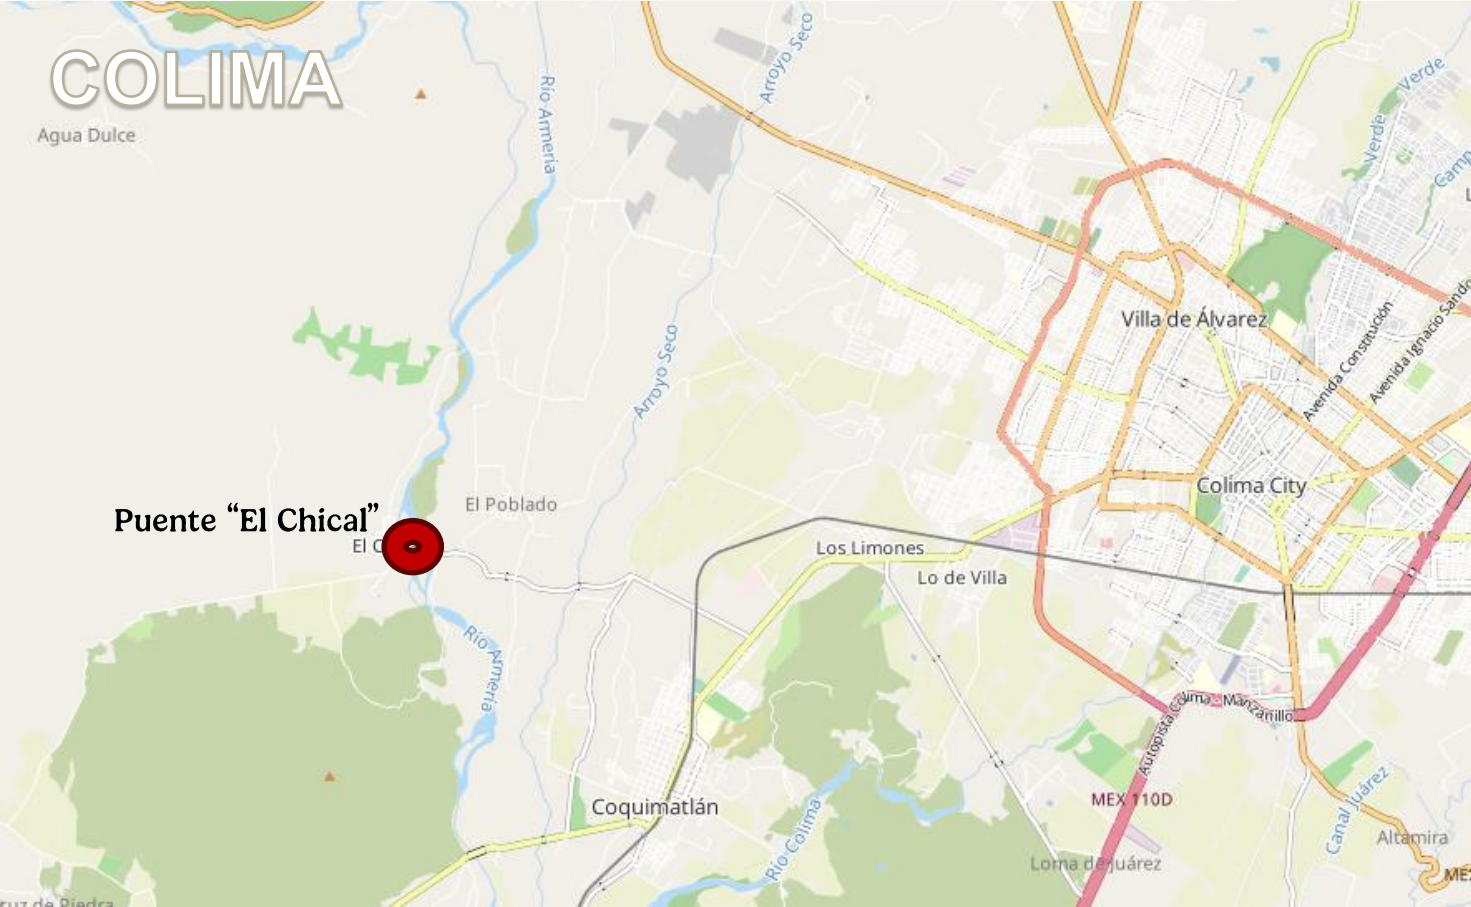


Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	• Contratista: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATLACOMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERIA, S.A DE C.V

Puente El Chical

Colima

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	05/12/25 al 11/12/25	
				Programado	Ejecutado
Resumen de Obra					
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0
Pilas de cimentación (Pza)	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0
Columnas (Pza)	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	37.0	8.0	8.00	0.0
Montaje de trabes (Pza)	45.0	16.0	29.0	10.00	10.0
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	72.0	576.0	72.0	72.0
Carpeta Asfáltica (m3)	166.8	0.0	166.8	0.0	0.0
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	0.0	720.0	0.0	0.0
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	125,000.0	0.0	6,000.0	6,000.0

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

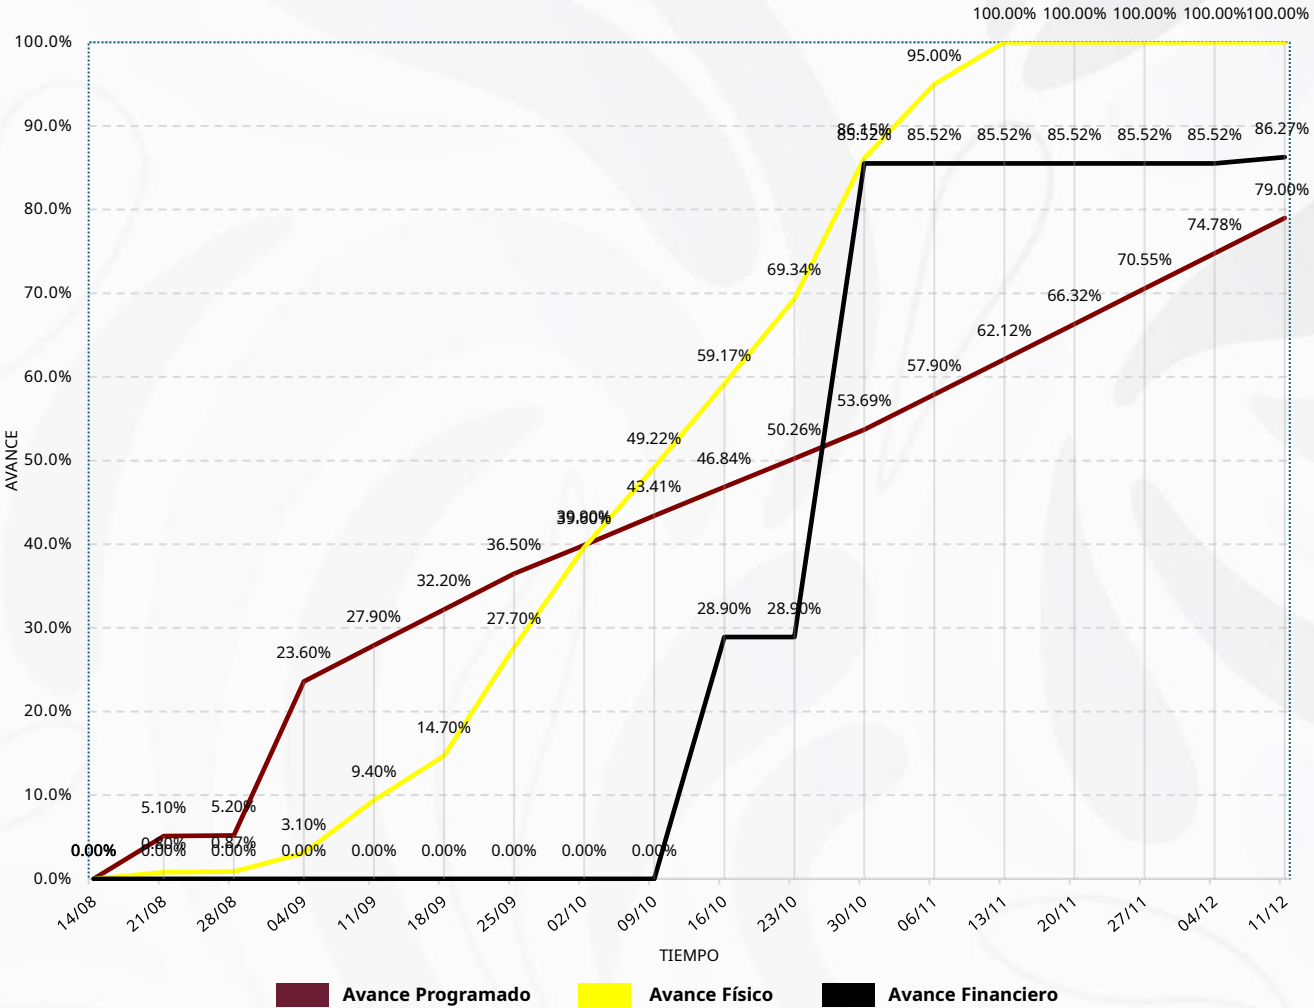

	28 de Noviembre al 04 de Diciembre	05 de Diciembre al 11 de Diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	31	31
Maquinaria	5	5
Frentes de trabajo	5	5
