

# Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes


### Avance global

- Programado: 40.0%
- Real: 28.2%
- Semanal: 2.92%
- Financiero: 17.91%

### Avance 2025

- Programado: 98.5%
- Real: 70.5%
- Semanal: 7.2%
- Financiero: 45.62%

**Convenio de reprogramación SICT 6.29-303-2396-2025**

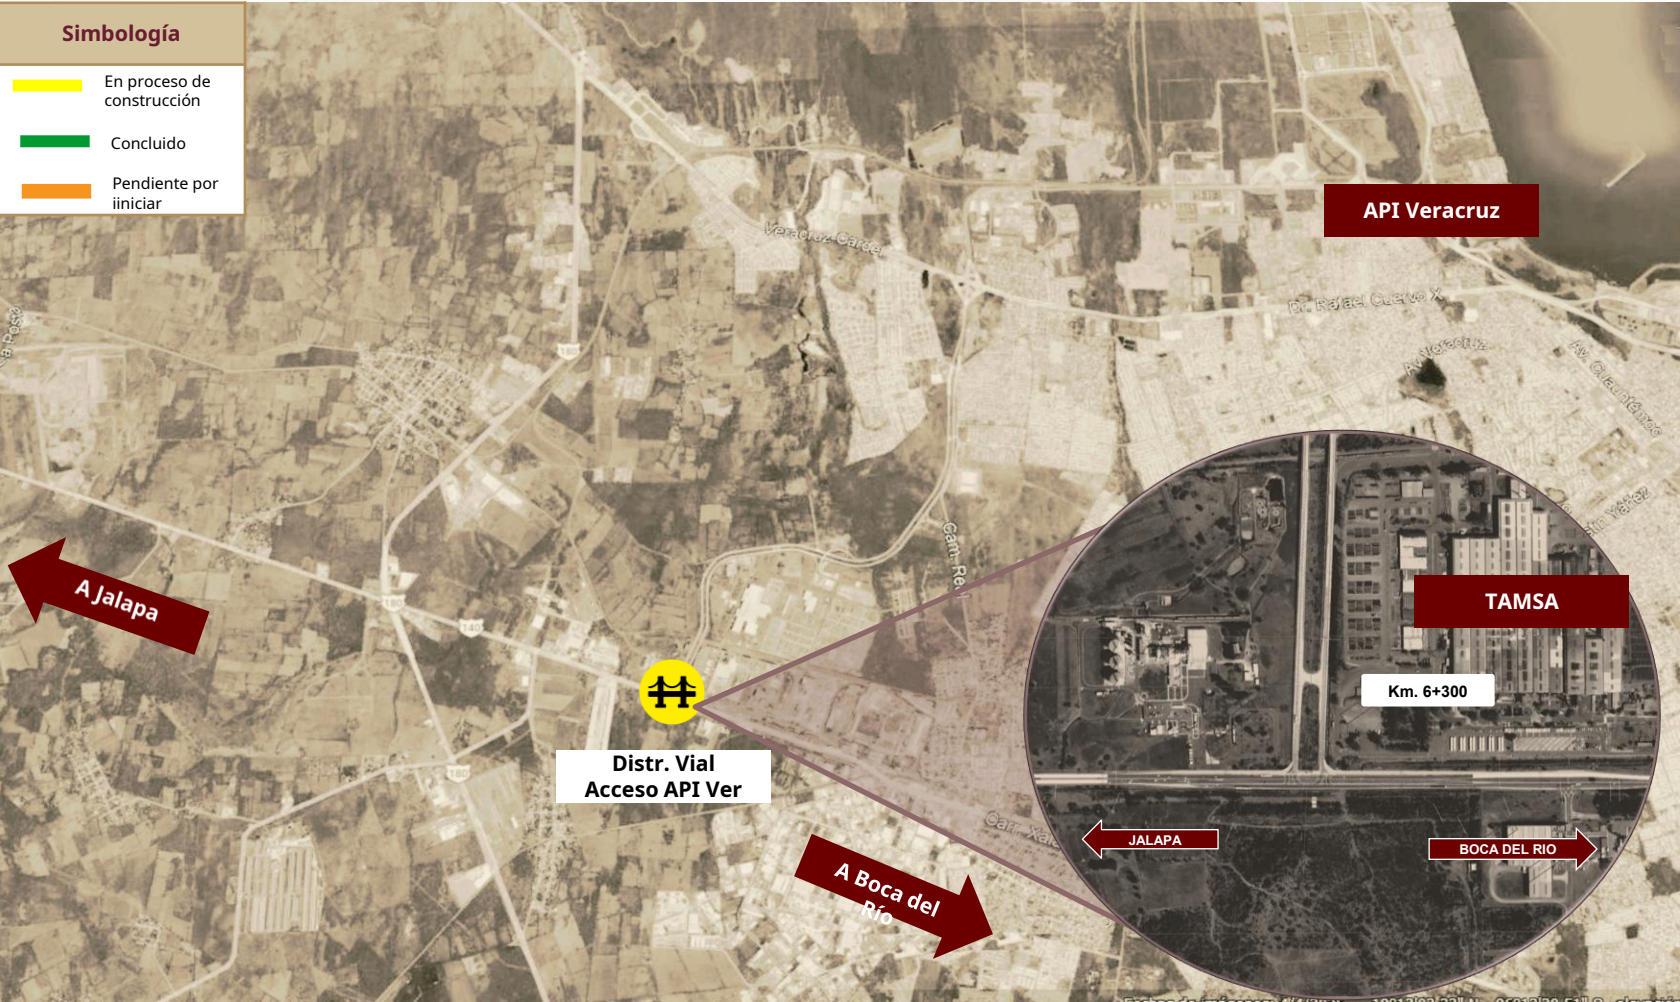

**Inversión total 2025-2026: 840 mdp**  
**Inversión 2025:** 326 mdp | 0.78 km de PSV

**Meta total 2025-2026: 1.97 km**  
1 PSV: 0.872 km  
Accesos: 0.532 km  
Transiciones: 0.566 km

**Inicio:** 14 de julio de 2025  
**Término:** junio de 2026  
**Termino meta 2025:** Diciembre

**780,441** habitantes beneficiados

**2,235** empleos generados

**25 min** ahorro en tiempo

### Empresas

- **Contratista:** ALZ Construcciones S.A. de C.V.
- **Supervisión:** GV Ingeniería, S.A. de C.V.

# Distribuidor Vial al Puerto de Veracruz

Veracruz, Ver. (Carretera Fed. MEX-140 Xalapa – Veracruz)

## Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

### Cuerpo B (programa 2025)

| Elemento                        | Unidad | Volumen<br>Total | Ejecutado<br>Acumulado | Faltante | Ejecutado del 05 al<br>11/12/25 |           | Observaciones |                                                                        |
|---------------------------------|--------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                 |        |                  |                        |          | Programado                      | Ejecutado |               |                                                                        |
| TERRACERÍAS                     |        |                  |                        |          |                                 |           |               |                                                                        |
| Desmonte                        | Ha     | 4.10             | 4.10                   | 100%     | 0.00                            | 0.00      | 0.0           | Concluido en el cpo B                                                  |
| Despalme                        | m³     | 7,213.00         | 7,213                  | 100.0%   | 0.00                            | 622.50    | 0.5           | Concluido en el cpo B                                                  |
| Obra Inducida                   | Lote   | 1                | 0                      | 0        | 1                               | 0.00      | 0.0           |                                                                        |
| Excavaciones                    | m³     | 52,059.00        | 36,571.0               | 70.2%    | 15,488.00                       | 15,488.00 | 0.0           |                                                                        |
| Terraplenes                     | m³     | 36,650.00        | 27,530.0               | 75.1%    | 9,120.00                        | 12,051.00 | 2,931.0       | Se continúa con la formación de la subrasante del km 94+200 al 94+500. |
| Muro Mecánicamente Estabilizado | m³     | 1,531.00         | 0                      | 0.0%     | 1,531.00                        | 765.50    | 0.0           |                                                                        |
| Terraplenes en Rampa            | m³     | 4,384.00         | 0                      | 0.0%     | 4,384.00                        | 2,192.00  | 0.0           |                                                                        |
| Pavimentos asfálticos           | m³     | 3,090.00         | 0                      | 0.0%     | 3,090.00                        | 1,030.00  | 0.0           |                                                                        |
| Paraderos                       | pza.   | 1                | 0                      | 0.0%     | 1                               | 0.00      | 0.0           |                                                                        |
| INFRAESTRUCTURA                 |        |                  |                        |          |                                 |           |               |                                                                        |
| Pilotes                         | pza.   | 132              | 132                    | 100.0%   | 0                               | 0         | 0.0           | Concluida la construcción de pilotes del cpo B                         |
| Zapatas                         | pza.   | 21               | 21                     | 100.0%   | 0                               | 0         | 0.0           | Concluida la construcción de zapatas del cpo B                         |
| SUBESTRUCTURA                   |        |                  |                        |          |                                 |           |               |                                                                        |
| Columnas (pza)                  | pza.   | 21               | 21                     | 100.0%   | 0                               | 0         | 0.0           | Se concluyó la construcción de columnas del cpo B                      |
| Cabezales                       | pza.   | 23               | 23                     | 100.0%   | 0                               | 2         | 1.0           | Concluida la construcción de cabezales                                 |
| SUPERESTRUCTURA                 |        |                  |                        |          |                                 |           |               |                                                                        |
| Trabes tipo AASHTO VI           | pza.   | 132              | 69                     | 52.3%    | 63                              | 24        | 9.0           | Se tienen 43 trabes concluidas y 5 trabes adicionales con armado       |
| Montaje de trabes               | pza.   | 132              | 60                     | 45.5%    | 72                              | 11        | 18.0          | Se tienen 2 claros del cpo B con trabes montadas.                      |
| Diafragmas                      | pza.   | 110              | 30                     | 27.3%    | 80                              | 14        | 10.0          |                                                                        |
| Losa (claro)                    | pza.   | 22.00            | 6                      | 27.3%    | 16                              | 4         | 2.0           | En proceso de colocón de cimbra, el claro 22-23 del cpo B              |

