

# PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

## Sinaloa



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

### Avance global

- Programado: 35.7%
- Real: 65.1%
- Semanal: 2.4%
- Financiero: 45.31%

### Avance 2025

- Programado 91%
- Real: 98.7%
- Semanal: 2.2%
- Financiero: 80.67%



**Inversión total 2025-2026:** 380.0 mdp  
**Inversión 2025:** 225.0 mdp | (66% de PSV)



**Meta total:** 1 PSV | 0.811 km longitud total



**Inicio:** 18 de agosto de 2025  
**Término:** abril 2026  
**Término meta 2025:** Diciembre




**862,037** Habitantes beneficiados



**1,140** empleos generados



**20 min** ahorro en tiempo

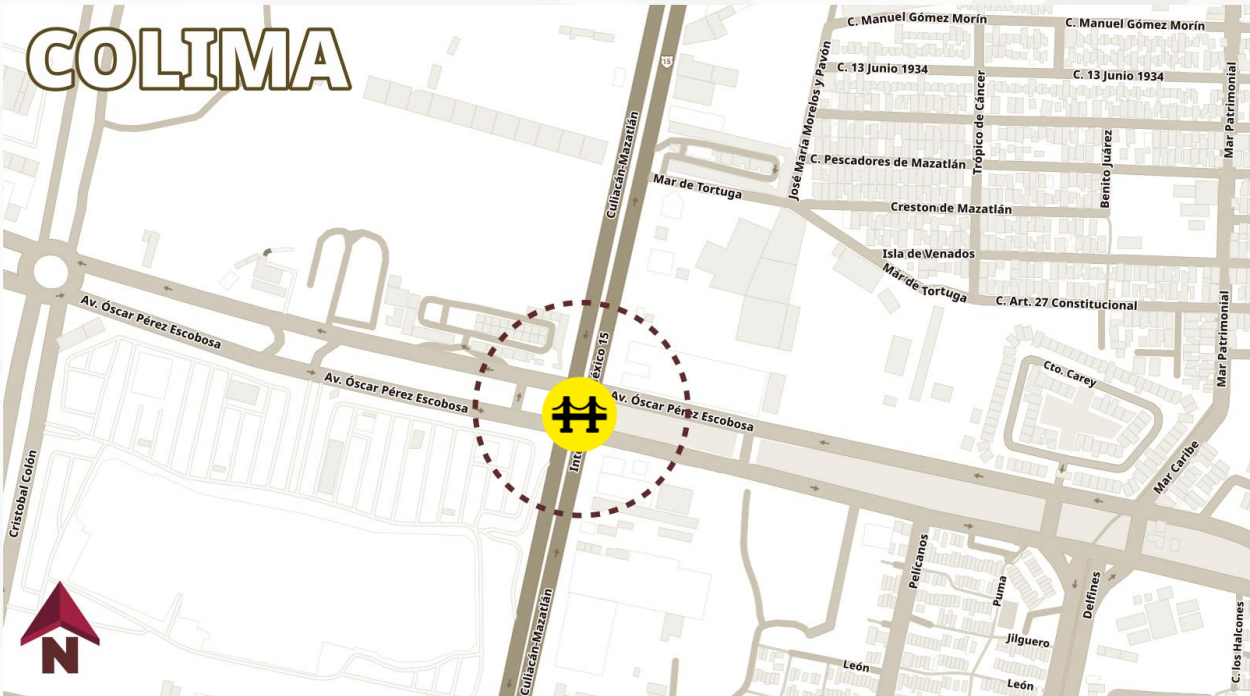


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

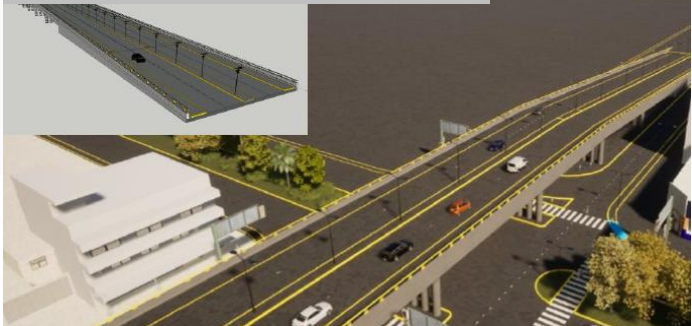

Proyecto


### Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

# PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez

## Sinaloa

### Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

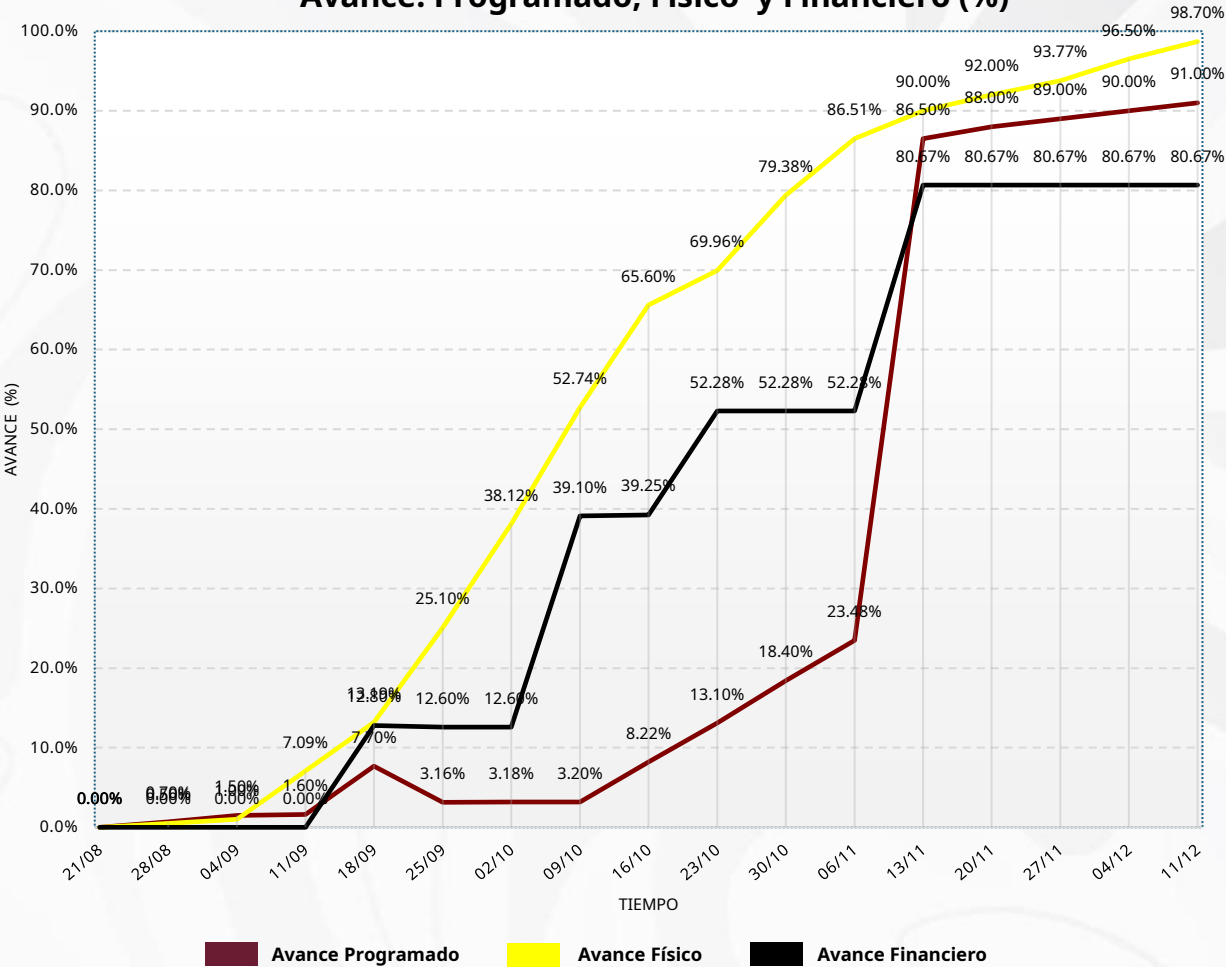

| Elemento                                                  | Unidad    | Volumen Total | Ejecutado Acumulado | Faltante | Ejecutado del 05 al 11/12/25 |           | Observaciones |                                                |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------|
|                                                           |           |               |                     |          | Programado                   | Ejecutado |               |                                                |
| PRECIO ALZADO                                             |           |               |                     |          |                              |           |               |                                                |
| Estudios y Proyecto Ejecutivo                             | Actividad | 2             | 1.9                 | 95.0%    | 0.1                          | 0.1       | 0.0           | Falta proyecto de semaforización y diseño      |
| Cimentación                                               | Apoyo     | 9             | 9                   | 100.0%   | 0.0                          | 0         | 0.0           | Concluido                                      |
| Columnas y Cabezales                                      | Apoyo     | 9             | 9                   | 100.0%   | 0.0                          | 0         | 0.0           | Concluido                                      |
| Superestructura                                           | Actividad | 77            | 77                  | 100.0%   | 0                            | 0         | 0.0           | Concluido                                      |
| Fabricación de Trabes AASHTO IV                           |           |               |                     |          |                              |           |               |                                                |
| Superestructura                                           | pieza     | 77            | 77                  | 100.0%   | 0                            | 2         | 0.0           |                                                |
| Montaje de Trabes AASHTO IV                               |           |               |                     |          |                              |           |               |                                                |
| Superestructura                                           | pieza     | 11            | 11                  | 100.0%   | 0                            | 1         | 0.0           |                                                |
| Fabricación de Trabes Nebrazka                            |           |               |                     |          |                              |           |               |                                                |
| Superestructura                                           | pieza     | 11            | 11                  | 100.0%   | 0                            | 3         | 10.0          | Se continúan los trabajos de fabricación       |
| Montaje de Trabes Nebrazka NU240                          |           |               |                     |          |                              |           |               |                                                |
| Muro Mecánicamente estabilizado (Frabricacion de Escamas) | m2        | 1,365         | 1,365.0             | 100.0%   | 0.0                          | 0.0       | 0.0           | Concluido                                      |
| Muro Mecánicamente estabilizado (Colocacion de Escamas)   | m2        | 1,365         | 1,250.0             | 91.6%    | 115                          | 227.5     | 218.0         | Se continúan trabajos de colocación de escamas |
| Muro Mecánicamente estabilizado Relleno                   | m3        | 12,940        | 9,348               | 72.2%    | 3,592                        | 1,091.3   | 4,387.9       | Se continua con los trabajos de relleno        |
| Losa de concreto Hidráulico                               | pieza     | 3             | 1                   | 33.3%    | 2                            | 0         | 1.0           | Se inicio con el armado de acero de refuerzo   |
| Pavimento de concreto Hidráulico                          | Actividad | 2             | 0                   | 0.0%     | 2                            | 0         | 0.0           |                                                |
| Alumbrado                                                 | Actividad | 2             | 0                   | 0.0%     | 2                            | 0         | 0.0           |                                                |
| Señalamiento                                              | Actividad | 2             | 0                   | 0.0%     | 2                            | 0         | 0.0           |                                                |
| Semaforización                                            | Actividad | 1             | 0                   | 0.0%     | 1                            | 0         | 0.0           |                                                |
| PRECIO UNITARIO                                           |           |               |                     |          |                              |           |               |                                                |
| Terraplenes                                               | m3        | 5,032.0       | 0                   | 0.0%     | 5,032.00                     | 0         | 0             |                                                |
| Base Hidráulilca                                          | m3        | 3,992.0       | 0                   | 0.0%     | 3,992.00                     | 0         | 0             |                                                |
| Riego de impregnación                                     | m2        | 20,330.0      | 0                   | 0.0%     | 20,330.00                    | 0         | 0             |                                                |
| Fresado de superficie                                     | m2        | 23,420.0      | 0                   | 0.0%     | 23,420.00                    | 0         | 0             |                                                |
| Banqueta                                                  | m2        | 6,922.0       | 0                   | 0.0%     | 6,922.00                     | 0         | 0             |                                                |
| Relleno                                                   | m3        | 692.0         | 0                   | 0.0%     | 692.00                       | 0         | 0             |                                                |

|                    | Del 28 de noviembre al 04 de Diciembre | Del 05 de Diciembre al 11 de Diciembre |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| D                  | 171                                    | 167                                    |
| Maquinaria         | 32                                     | 28                                     |
| Frentes de trabajo | 11                                     | 11                                     |
