

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Avance global

• Programado: 26.03%

• Real: 31.91%

• Semanal: 0.61%

• Financiero: 15.20%

Avance 2025

• Programado: 100.00%

• Real: 100.00%

• Semanal: 4.36%

• Financiero: 100.00%

 Inversión total 2025-2026: 650 mdp

Inversión 2025: 100 mdp | 14% de 1 Distribuidor Vial

 Meta total: 1 Distribuidor | 1.204 km (0.654 km estructura, 0.177 km rampa de entrada, 0.118 km rampa salida y 0.255 km fresado y carpeta en accesos)

 Inicio: 16 de julio de 2025

Término: mayo de 2026


Termino meta 2025: 31 de diciembre

 73,215 habitantes beneficiados

 1,950 empleos generados


 20 min ahorro en tiempo

• Nota: La meta establecida para el 2025 (14 % de Distribuidor) ya se cumplió, sin embargo se siguen ejecutando trabajos que aumentan la meta global.

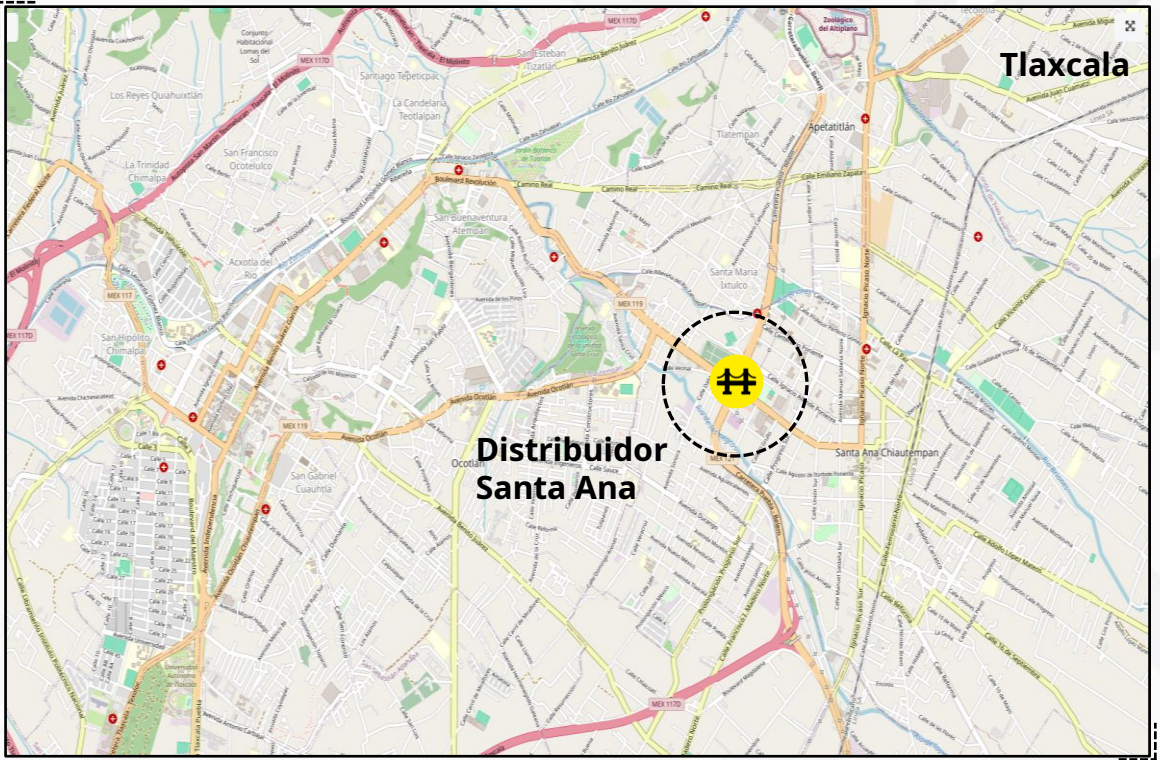

Distribuidor Vial Santa Ana Tlaxcala

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

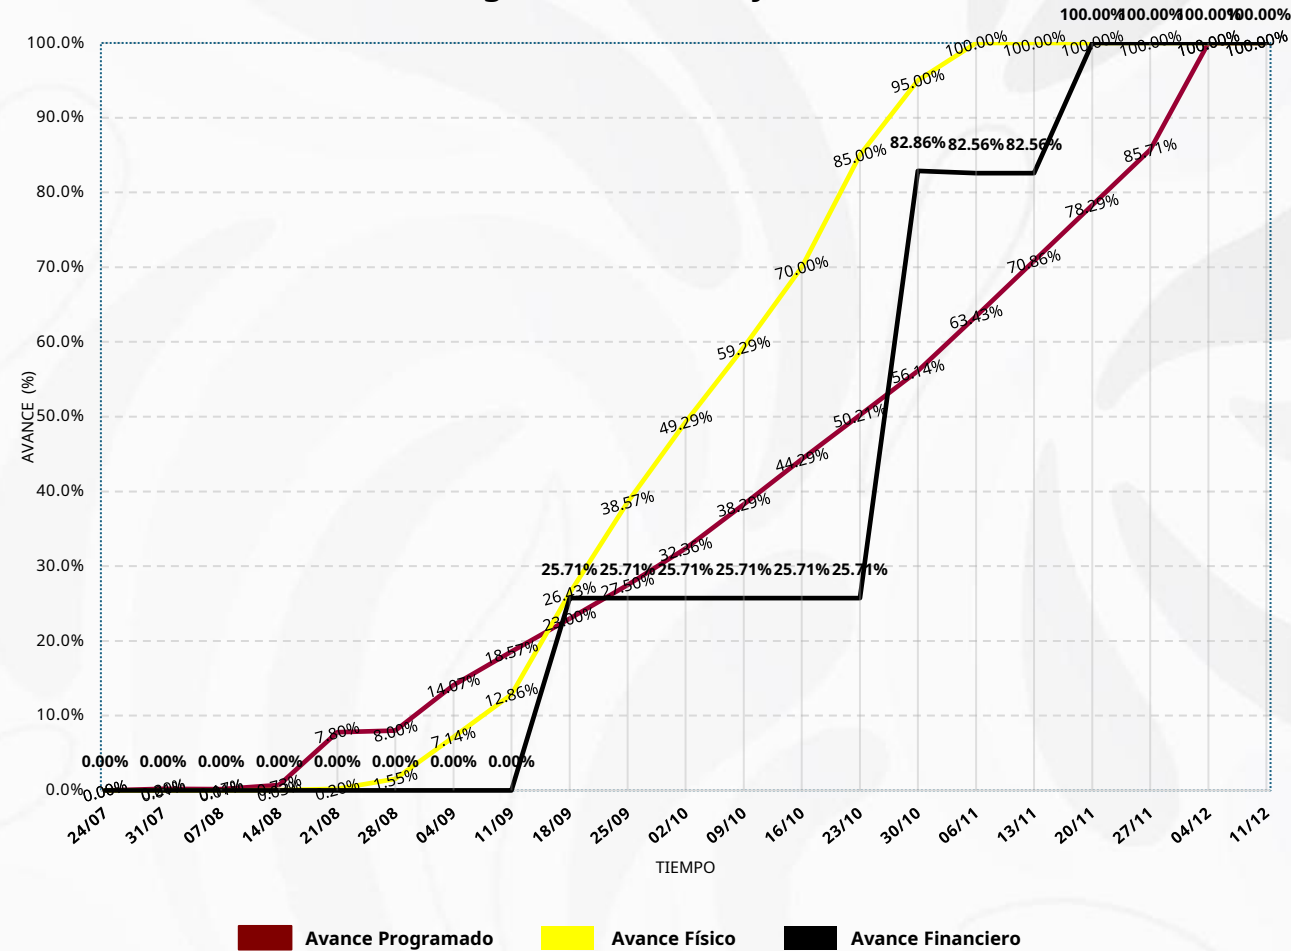

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	05 al 11-12-25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Distribuidor Vial	14% de 1 Distribuidor Vial	31.91% del 14% de 1 Distribuidor Vial	0.0% del 14% de 1 Distribuidor Vial	0.51%	0.61%	Se trabaja en cabezales eje 1 y 15; así como columnas #4,5 y 7 al #9.

	28 de noviembre al 04 de diciembre	05 al 12 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	115	109
Maquinaria	12	13
Frente de trabajo	14	13

Programa de Obra



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

