


Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

Avance global

- Programado: 52.23%
- Real: 78.98%
- Semanal: 1.1%
- Financiero: 53.5%

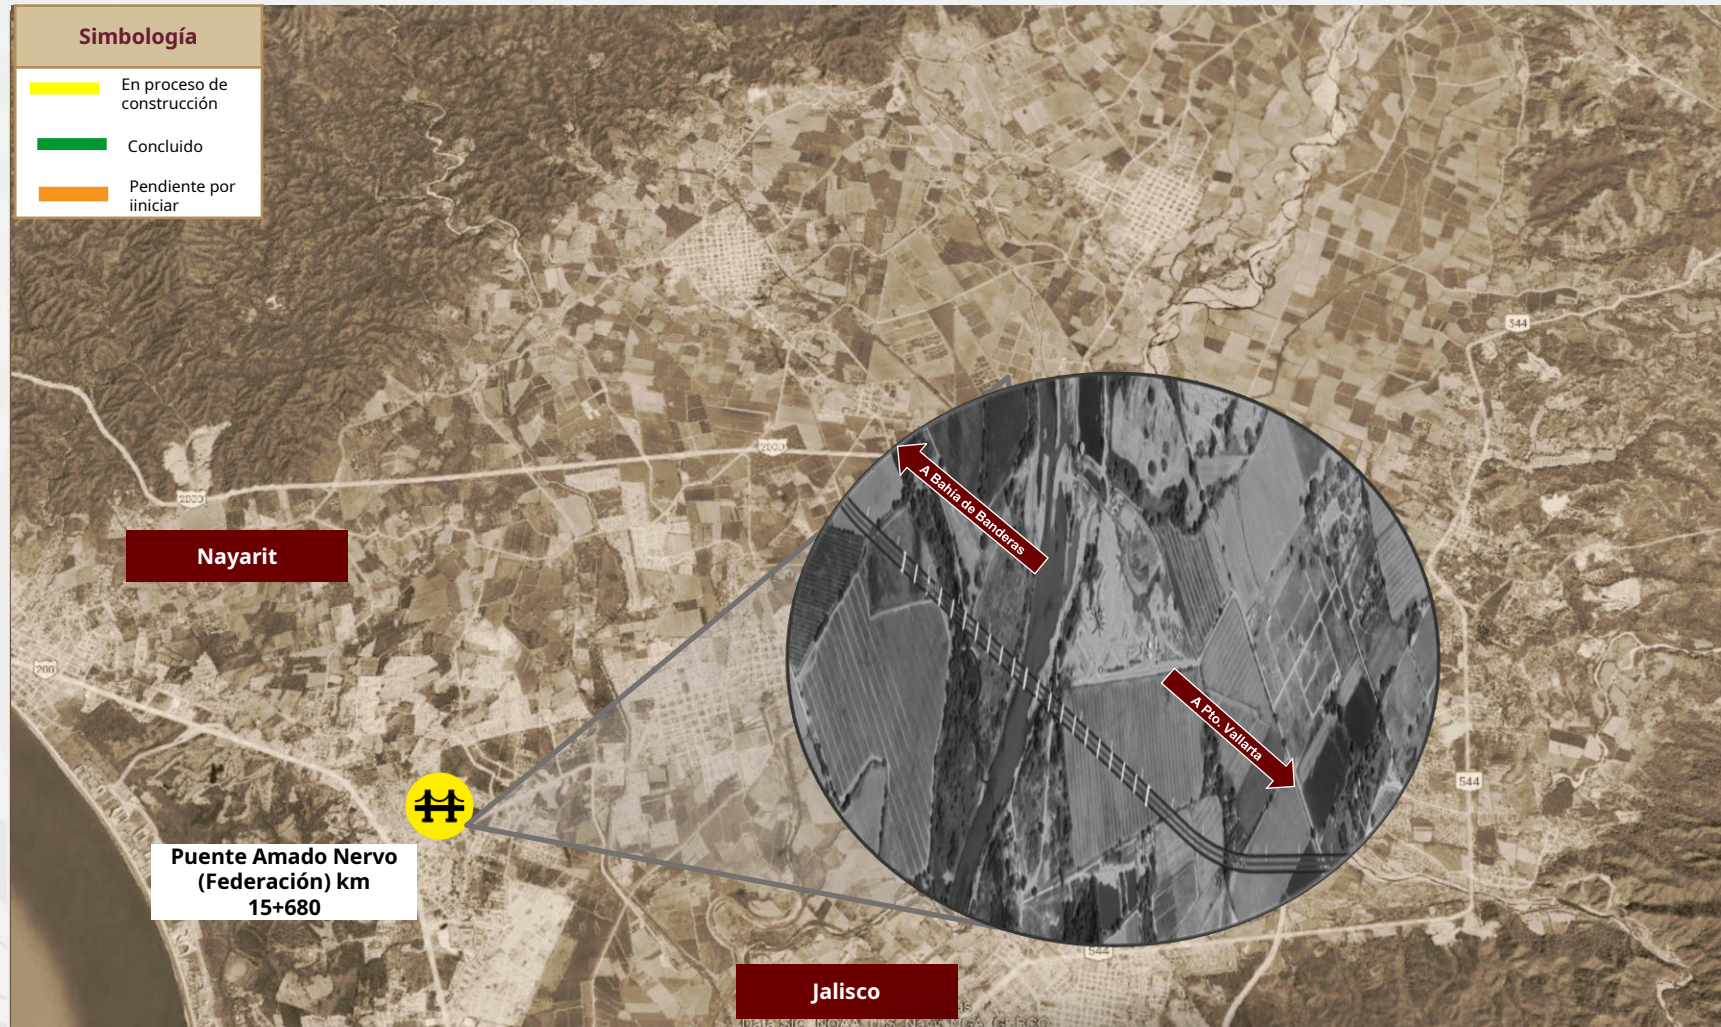

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

De acuerdo al cierre de SHCP 2025



Inversión total 2025-2026: 898.9 mdp

Meta total: 1 Puente | 0.798 km

Accesos | 1.222 km



Inversión 2025: 198.9 mdp

Meta 2025: 0.7 km de Puente

Inversión 2026: 700.0 mdp

Meta 2026: 1.32 km



Inicio: 14 de julio de 2025

Término: Julio de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026

479,471 habitantes beneficiados



2,790 empleos generados



25 min ahorro en tiempo



Beneficios

Se crea una vía alterna que permita agilizar el tránsito de vehículos que tienen como origen o destino la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

Construcción de un puente de 2.02 km de longitud para alojar 6 carriles de circulación.

Empresas


- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 22 al 28/05/2026		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	2.00	28.6%	5.00	5.00	0	Se tienen detenidas las actividades de accesos.
Despalme	m3	14,042.0	13,099.0	93.3%	943.0	943.00	0	Se reanuda parcialmente el despalme.
Cortes	m3	10,823.0	3,916.0	36.2%	6,907.0	6,907.00	0	Sin actividades
Terraplenes	m3	161,117.0	124,025.0	77.0%	37,092.0	2,318.30	4,040	Se tienen detenidas las actividades.
Base Estabilizada	m3	6,192.0	0	0.0%	6,192.0	309.60	0	Sin actividades
Carpeta de Concreto Hidráulico	m3	9,687.0	0	0.0%	9,687.0	484.80	0	Sin actividades
Losas de Acceso	m3	83.0	0	0.0%	83.0	11.00	0	Sin actividades
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	126	100.0%	0	-	-	Concluidos
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	126	100.0%	0	-	-	Concluidos
Cabezales	pza.	21	21	100.0%	0	-	-	Concluidos
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	160	100.0%	0	-	-	Concluidos
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	160	100.0%	0	-	-	Concluidos
Losas y Diafragmas	m3	4,918.0	4,695.6	95.5%	222.40	222	201	Se tienen coladas 7 losas y 29 líneas de disfragmas
Parapeto	m	1,597.0	0	0.0%	1,597.00	399	0	Sin actividades
Guarnición	m	1,591.0	0	0.0%	1,591.00	0	0	Sin actividades
Obras de Drenaje	pza.	4.0	2.4	60.0%	1.60	2	0	Sin actividades
PASOS SUPERIORES								
PSV's	pza.	2.0	1.7	85.0%	0.30	0.3	0	Se continua con el armado y colado de PSV lado Nayarit y PSV lado Jalisco.
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.0	0	0.0%	1.00	0	0	Sin actividades
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.0	0	0.0%	1.00	0	0	Sin actividades
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.0	0	0.0%	1.00	0	0	Sin actividades

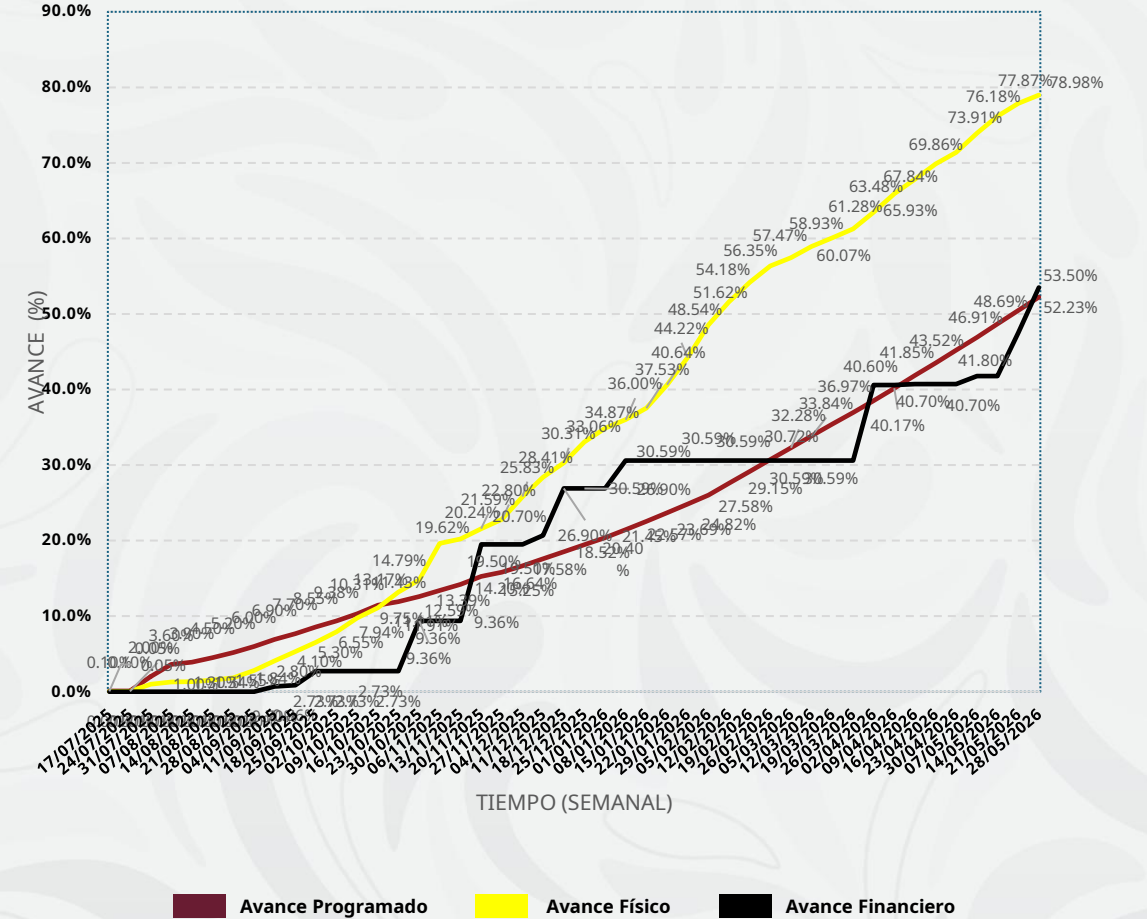

	15 de Mayo al 21 de Mayo	22 de Mayo al 28 de Mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	126	95
Maquinaria	30	30
Frentes de trabajo	6	6
