

PSF Epitacia Zamora Teodoro (Arco Sur) Colima



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 100.0%
- Real: 100.0%
- Semanal: 0.01%
- Financiero: 75.64%



Inversión total 2025-2026: 630 mdp
Meta total: 862 m (puente y accesos)



Inversión 2025: 230.23 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*
Meta 2025: 0.68 km (56.55% del puente (subestructura y accesos))
Inversión 2026: 399.77 mdp
Meta 2026: 0.52 km (43.45% del puente (superestructura y accesos))



Inicio: 03-Julio de 2025
Término: Mayo de 2026
Término meta 2025: Diciembre
Término meta 2026: 25 de mayo



157,048 habitantes beneficiados



1,890 empleos generados




15 min ahorro en tiempo

Beneficios Reducción de tiempos de traslado al poder realizar el cruce de las vías del tren, evitando tiempos de espera prolongados y “cuellos de botella”, así mismo, permitiendo agilizar el tránsito local.

Paso superior con 2 cuerpos y 3 carriles por sentido

Tramo	Empresas
PSF Epitacia Zamora Teodoro	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: 2026 NO SE CUENTA CON SUPERVISIÓN, CONTRATO 2025 FINALIZADO 31-DIC-2025

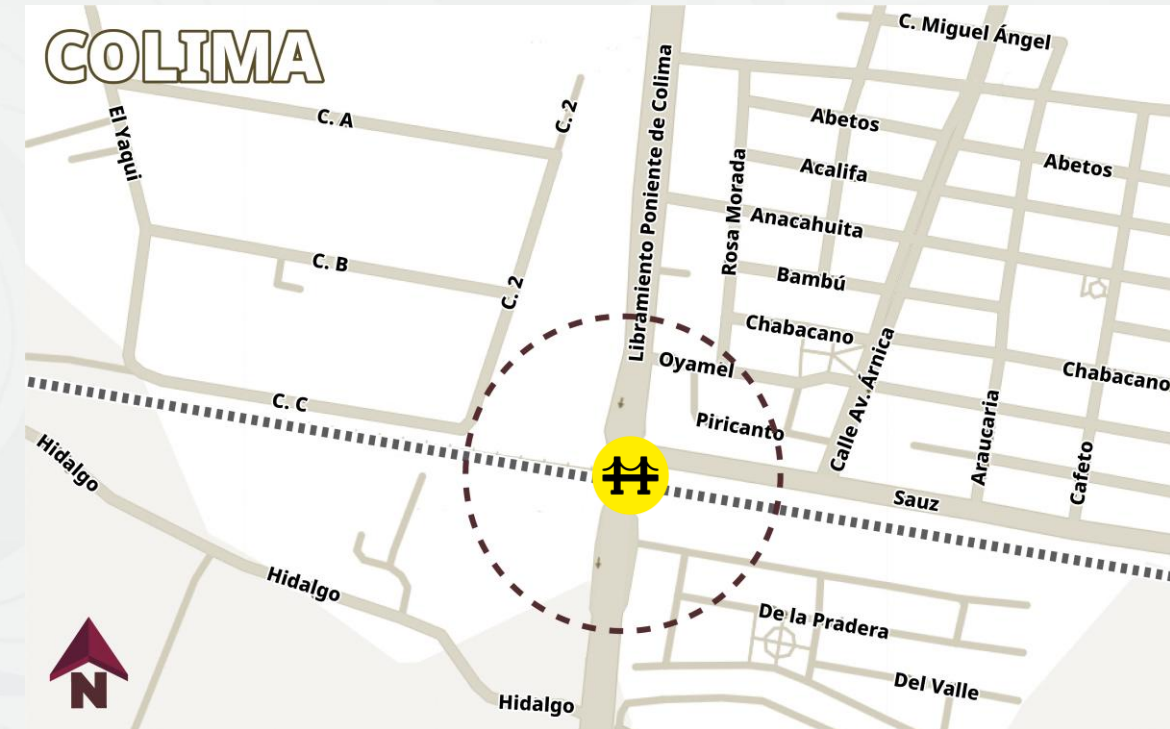


PSF Epitacia Zamora Teodoro (Arco Sur)

Colima



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	22/05/2026 al 28/05/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos (pzs)	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Reubicación de obras inducidas (m)	2,477.55	2,477.55	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Construcción de cruce prov. FFCC (pza)	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Puente lateral (pza)	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida.
Adecuación lateral no. 1 (m3)	994.56	994.56	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Adecuación lateral no. 2 (m3)	790.42	790.42	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Accesos al PSF						
Terracerías (m3)	7,319.03	7,319.03	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Base Hidráulica (m3)	5,568.82	5, 568.82	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Carpeta asfáltica (m3)	1,909.32	1909.32	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Muros MME						
Muro MME (m2)	2,842.74	2,842.74	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Carpeta asfáltica (m3)	1,402.30	1,402.30	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Guarnición MME (m)	944.47	944.47	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Subestructura PSF						
Pilas (pza)	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Zapatas (pza)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Columnas (pza)	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida

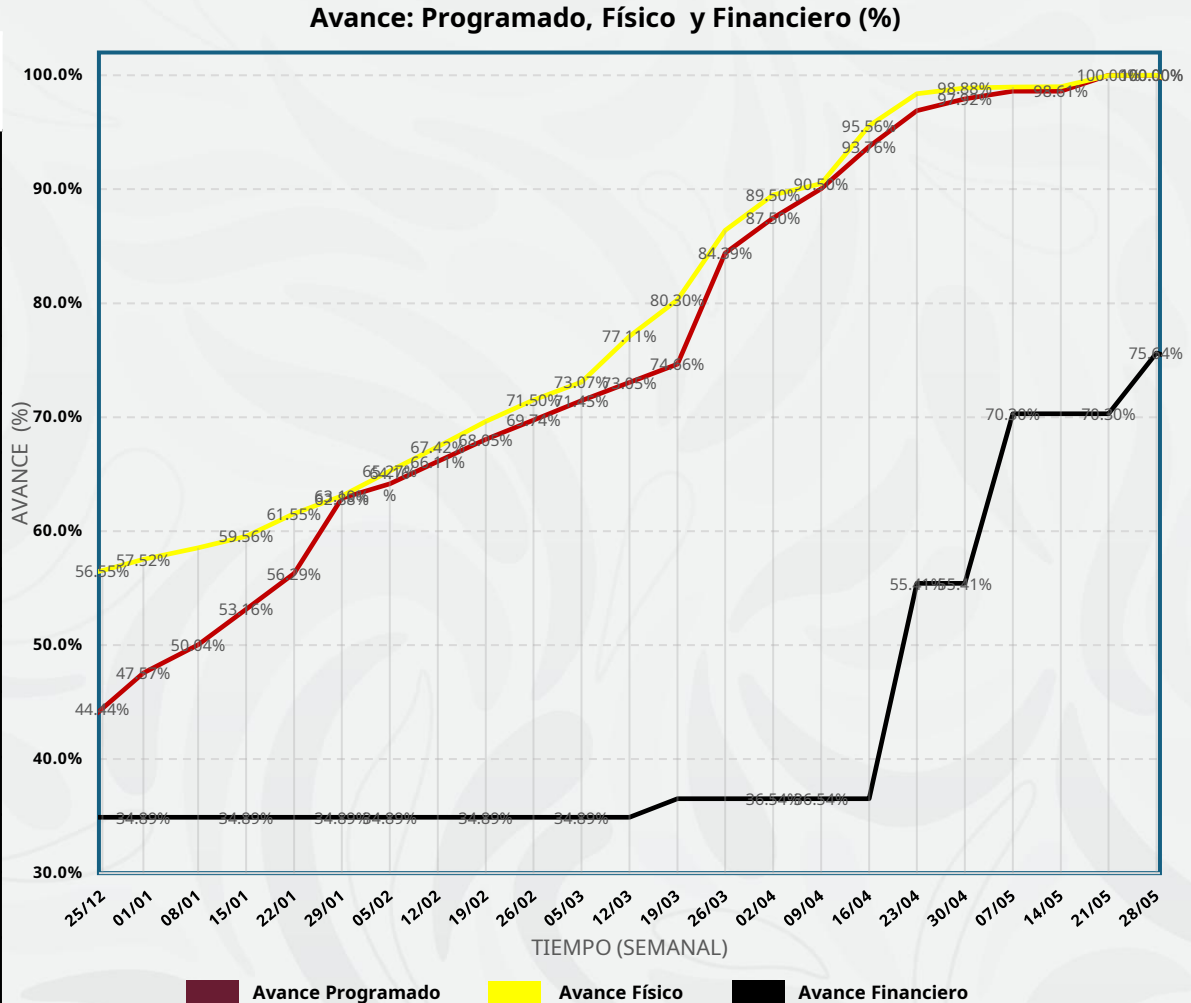

	15 al 21 de mayo	22 al 28 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	198	198
Maquinaria	31	31
Fuerza de trabajo	12	12
