

Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo

**Inversión total:** 484 MDP

**Meta total:** 0.77 km longitud total.

• 0.65 km puente
• 0.12 km accesos

**Inicio:** 27 Abril de 2026

**Término:** 31 Octubre 2026

**Más de 1,320,00** de habitantes beneficiados

**2,890** empleos generados

**5 minutos** ahorro en tiempo

**Beneficios:**

- Operación más segura para los usuarios, al reducirse significativamente la posibilidad de accidentes.
- Optimiza la capacidad y eficiencia del flujo vehicular en el acceso y salida del Puente Vehicular Nichupté.
- Fortalecer la seguridad de los residentes y turistas de la zona turística ante situaciones de contingencias ambientales
- Población beneficiada: 20 millones de turistas al año

Avance físico

• Programado: 34.12%
• Real: 10.18%

• Semanal: 4.18%
• Financiero PROG.: 34.12%

REPORTE SEMANA PASADA: 1.92 km longitud total.



SITUACIÓN ACTUAL



IMAGEN OBJETIVO

Tramo	Empresas
Construcción distribuidor vial Kukulcán.	• Contratista: Grupo Formado por las empresas: Consorcio de Ingenieros Constructores y consultores, S.A. de C.V y ASCH, S.A. de C.V. • Supervisión: Grupo formado por las empresas: Triada Geotecnia, S.A.P.I. de C.V. Triada Consultores, S.A.P.I. de C.V. Triada Diseño y Gerencia Construcción S.A.P.I. de C.V. .


Distribuidor Vial Kukulcán

Quintana Roo



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado		Faltante	Ejecutado del 22 al 28 de mayo de 2026
Pilas de cimentación (pza)	104	29	28%	75	12
Zapatas (pza)	18	0	0%	18	0
Columnas (pza)	30	0	0%	30	0
Cabezales (pza)	19	0	0%	19	0
Fabricación de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Montaje de trabes tipo cajón (pza)	70	0	0%	70	0
Losas (pza)	17	0	0%	17	0
M.M.E. (m³)	6,176	0	0%	6,176	0

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

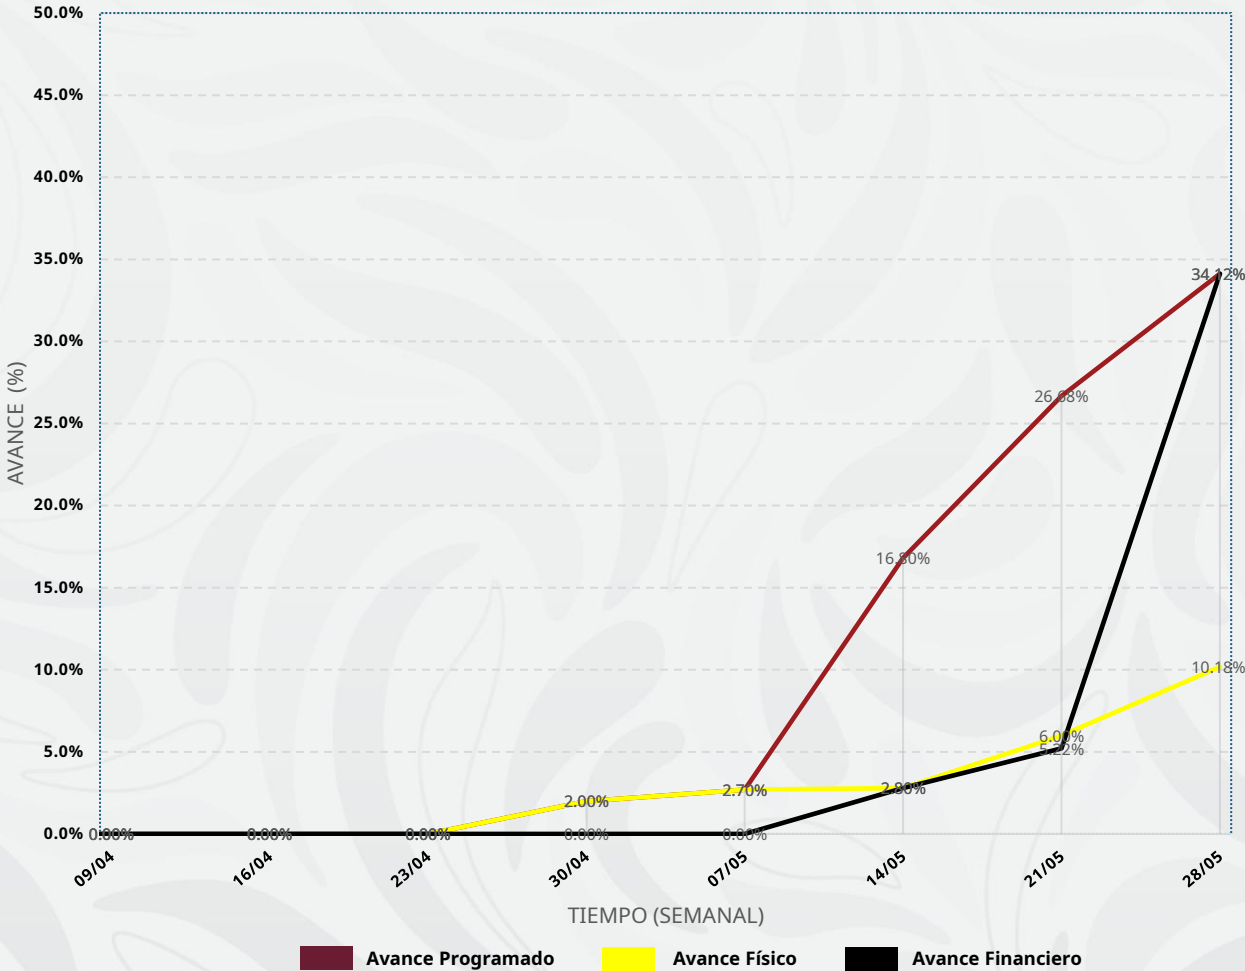

	15 de mayo al 21 de mayo 2026	22 de mayo al 28 de mayo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	89	89
Maquinaria	19	19
Frentes de trabajo	5	5
