

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa

Sinaloa



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 92.63%
- Real: 91.43%
- Semanal: 0.43%
- Financiero: 87.9%

(Concluido, se trabajan vialidades laterales)

- Inversión total 2025-2026:** 404.1 mdp
Meta total: 1 PSV | 0.811 km longitud total
- Inversión 2025:** 224.1 mdp *De acuerdo al cierre de SHCP 2025*
Meta 2025: 72% de PSV | 0.58 km
Inversión 2026: 180.0 mdp
Meta 2026: 28% de PSV | 0.23 km

- Inicio:** 18 de agosto de 2025 *(Fecha de terminación contractual)*
Término: Agosto 2026. Se realizan calles laterales

- 862,037** Habitantes beneficiados

- 1,215** empleos generados

- 20 min** ahorro en tiempo


Beneficios

Eficiente la circulación hacia el nuevo Hospital General y la Universidad de Durango permitiendo la operación colectora y de incorporación en esta importante zona.

Paso superior con 2 carriles por sentido

Empresas

- Contratista: ESMA Instalaciones, S.A. de C.V.
- Supervisión: Constructora y Supervisora GESCO, S.A. de C.V.

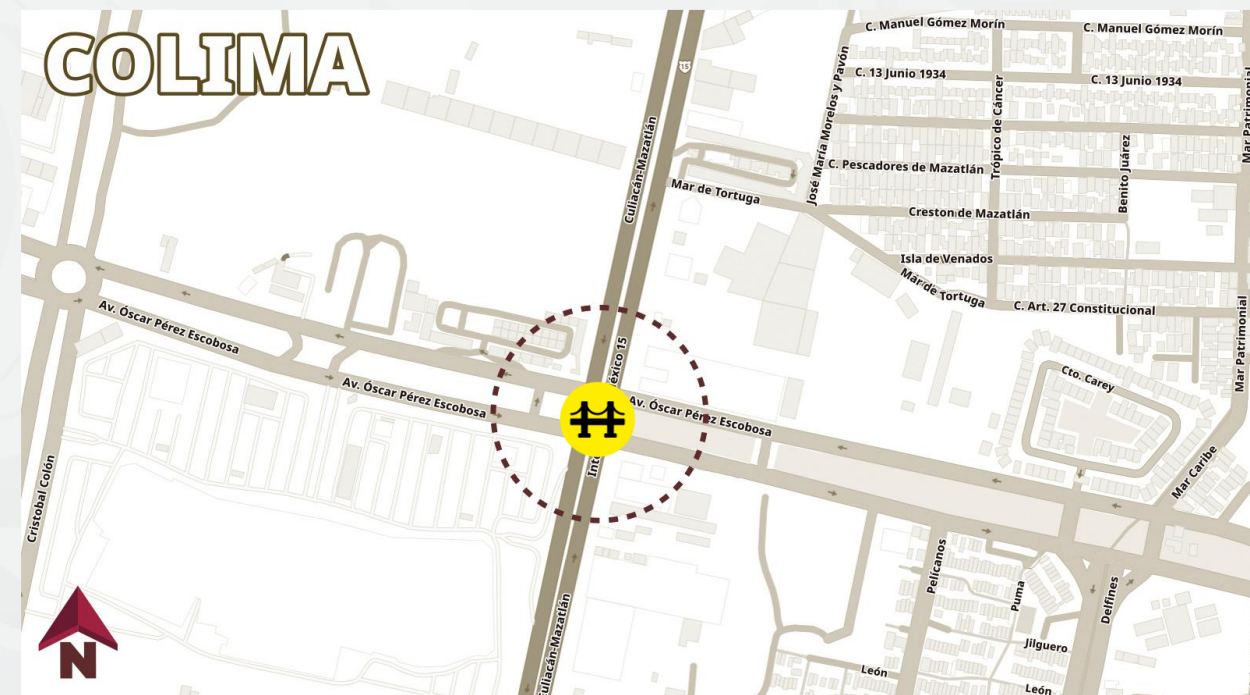


Nivel de Servicio C



Situación actual

Nivel de Servicio en estudio

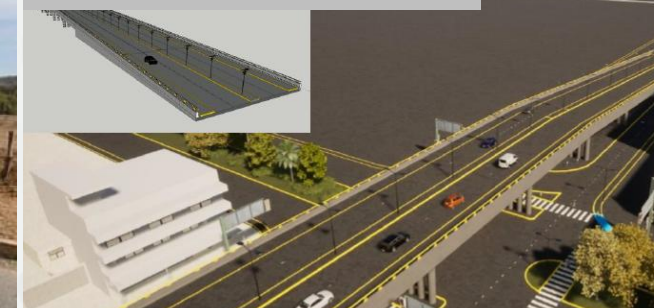

Proyecto

PSV. C.F. MEX 15 – Av. Oscar Pérez Escobosa
Sinaloa

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado	Faltante	Ejecutado del 22/05/26 al 28/05/26		Observaciones	
					Programado	Ejecutado		
PRECIO ALZADO								
Preliminares calles laterales	Actividad	2.0	1.3	65.0%	1	0.5	0.0	En proceso
Pavimento Calles Laterales y debajo de la Estructura	m3	2,434.0	194.4	8.0%	2,239.6	0.0	0.0	En proceso
Señalamiento	Actividad	2	0.25	12.5%	2	0.3	0.0	En proceso
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL								
Excavación	m3	4,465.00	4,076.3	91.3%	388.70	388.7	0.0	En proceso
Relleno	m3	1,358.00	1,243.0	91.5%	115.00	115.0	0.0	En proceso
Cajón prefabricado de 1.5x1.0m HS-20	m	337.00	337.0	100.0%	0.00	-	0.0	En proceso
Tubo PEAD de 0.30m -0.90 m de Diam.	m	1,239.00	972.0	78.5%	267.00	267.0	0.0	En proceso
Coladera de piso y banqueta	pza	37.00	24	64.9%	13.00	4.1	0.0	En proceso
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO								
Excavación	m3	3,329.81	1,918.0	57.6%	1,411.80	1,411.8	0.0	En proceso
Relleno	m3	3,206.11	1,846.8	57.6%	1,359.36	1,359.3	0.0	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado .	m	773.25	445.4	57.6%	327.85	328.3	0.0	En proceso
AGUA POTABLE								
Excavación	m3	1,041.50	693.0	66.5%	348.51	348.3	0.0	En proceso
Relleno	m3	975.80	649.3	66.5%	326.53	326.8	0.0	En proceso
Tubería P.V.C. para alcantarillado aguas negras, serie 20 de 31.5cm de Diam.	m	1,030.10	685.4	66.5%	344.70	345.1	0.0	En proceso
PRECIO UNITARIO								
Terraplenes	m3	5,032.0	3,975.4	79.0%	1,056.6	1,145.7	89.1	En proceso
Base Hidráulica	m3	2,835.00	1,706.4	60.2%	1,129	1,370.6	242.3	En proceso
Riego de Impregnación	m2	12,357.0	6,365.6	51.5%	5,991.4	5,991.0	0.0	En proceso
Base Asfáltica	m3	1,862.0	826.1	44.4%	1,035.9	1,035.9	0.0	En proceso
Carpeta Asfáltica	m3	863.0	382.4	44.3%	480.6	240.3	0.0	En proceso
Fresado de superficie	m2	23,420.0	11,382.0	48.6%	12,038.0	13,754.0	1,716.0	En proceso
Banqueta	m2	6,922.0	5,631.0	81.3%	1,291.0	745.5	199.9	En proceso
Relleno	m3	1,692.0	1,692.0	100.0%	0.0	-	0.0	En proceso

