

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco




Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 32.28%
- Real: 57.47%

- Semanal: 1.12%
- Financiero: 30.59%

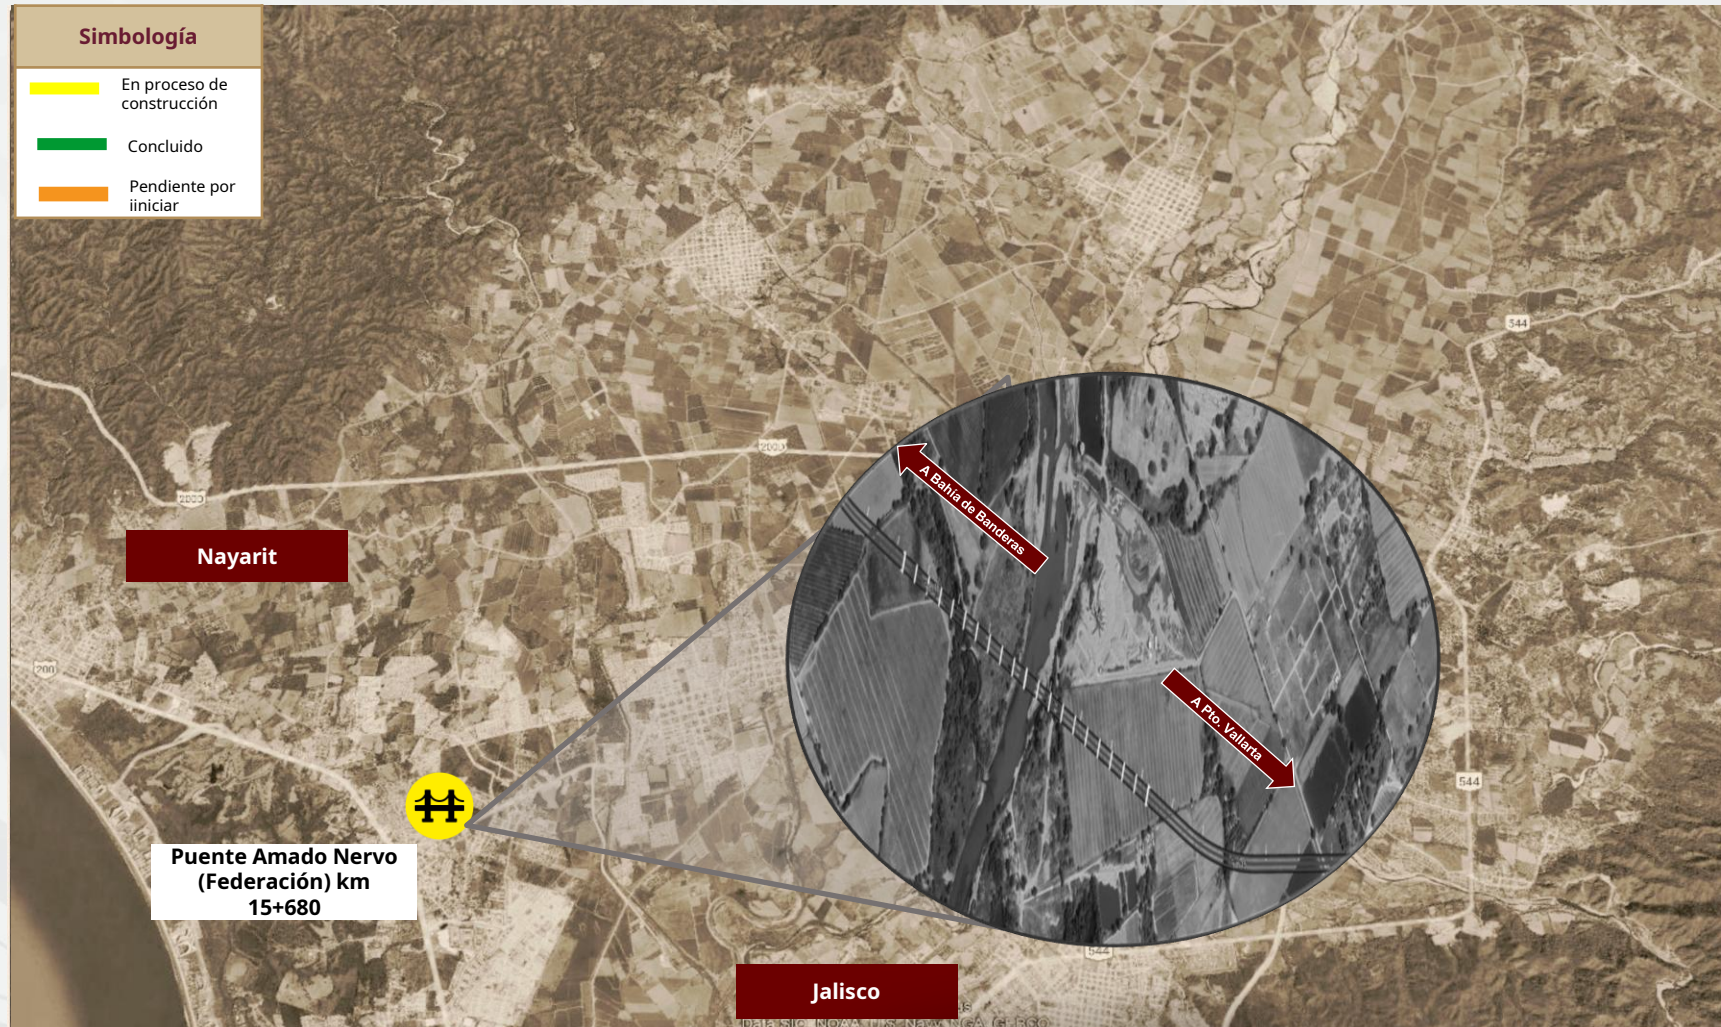

Inversión total 2025-2026: 930 mdp

Meta total: 1 Puente | 0.798 km

Accesos | 1.222 km



Inversión 2025: 198.9 mdp

Meta 2025: 0.7 km de Puente

Inversión 2026: 730.0 mdp

Meta 2026: 1.32 km

De acuerdo al cierre
de SHCP 2025



Inicio: 14 de julio de 2025

Término: Julio de 2026

La fecha de terminación contractual es diciembre 2026



479,471 habitantes beneficiados



2,790 empleos generados



25 min ahorro en tiempo

Beneficios

Se crea una vía alterna que permita agilizar el tránsito de vehículos que tienen como origen o destino la zona metropolitana de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.

Paso superior con 2 carriles por sentido


Empresas

- **Contratista:** Regiomontana de Construcción y Servicios, S.A.P.I. de C.V., Jaguar Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. y JYR Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
- **Supervisión:** Zambrano y Asociados, Ingeniería Civil, S. de R.L. de C.V.

Puente Amado Nervo (Federación) km. 15+680

(Carretera Fed. MEX-200) Nayarit y Jalisco

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

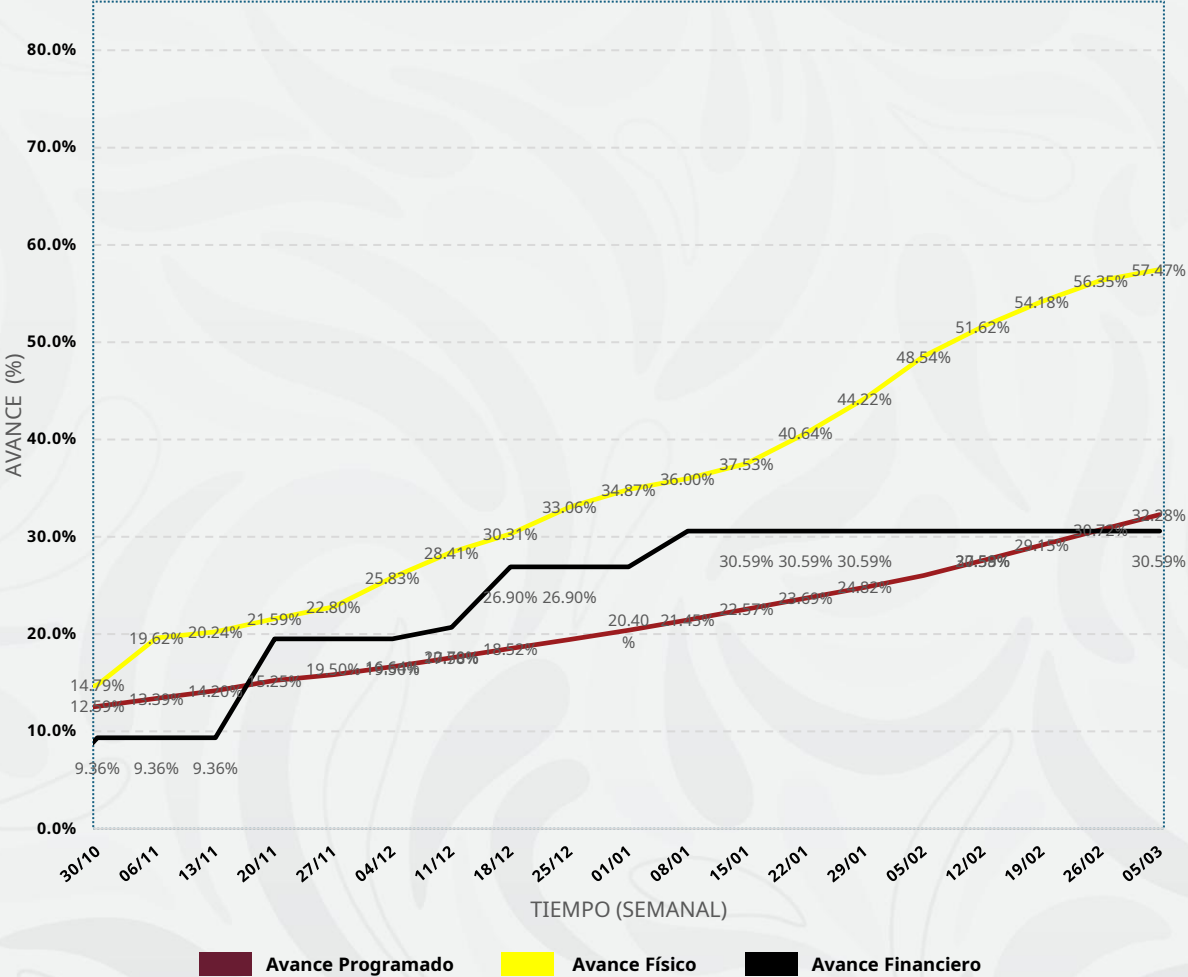

Elemento	Unidad	Volumen Total	Ejecutado Acumulado		Faltante	Ejecutado del 27 al 05/03/2026		Observaciones
						Programado	Ejecutado	
ACCESOS								
Desmonte	Ha.	7.0	2.00	28.6%	5.00	5.00	0	Concluido lado Nayarit, se realiza desmonte lado Jalisco.
Despalme	m3	14,042.0	10,866.0	77.4%	3,176.0	3,176.00	0	Concluido lado Nayarit, se realiza despalme lado Jalisco
Cortes	m3	10,823.0	0.0	0.0%	10,823.0	10,823.00	0	
Terraplenes	m3	161,117.0	57,672	35.8%	103,445.4	3,872.10	4,974	Se continuan trabajos de pedraplén en lado Jalisco.
Base Estabilizada	m3	6,192.0	0	0.0%	6,192.0	309.60	0	
Carpeta de Concreto Hidráulico	m3	9,687.0	0	0.0%	9,687.0	484.80	0	
Losas de Acceso	m3	83.0	0	0.0%	83.0	10.40	0	
INFRAESTRUCTURA								
Pilotes	pza.	126	126	100.0%	0	0	0	Concluidos
SUBESTRUCTURA								
Columnas	pza.	126	126	100.0%	0	0	0	Concluidos
Cabezales	pza.	21	21	100.0%	0	1	1	Concluidos
SUPERESTRUCTURA								
Trabes tipo NU-220 (fabricación)	pza.	160	152	95.0%	8	6	4	Se tienen coladas 152 trabes y se trabaja en los armados de 2 adicionales.
Trabes tipo NU-220 (montaje)	pza.	160	127	79.4%	33	8	5	Se tienen montados 127 trabes
Losas y Diafragmas	m3	4,918.00	577.6	11.7%	4,340.40	278	47	
Parapeto y Guarnición	m	1,597.00	0	0.0%	1,597.00	399	0	
Obras de Drenaje	pza.	4.00	2.3	57.5%	1.70	2	0	
PASOS SUPERIORES								
PSV's	pza.	2.00	1.6	80.0%	0.40	0.5	0	Se continua con el armado y colado de PSV lado Nayarit y PSV lado Jalisco.
OBRAS COMPLEMENTARIAS								
Obras Complementarias	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
SEÑALAMIENTO								
Señalamiento	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD								
Dispositivos de Seguridad	lote.	1.00	0	0.0%	1.00	0	0	

	20 de Febrero al 26 de Febrero	27 de Febrero al 05 de Marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	59	59
Maquinaria	21	21
Frentes de trabajo	5	5
