

PSF Arco Sur

Colima

Avance global

• Programado: 71.45%

• Semanal: 1.57%

• Real: 73.07%

• Financiero: 34.89%

- 

Inversión total 2025-2026: 630 mdp

Meta total: 1.2 km (puente y accesos)
- 

Inversión 2025: 280 mdp

Meta 2025: 0.55 km (46% del puente (subestructura y accesos))

Inversión 2026: 350.0 mdp

Meta 2026: 0.65 km (54% del puente (superestructura y accesos))

- 

Inicio: 03-Julio de 2025

Término: Marzo de 2026

Término meta 2025: Diciembre

Término meta 2026: abril

- 

157,048 habitantes beneficiados

- 

1,890 empleos generados


- 

15 min ahorro en tiempo

Beneficios Reducción de tiempos de traslado al poder realizar el cruce de las vías del tren, evitando tiempos de espera prolongados y “cuellos de botella”, así mismo, permitiendo agilizar el tránsito local.

Paso superior con 2 cuerpos y 3 carriles por sentido


Tramo	Empresas
PSF Arco Sur	• Contratista: COCONAL S.A P. I DE C.V • Supervisión: NO SE CUENTA CON SUPERVISIÓN CONTRATO FINALIZADO 31-DIC-2025

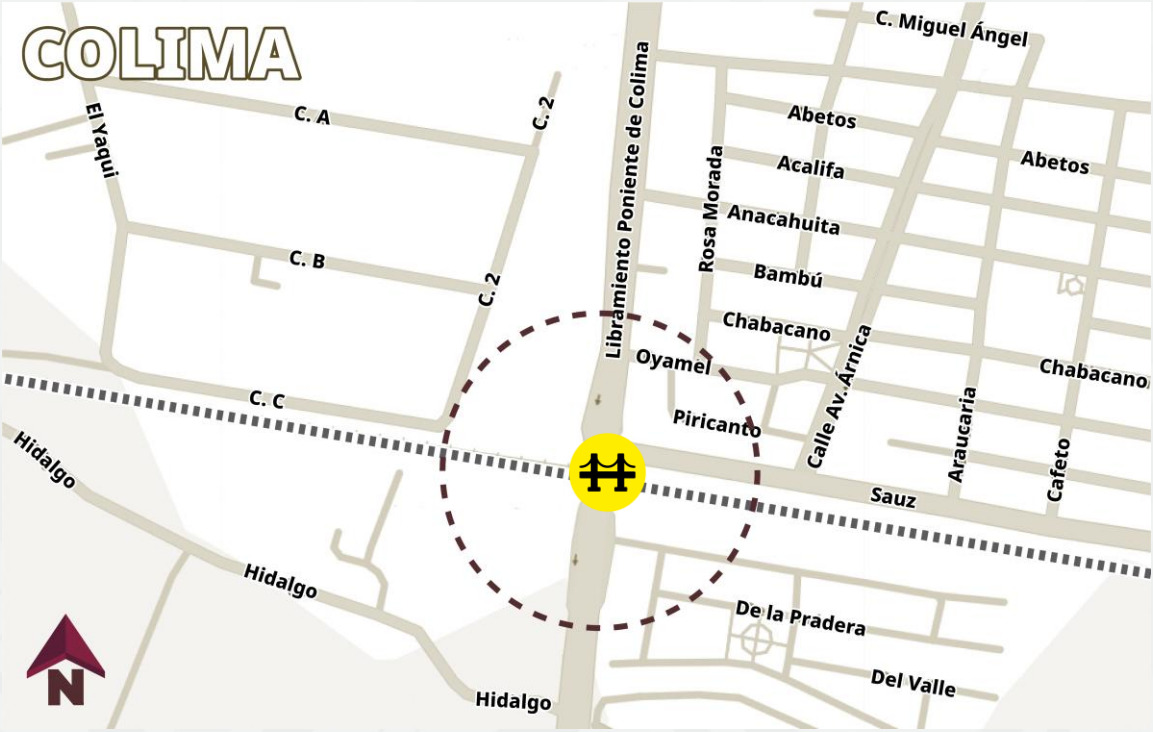

PSF Arco Sur

Colima

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

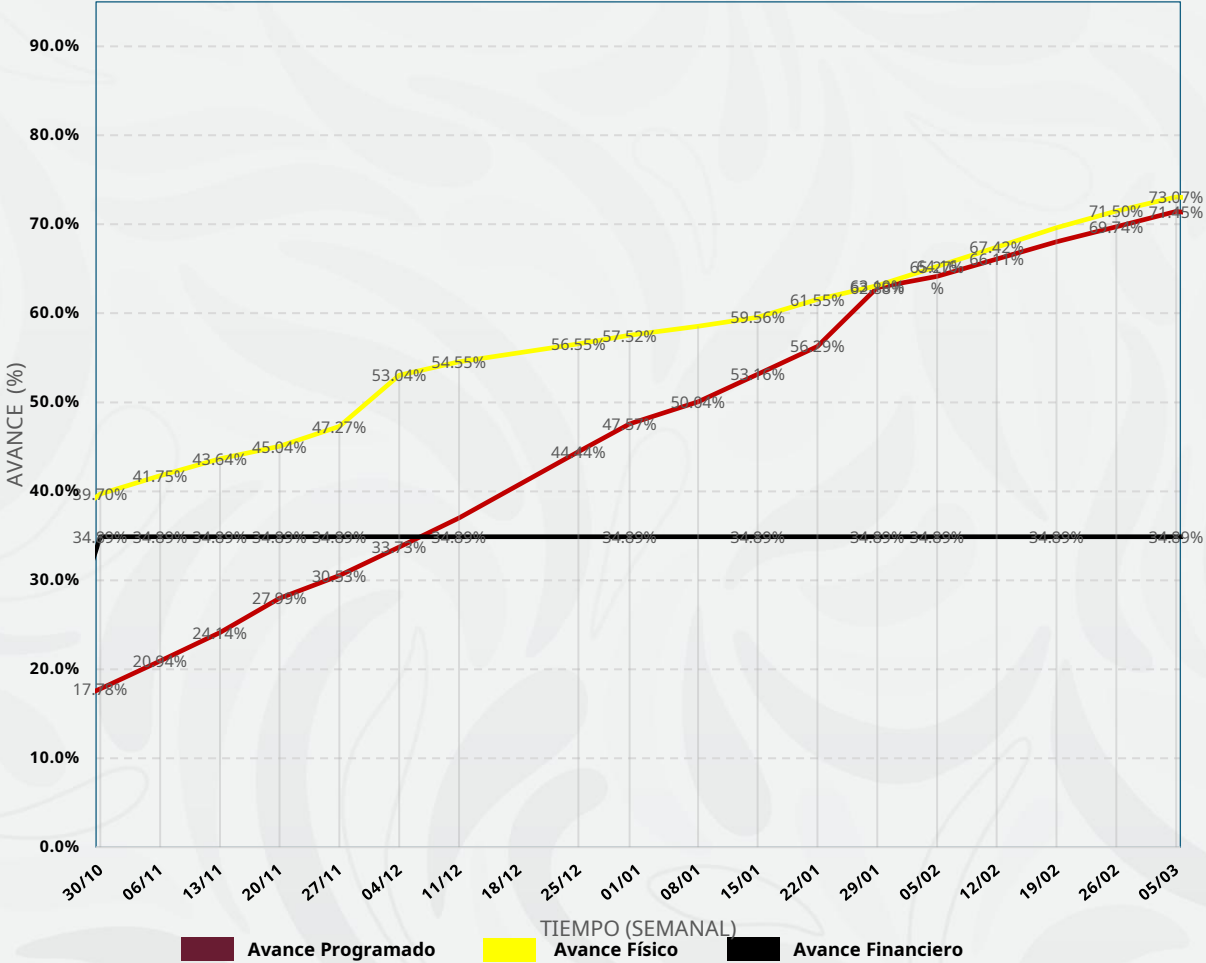

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	27/02/2026 al 05/03/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos diversos (pzs)	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Reubicación de obras inducidas (m)	2,477.55	2, 477.55	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Construcción de cruce prov. FFCC (pza)	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Puente lateral (pza)	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida.
Adecuación lateral no. 1 (m3)	994.56	994.56	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Adecuación lateral no. 2 (m3)	790.42	790.42	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Accesos al PSF						
Terracerías (m3)	7,319.03	7,319.03	0.00	0.00	200.00	Partida concluida
Base Hidráulica (m3)	5,568.82	5, 568.82	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Carpeta asfáltica (m3)	1,909.32	295.65	1, 613.67	806.84	0.00	
Muros MME						
Muro MME (m2)	2,842.74	2,542.92	299.82	139.91	0.00	
Carpeta asfáltica (m3)	1,402.30	0.00	1, 402.30	701.15	0.00	
Guarnición MME (m)	944.47	357.00	587.47	293.74	357.00	
Subestructura PSF						
Pilas (pza)	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Zapatas (pza)	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida
Columnas (pza)	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Partida concluida

	20 de febrero al 26 de febrero	27 de febrero al 05 de marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	163	163
Maquinaria	43	38
Fuerza de trabajo	11	11
