

Puente El Chical

Colima

Avance global

• Programado: 88.40 %

• Semanal: 1.74 %

• Real: 88.06%

• Financiero: 24.0 %



Inversión total 2025-2026: 137 mdp
Meta total: 0.736 km



Inversión 2025: 43 mdp
Meta 2025: 24.0 % del Puente
Inversión 2026: 94 mdp
Meta 2026: 76.0 % del Puente



Fecha de inicio: 11 de agosto, 2025
Fecha de término: Marzo, 2026



4,053 habitantes beneficiados




411 empleos generados



15 min ahorro en tiempo

Beneficios: La obra representa una mejora significativa en la seguridad vial y una reducción de riesgos durante eventos pluviales, garantizando además la conectividad permanente del poblado El Chical con el municipio de Coquimatlán y las zonas cercanas. Asimismo, contribuye a la reducción de los tiempos de traslado para habitantes y usuarios de la vía, facilita un mayor acceso a servicios básicos como hospitales, escuelas y comercios, e impulsa el desarrollo social y económico de la región mediante una infraestructura más confiable y segura.

1 carril por sentido

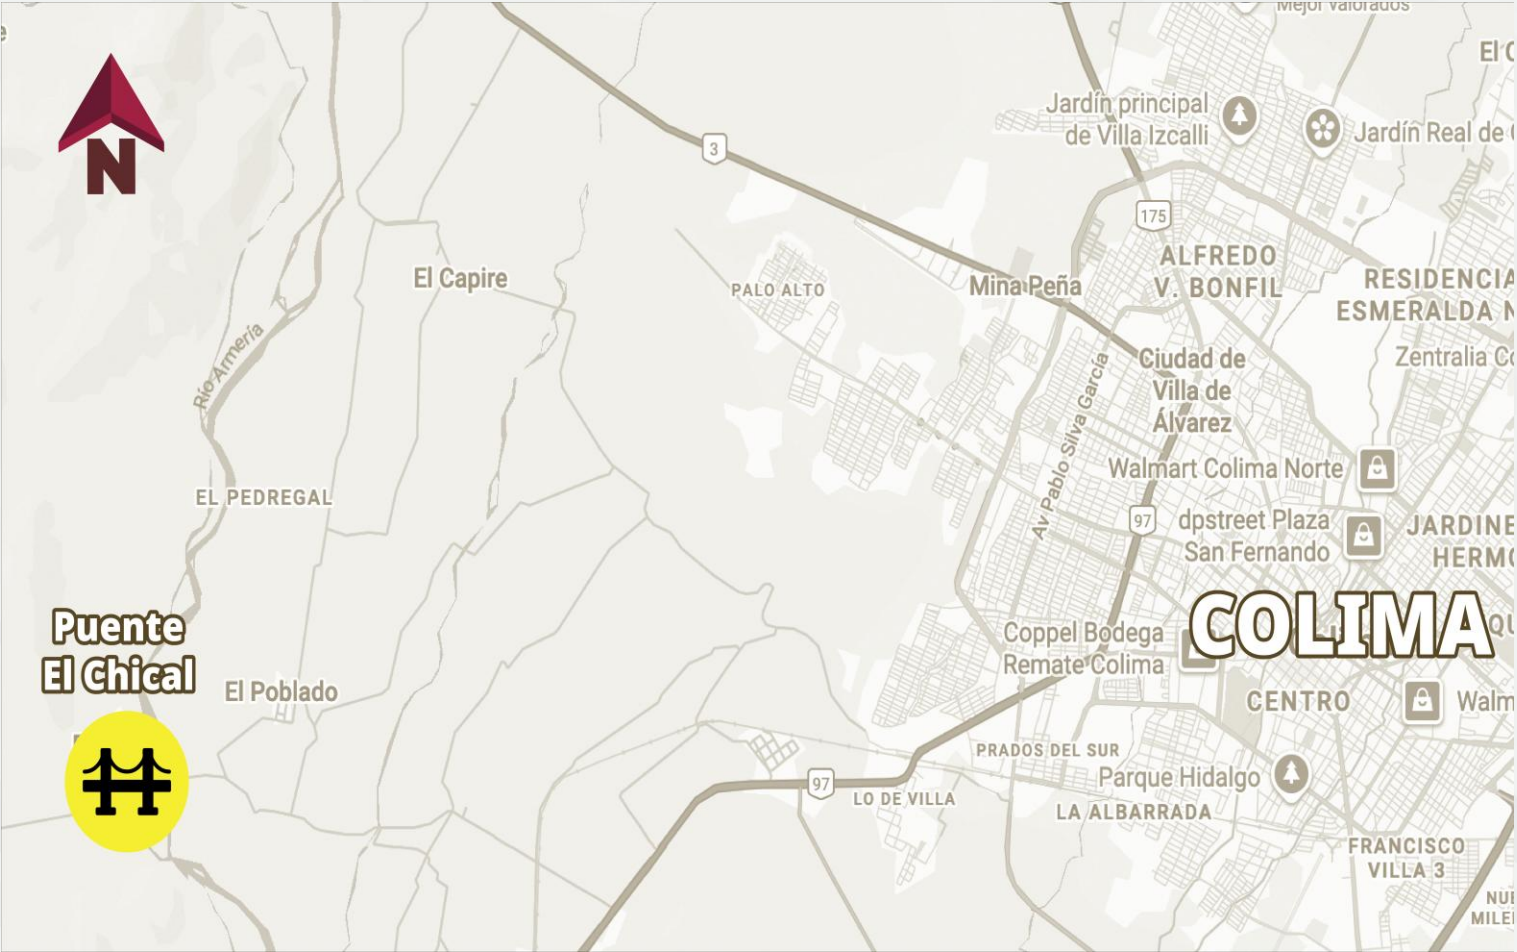

Tramo	Empresas
Construcción Puente El Chical	• Contratista: TRITURADOS Y ASFALTOS DE ATACOMULCO, S.A DE C.V Y GUCOC, S.A DE C.V • Supervisión: ANMA INGENIERIA, S.A DE C.V

Puente El Chical

Colima




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	27/02/26 al 05/03/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Resumen de Obra						
Limpieza, Trazo y Nivelación (m2)	9,784.0	9,784.0	0.0	0.0	0.0	
Pilas de cimentación (Pza)	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	
Columnas (Pza)	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	
Construcción de cabezales y bancos (m3)	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	
Trabes AASHTO VI (Pza)	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	
Montaje de trabes (Pza)	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	
Colado de diafragma y losa (m3)	648.0	648.0	0.0	0.0	0.0	
Carpeta Asfáltica (m3)	166.8	0.0	166.8	0.0	0.0	
Guarniciones y banquetas (m)	720.0	720.0	0.0	0.0	0.0	
Accesos, señalamiento y obras complementarias (m)	139.0	0.0	139.0	0.0	0.0	
Conformación de camino de desvío y dragado del cauce (m3)	125,000.0	125,000.0	0.0	0.0	0.0	

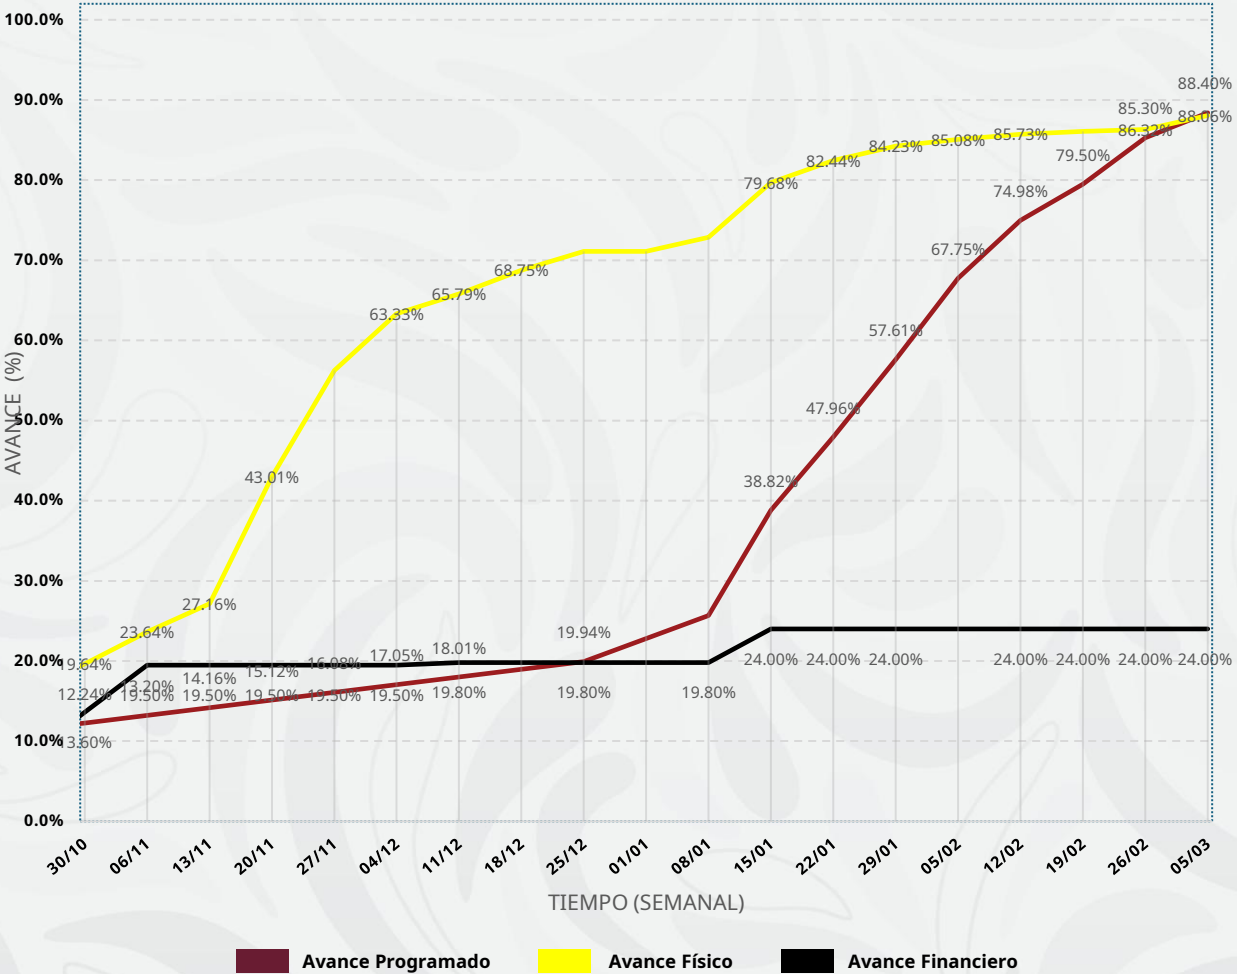

	20 de Febrero al 26 de Febrero	27 de Febrero al 05 de Marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	31	31
Maquinaria	5	5
Frentes de trabajo	5	5
